PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

DOCUMENTO DE PROYECTO

Honduras

Título del Proyecto: Apoyo a la implementación de los procesos de NDC de Honduras

Número del Proyecto: 00130309

Asociado en la Implementación: PNUD

Fecha de Inicio: 14 de agosto de 2023 **Fecha de finalización:** 31 de diciembre de 2024

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 18 de agosto de 2023

Breve Descripción

El Gobierno de Honduras, en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París y con el liderazgo de las instituciones de los sectores priorizados en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) de Honduras 2015: Energía, Procesos Industriales, Agricultura, UTCUTS[1] y Residuos, realizó el proceso de actualización de la NDC 2021 con el apoyo de la Iniciativa de la Promesa Climática del PNUD. La NDC resultó en una ambición mejorada al describir con una mayor amplitud los objetivos sectoriales, definición de medidas en mitigación y la ampliación de acciones en adaptación al proponer 14 medidas que contribuirán a la resiliencia del país ante el cambio climático, así mismo se incluye un capítulo financiero y la transversalización de género y mecanismos para la participación de jóvenes y Pueblos Indígenas y Afro-hondureños. Un hito muy importante de esta actualización es que el PNUD con su equipo de especialistas, y el equipo institucional, formularon una hoja de ruta hacia la segunda actualización de la NDC 2025, que indica prioridades y acciones que el país debe adoptar, tanto para mitigación como adaptación, incluida una hoja de ruta estratégica para género.

El PNUD, en el marco del Programa de Promesa Climática y socios de la Cooperación Internacional busca apoyar el fortalecimiento de capacidades nacionales en materia de cambio climático, así como apoyar la implementación de la hoja de ruta de la NDC 2021 y el desarrollo de la nueva NDC 2025, con el objetivo de fortalecer el sistema de gobernanza, para mejorar capacidades técnicas de los sectores priorizados en la NDC y su participación efectiva con el involucramiento de instituciones y organizaciones y comunidades clave. Se brindará apoyo para i) el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, SINGEI) y el Reporte Internacional dentro del Marco Reforzado de Transparencia (ETF, por sus siglas en inglés), así como la preparación de la propuesta a GEF para el BTR1 y 4NC/BTR2; ii) el desarrollo de la regulación nacional de la huella de carbono, así como el apoyo a la participación de Honduras en la COP27; iii) el desarrollo de la regulación nacional de los mercados de carbono; iv) la implementación de las medidas sectoriales del sector Energía; y v) la elaboración de la NDC 2025 en línea con la Estrategia Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática de Honduras 2050 (LT-LEDS), así como la preparación del NDC Partnership Plan.

[1] Por Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD):
Resultado 3 - El Estado hondureño implementa políticas, estrategias y programas que fortalecen la sostenibilidad y resiliencia de su desarrollo.
Producto(s) Indicativo(s) con Indicador de género[2]: Todos los Productos: GEN2

Total de recursos requeridos:		$582.720,00
Total de recursos asignados:	**UNDP Climate Promise:**	$582.720,00
No financiado:		$0.00

Acordado por (firmas)[2]:

Firma: escriba su nombre en letra de molde **Eduardo Enrique Reina Garcia, Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional**	**Acordado por la Autoridad Gubernamental**	**Fecha/mes/año:** Sept 2023
Firma: escriba su nombre en letra de molde **Lucky Halach Medina Estrada, Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)**	**Acordado por la Autoridad Gubernamental**	**Fecha/mes/año:** Sept 2023
Firma: escriba su nombre en letra de molde **Richard Barathe, Representante Residente**	**Acordado por el PNUD**	**Fecha/mes/año:** Sept 2023

[2] Nota: Ajuste los casilleros de firma según corresponda

[2] El Indicador de género mide cuánto invierte el proyecto en la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Favor de seleccionar un producto: GEN3 (Igualdad de género como un objetivo de principio); (GEN2 (Igualdad de género como un objetivo significativo); GEN1 (Contribución limitada a la igualdad de género); GEN0 (Ninguna contribución a la igualdad de género)

I. DESAFÍOS DE DESARROLLO

El desafío de desarrollo que este proyecto busca abordar radica en fortalecer la capacidad de Honduras para cumplir de manera efectiva con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático incluyendo la presentación de informes a nivel internacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Es fundamental que Honduras pueda responder de manera adecuada a estas obligaciones para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el avance hacia un futuro sostenible (eje 1). Asimismo, la creación de estas capacidades y conocimiento permitirá a Honduras desarrollar políticas efectivas de mitigación y adaptación que aborden los riesgos climáticos específicos del país (eje 2). Al hacerlo, Honduras estará mejor preparada para enfrentar los desafíos climáticos presentes y futuros, protegiendo a su población y sentando las bases para un desarrollo sostenible y resiliente en el país.

Honduras se enfrenta a una serie de amenazas ocasionadas por el cambio climático, que se han manifestado a través de eventos extremos devastadores. Un ejemplo significativo es el huracán Mitch, que golpeó al país en 1998 y dejó a su paso una estela de destrucción y pérdidas humanas y materiales sin precedentes. Desde entonces, Honduras ha seguido enfrentando impactos climáticos severos, como los huracanes Eta e Iota en 2020, que causaron inundaciones masivas, deslizamientos de tierra y la destrucción de comunidades enteras. Estos eventos han evidenciado la vulnerabilidad del país frente a las intensas tormentas y la necesidad de fortalecer su capacidad de respuesta.

Además, Honduras también se ve afectada por el fenómeno climático de El Niño, que trae consigo sequías prolongadas y perturbaciones en los patrones de lluvia. Estos períodos de sequía han afectado gravemente la agricultura, la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable en varias regiones del país. La falta de precipitaciones adecuadas y la escasez de recursos hídricos han puesto en peligro la subsistencia de las comunidades rurales y han exacerbado las condiciones de pobreza y desigualdad.

El desafío de desarrollo que busca abordar el proyecto es de suma importancia para Honduras debido a varios factores clave. En primer lugar, la capacidad de Honduras para responder de manera adecuada a sus compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático es esencial para el cumplimiento de los acuerdos internacionales a los que el país se ha comprometido, como el Acuerdo de París y su Marco de Transparencia Reforzado (MTR).

Además, el reporte internacional es fundamental para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en relación con las acciones y avances de Honduras en la lucha contra el cambio climático. El informe periódico sobre las medidas tomadas y los resultados obtenidos es necesario para evaluar el progreso del país, identificar áreas que requieren mayor atención y acceder a posibles apoyos internacionales.

Cumplir adecuadamente con los compromisos internacionales y los informes requeridos no solo fortalecerá la posición de Honduras como actor responsable en la comunidad internacional, sino que también contribuirá a la protección de los recursos naturales, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible en el país.

El cambio climático tiene impactos sociales, ambientales y económicos que afectan en mayor medida a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En Honduras, la niñez, las personas jóvenes, las mujeres, las personas adultas mayores y los pueblos indígenas y afro hondureños (PIAH), especialmente aquellos que viven en entornos rurales, se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático, ya que cuentan con capacidades y oportunidades disminuidas para adaptarse a sus efectos[3].

[3] Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Primera actualización de la Contribución Nacional Determinada de Honduras

Los impactos del cambio climático varían entre hombres y mujeres debido a los roles, responsabilidades, las desigualdades que experimentan en relación con el acceso a la tierra, el crédito, la información y tecnología, el uso y manejo de los recursos naturales diferenciado y su participación diferenciada en los procesos de toma de decisiones. Existe una interrelación causal con los impactos del cambio climático. Donde por un lado los impactos del cambio climático y la degradación ambiental tienden a exacerbar las desigualdades de género existentes, y en otra instancia las desigualdades de género conllevan a que los impactos negativos de estos fenómenos sean mayores sobre las mujeres, niños y niñas, colocándolos en una posición de vulnerabilidad donde se ven afectados sus medios de vida, bienes y salud[4]

Finalmente, ante las múltiples amenazas que enfrenta Honduras, es crucial que el país desarrolle e implemente estrategias de adaptación y mitigación que aborden de manera efectiva sus riesgos climáticos específicos. El Estado de Honduras está comprometido a establecer programas de adaptación y mitigación al cambio climático, en consonancia con convenios internacionales. Sin embargo, la falta de información climática de calidad limita la capacidad de tomar decisiones informadas. Para ello es necesario disponer de una información climática de calidad como la que se desarrolla para el reporte internacional.

En resumen, el desafío de desarrollo de Honduras para responder de manera adecuada a sus compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático y los informes internacionales es crucial para la protección del país frente a los impactos del cambio climático, el cumplimiento de los acuerdos internacionales y el fomento de un desarrollo sostenible y resiliente.

El desafío de desarrollo que busca abordar el proyecto es altamente relevante dentro de las prioridades nacionales de Honduras de las Naciones Unidas y del PNUD, en particular en relación con los efectos y metas establecidos en el Marco de Cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNSDCF) y el Plan de Desarrollo del País (CPD) del PNUD.

En el UNSDCF, se identifica el Efecto 2.3, el cual se refiere a que el Estado Hondureño implementa políticas, estrategias y programas que fortalecen la sostenibilidad y resiliencia de su desarrollo. El proyecto contribuye directamente a este efecto al capacitar a la población hondureña, la administración pública y el sector privado en la promoción de una economía sostenible y en la construcción de resiliencia frente al cambio climático a través de la generación de información completa, de confianza y robusta para la toma de decisiones.

Además, los productos esperados del Programa de País del PNUD enfatizan el fortalecimiento de capacidades y la mejora de medios de vida sostenibles para grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes (producto 3.1). Al abordar los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático y los informes internacionales, el proyecto contribuye directamente a estos productos, al promover la capacitación y el fortalecimiento de capacidades en estas áreas clave.

Asimismo, el desafío de desarrollo y el objetivo del proyecto están en alineado con la línea de acción de "Protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal" del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, así como el punto VIII de cumplimiento estricto de los compromisos internacionales del apartado de propuestas en materia de Política Exterior.

Por lo tanto, el desafío de desarrollo planteado por el proyecto es altamente relevante dentro de las prioridades nacionales de Honduras, ya que se alinea con los efectos y metas establecidos en el UNSDCF, el CPD y el Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, enfocándose en fortalecer la sostenibilidad, la resiliencia y los medios de vida sostenibles en el contexto del cambio

---

(NDC-HN), mayo 2021. Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/NDC%20de%20Honduras_%20Primera%20Actualizaci%C3%B3n.pdf

[4] PNUD, ONU Mujeres, PNUMA, 2020. De las Palabras a la Acción: Proyectos con Soluciones Innovadoras para la Naturaleza, la Acción Climática y la Igualdad de Género.

climático, especialmente para grupos vulnerables, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Un desafío de desarrollo se presenta cuando un país enfrenta obstáculos y limitaciones en su capacidad para alcanzar determinados objetivos en el ámbito del desarrollo. En el caso de Honduras, los esfuerzos por dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de cambio climático continúan teniendo varios desafíos clave relacionados con su capacidad para gestionar información y reporte de manera efectiva y responder adecuadamente sobre impactos y resultado de su lucha contra el cambio climático. En el anexo "Árbol de problemas" se muestra de forma gráfica las causas, el problema central y las consecuencias directas e indirectas.

Honduras ha enfrentado dificultades para enviar los informes requeridos, como la Comunicación Nacional (NC, por sus siglas en inglés) y los Informes Bienales de Actualización (BUR, por sus siglas en inglés), en el plazo establecido, logrando enviar un BUR (2020) y tres NC (2000, 2012 y 2020)[5]. Se evidencia un rezago en la frecuencia de estos reportes, que entre otras se relaciona con limitaciones de las capacidades técnicas nacionales necesarias para cumplir con los requisitos de reporte establecidos en la CMNUCC. El nuevo MTR del Acuerdo de París incluye requerimientos más estrictos con respecto al reporte. Por tanto, se requiere mayor apoyo para abordar los requisitos de reporte y poder enfrentar este desafío para alcanzar los estándares de reporte del MTR.

El país aún está desarrollando un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la información climática. La falta de un sistema MRV integral, sólido y eficiente dificulta la obtención de información de base, el contacto con los actores, la identificación de medidas, la financiación climática, la preparación de productos, etc. y, en consecuencia, el envío de los reportes internacionales. Se requiere de una base sólida de datos y un sistema de acuerdos institucionales efectivo, para cumplir con las obligaciones de transparencia para el reporte internacional.

También, pese a sus esfuerzos históricos, se presenta debilidades en el cumplimiento de sus compromisos incluidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), abarcando tanto los aspectos de mitigación como otros aspectos relevantes. Las medidas de mitigación identificadas requieren fortalecer alcance, diseño e implementación. Estas medidas se encuentran mayormente concentradas en el sector de Energía, mientras que otros sectores presentan una contribución menor y dificultades en el diseño y la sostenibilidad de las medidas adoptadas. Esto genera retos sobre los medios para alcanzar la ambición climática establecida. Además, como parte del proceso de actualización de la NDC en 2021, Honduras desarrolló una hoja de ruta para la implementación de dicha NDC. No obstante, se debe acelerar en la implementación efectiva de esta hoja de ruta. Los retrasos en una implementación sólida de la hoja de ruta obstaculizan el progreso hacia la consecución de los objetivos establecidos y plantea dificultades para lograr metas a medio y largo plazo, que requieren de compromisos previos o procesos de larga duración.

Este proyecto busca solventar debilidades en las capacidades nacionales para cumplir de manera adecuada con los compromisos y contribuciones establecidos en la NDC, así como para realizar informes internacionales bajo el MTR del Acuerdo de París. Esta situación puede acarrear importantes consecuencias, tales como la falta de disponibilidad de información de calidad para respaldar la toma de decisiones y el deterioro de la credibilidad internacional del país en materia climática.

II. ESTRATEGIA

El objetivo general es abordar el desafío de desarrollo mediante la implementación de hojas de ruta técnicas para la NDC 2021, con el fin de mejorar las oportunidades de implementación de medidas en mitigación, adaptación, financiamiento, inclusión social e igualdad de género, contribuyendo así al cumplimiento de los compromisos de la NDC, la CMNUCC y el Acuerdo de París. Los productos y

actividades diseñados buscan enfrentar las causas del problema central y, por lo tanto, del desafío de desarrollo (véase Figura 1 en Anexo "Árbol de problemas").

Este proyecto tiene como objetivo abordar el desafío de desarrollo a través de cinco productos:

- Producto 1: Fortalecimiento del SINGEI y de la presentación de informes en el ETF
- Producto 2: Regulación nacional de la huella de carbono integrando la perspectiva de género
- Producto 3: Reglamento nacional de la ley de transacciones de carbono forestal
- Producto 4: Planes de implementación de medidas de NDC en el sector energético
- Producto 5: Hoja de ruta para el NDC 2025 en alineación con el LT-LEDS

Estos productos han sido diseñados para abordar de manera sinérgica los dos ejes fundamentales del desafío de desarrollo: la capacidad para realizar un informe adecuado bajo el MTR y la capacidad para cumplir los compromisos climáticos. Aunque algunos productos se centran en uno de estos ejes, las interdependencias entre ellos son tan estrechas que todos los productos contribuyen en cierta medida a ambos. No obstante, se puede destacar que los Productos 1 y 5 contribuyen principalmente al reporte, mientras que los Productos 2, 3 y 4 respaldan la mitigación y, por lo tanto, los esfuerzos para alcanzar la ambición climática establecida en la NDC del país.

Es importante señalar que estos productos y las actividades asociadas a su implementación (véase "Resultados Esperados" en el siguiente apartado) están diseñados para complementar y apoyarse en otros procesos que el país está desarrollando o tiene previsto desarrollar, como el proyecto para el desarrollo del Primer Informe Bienal de Actualización (BTR1) y el Cuarto Informe Nacional de Cambio Climático y Segundo Informe Bienal de Transparencia (NC4/BTR2).

El enfoque se basa en trabajar en colaboración con las autoridades y actores relevantes para desarrollar entornos habilitantes que permitan cumplir con los compromisos climáticos del país. El primer paquete de acciones se enfocará en mejorar la información base a través del fortalecimiento del Sistema Nacional del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SINGEI), la capacitación de personas expertas nacionales y la elaboración de recomendaciones para cumplir con los requisitos de información del INGEI en el Marco Transparencia Reforzado (MTR). Esto generará un cambio a corto plazo al mejorar la disponibilidad de información, las capacidades y el marco institucional para la estimación de emisiones y la presentación de informes internacionales bajo el Marco de Transparencia del Acuerdo de París (ETF). Estos avances sentarán las bases para desarrollar un nuevo INGEI en el proceso de elaboración del Primer Informe Bienal de Actualización (BTR1), al mejorar la información sobre variables de actividad, capacitar parcialmente a las personas expertas nacionales e identificar las acciones necesarias. A largo plazo, estos esfuerzos apoyarán el objetivo de que Honduras tenga la capacidad de cumplir de manera autónoma con los requisitos internacionales de presentación de informes en el marco del ETF.

Además, se trabajará en la creación de una hoja de ruta para la elaboración de la NDC de 2025, estableciendo hitos que permitan disponer a tiempo y con la calidad suficiente de la información necesaria para desarrollar una NDC sólida. El proyecto apoyará la implementación de esta hoja de ruta, brindando apoyo y coordinación para su implementación, aunque no se espera que desarrolle todos los elementos necesarios para la actualización. También se llevará a cabo una campaña de difusión de la Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono (LT-LEDS por sus siglas en ingles), ya que es fundamental que sus contenidos y objetivos sean conocidos por la población y los actores relevantes para fomentar el desarrollo sostenible esperado. En el corto plazo, se espera contar con información adecuada para la próxima NDC, pero el objetivo a largo plazo es establecer un marco de trabajo efectivo para la planificación e implementación de estrategias climáticas a corto, mediano y largo plazo.

El compromiso de mitigación actual de Honduras se centra en el sector energético. Aunque este sector muestra un mayor nivel de desarrollo en comparación con otros sectores y cuenta con una institución sectorial sólida, la Secretaría de Energía (SEN), aún requiere apoyo adicional para garantizar la implementación efectiva de las medidas comprometidas. Este apoyo se enfoca en tres aspectos clave: la actualización de acuerdos, la mejora en la estimación de impactos y el desarrollo de una estrategia

financiera para asegurar la estabilidad. Dado el peso significativo del sector energético en los compromisos de mitigación, es crucial garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Estas actividades serán fundamentales tanto en el corto como en el mediano plazo para respaldar los compromisos de mitigación de Honduras, y también servirán como casos de éxito que podrán ser difundidos y aplicados en otros sectores.

Además, se busca apoyar el desarrollo de la regulación en dos áreas fundamentales: la huella de carbono y los mercados de carbono. Ambas acciones contribuyen a la mitigación al involucrar a nuevos actores que pueden contribuir a alcanzar los compromisos climáticos. El desarrollo de una regulación y la implementación de una herramienta digital de huella de carbono ayudan a difundir la importancia de los esfuerzos individuales en la lucha contra el cambio climático, y proporcionan una guía clara al sector privado sobre su papel en la problemática y las posibles soluciones. En el caso de los mercados de carbono, el proyecto brindará apoyo en la regulación, aunque no se encargará de su implementación, ya que esto está fuera del alcance de sus capacidades. Sin embargo, se dará el primer paso hacia un marco de trabajo que permita distribuir los esfuerzos de mitigación y reconocer a los actores comprometidos. Todas estas actividades se enmarcan en un objetivo a largo plazo más general, que implica contar con un conjunto de herramientas adicionales para fomentar la acción climática del sector privado y lograr un equilibrio adecuado de esfuerzos entre los diferentes sectores.

El proyecto supondrá un cambio que apoyará principalmente a la DNCC, como encargada del SINGEI y del reporte internacional, y a la SEN, como actor principal del sector energético. Los expertos de ambas instituciones serán capacitados para que puedan entender y desarrollar los productos requeridos dentro del nuevo marco de transparencia. Asimismo, se proveerá a ambas instituciones de herramientas y estrategias que mejoren su trabajo.

Adicionalmente, un gran número de actores se beneficiarán positivamente por el proyecto, desde los proveedores de datos del INGEI hasta las instituciones asociadas a los compromisos y contribuciones de la NDC. Finalmente, el proyecto aborda una debilidad fundamental existente en el país, la falta de participación del sector privado en la lucha contra el cambio climático. El sector privado mejorará su comprensión del cambio climático y la LT-LEDS, dispondrá de una herramienta para evaluar su contribución a las emisiones y, en un futuro, de un mercado donde contribuir de manera efectiva a la mitigación.

Esta iniciativa presenta una oportunidad para generar datos fundamentados sobre las interconexiones entre el cambio climático, el género y otros aspectos socioeconómicos. Esto puede aprovecharse para promover la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y recolección de datos, mejorar la recopilación y análisis de datos desagregados por género, fortalecer el conocimiento y las capacidades nacionales y locales para analizar y evaluar los impactos diferenciados por género del cambio climático y las contribuciones diferenciadas por género de las mujeres y los hombres a las soluciones climáticas, así como integrar los principios de igualdad de género y los conceptos de cambio climático en el marco de desarrollo. Estos esfuerzos en última instancia fomentarán el desarrollo de políticas climáticas sensibles al género que contribuyan al logro de los objetivos de género e inclusión social incluidos en la NDC actualizada y al avance de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todo el país.

Véase Figura 2 en Anexo, Teoría de Cambio.

III. RESULTADOS Y ALIANZAS

Resultados Esperados

Producto 1: Fortalecimiento del SINGEI y de la presentación de informes en el ETF

El propósito de este producto es mejorar la información base y fortalecer los mecanismos de generación de reportes climáticos de Honduras, con el objetivo de establecer una base sólida para el reporte bajo el Marco de Transparencia Reforzado (MTR) del Acuerdo de París. Además, como parte de la preparación previa al MTR, se desarrollará un plan de capacitación para los expertos, que incorpore contenidos sobre enfoque de género. Cabe destacar que la implementación del plan de capacitación no está incluida en este proyecto. Para el logro de este producto se establecen las actividades detalladas a continuación:

Actividad 1.1: Elaboración del INGEI para el período 2016-2020

El objetivo de esta actividad es actualizar el INGEI-NDC, corregir errores de la serie temporal 2016 al 2020. La actual herramienta del INGEI presenta importantes limitaciones que le impiden cumplir con los requisitos de un inventario de GEI bajo el MTR. Los esfuerzos se centrarán en actualizar y corregir la herramienta existente para cumplir con los requisitos de reporte del BUR. Asimismo, dentro de esta actividad se desarrollará la propuesta para el Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, siglas en inglés) para conseguir fondos para el BTR1 y la 4NC/BTR2.

Entre las acciones a realizar se incluyen:

1. Realizar un análisis de las limitaciones y posibles mejoras a realizar en el INGEI-NDC;
2. Capturar información para actualizar la serie temporal;
3. Actualizar los factores de emisión y los parámetros que no cumplen con las Directrices 2006;
4. Revisar, analizar y brindar apoyo para la completitud de las estimaciones de SEN e ICF (Energía y UTCUTS);
5. Actualizar las estimaciones de emisiones y sumideros;
6. Calcular las categorías clave; y
7. Generar los archivos de Excel del INGEI.
8. Transferencia de capacidades para los socios de la DNCC y SINGEI con enfoque y desglose de género.

Actividad 1.2: Elaboración del segundo BUR

Esta actividad se centra en la preparación del segundo Informe Bienal de Actualización (BUR) del país, el cual incluirá la revisión del anexo técnico específico sobre REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) elaborado por ICF.

Se trabajará en las siguientes acciones:

1. Actualización de la información del capítulo de circunstancias nacionales y el de necesidades y soporte recibido;
2. Elaboración del capítulo del INGEI, mitigación y MRV;
3. Revisión del Anexo REDD+ desarrollado por ICF.

Producto 2: Regulación nacional de la huella de carbono integrando la perspectiva de género

El propósito de este producto es establecer una regulación y una herramienta que faciliten la creación e identificación de acciones encaminadas a lograr los objetivos de mitigación establecidos en la NDC de Honduras. Además, se espera que esta actividad también promueva indirectamente la importancia de implementar acciones en el sector privado, al difundir y visibilizar su relevancia en la lucha contra el cambio climático.

Actividad 2.1: Desarrollo de la propuesta de marco reglamentario

Esta actividad se centra en el desarrollo de una propuesta de marco reglamentario para el programa nacional de huella de carbono en Honduras. El PNUD ha brindado apoyo a varios países de América Latina para desarrollar programas nacionales de huella de carbono a nivel organizacional, con el

objetivo de fomentar la participación del sector privado y público en las acciones de mitigación del país. En el caso de Honduras, se requiere una normativa que regule el futuro programa nacional de huella de carbono, la cual debe incluir la estandarización del cálculo y la presentación de las emisiones por parte de los sectores público y privado, así como el esquema de reconocimientos e incentivos asociados al compromiso de las organizaciones en la gestión de sus emisiones. La normativa debe aprovecharse para incluir cuestiones de género que tengan en cuenta las circunstancias diferenciales de las mujeres hondureñas y que redunden en lograr una mayor igualdad de género en el mercado laboral, incorporando a las mujeres como eje integral de la transición ecológica. Esta actividad busca establecer un marco normativo claro y consistente que facilite la implementación del programa y promueva la participación de las organizaciones en la reducción de sus emisiones de carbono. Asimismo, dentro de esta actividad se ha presupuestado un apoyo a la participación de Honduras en la COP27 de Sharm el-Sheij.

Actividad 2.2: Diseño de la herramienta electrónica

Esta actividad se enfoca en el diseño de una herramienta electrónica que permita el cálculo de la huella de carbono a nivel organizacional, basada en el marco reglamentario desarrollado en la Actividad 1.1. El propósito de esto es fomentar la participación del sector privado y público en la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y fortalecer el monitoreo del progreso en el logro de las NDC y la implementación de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (LT-LEDS).

Esta herramienta electrónica permitirá a las organizaciones calcular y monitorear sus emisiones de carbono de manera más eficiente y precisa, lo que les ayudará a identificar oportunidades de reducción y mejorar su desempeño ambiental. Además, al promover el uso de esta herramienta, se espera incentivar la participación de las organizaciones en la mitigación del cambio climático y el logro de los objetivos establecidos en las políticas climáticas nacionales. La implementación de esta actividad contribuirá a fortalecer los sistemas de monitoreo y seguimiento de las emisiones de carbono y promoverá una mayor transparencia y rendición de cuentas en relación con los compromisos climáticos del país. La herramienta electrónica estará acompañada de un plan de capacitación sobre la norma y uso de esta.

Los productos de conocimiento (entregables) del producto 2 serán:

- 1 propuesta de legislación que regule el programa nacional de huella de carbono de Honduras que integre la perspectiva de género.
- 1 herramienta electrónica que permite el cálculo de la huella de carbono a nivel organizacional.
- 1 plan de capacitación para la Dirección Nacional de Cambio Climático sobre la regulación y el uso de la herramienta electrónica.

Producto 3: Reglamento nacional de la Ley de Transacciones de Carbono Forestal integrando la perspectiva de género

De manera similar al producto anterior, el objetivo de este producto es establecer un reglamento , en base a una evaluación previa del estado actual, que facilite lograr los objetivos de mitigación establecidos en la NDC de Honduras y obtener financiamiento para las acciones verdes que se desarrollen en el país. Además, se espera que esta actividad también promueva la implementación de medidas de mitigación en el sector privado, al desarrollar un sistema que beneficie estas medidas. Cabe destacar que este producto sólo incluye el desarrollo de la propuesta del marco reglamentario, no la implementación de un mercado de carbono nacional.

Actividad 3.1: Evaluación del estado actual

La Actividad 3.1 tiene como objetivo principal evaluar el estado actual en Honduras en términos de capacidad institucional, regulación e infraestructura relacionada con los mercados de carbono. Esta evaluación es fundamental debido a los recientes avances en la adopción de decisiones sobre los mercados de carbono en el marco del Acuerdo de París durante la COP 26 en Glasgow. Una de las

principales dificultades para su implementación radica en el hecho de que, a diferencia del Protocolo de Kioto, en el Acuerdo de París todos los países tienen obligaciones legalmente vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) expresadas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), lo que implica que las transferencias de resultados de mitigación deben considerarse en el cálculo del cumplimiento de las NDC. Por lo tanto, para participar en los mercados de carbono, es necesario desarrollar capacidades institucionales, regulaciones e infraestructuras que eviten la doble contabilización y garanticen la integridad ambiental.

En este contexto, la Actividad 3.1 consiste en realizar una evaluación exhaustiva del estado actual de Honduras en relación con los mercados de carbono. Esto incluye analizar la capacidad institucional existente, la regulación vigente y la infraestructura disponible para el desarrollo y la implementación de los mercados de carbono. La evaluación incluirá el rol y participación del sector productivo, el sector social y la perspectiva de género. La evaluación permitirá identificar fortalezas y debilidades, así como posibles áreas de mejora, que servirán de base para el diseño de la regulación y las estrategias de implementación en la siguiente actividad.

Actividad 3.2: Preparación de una propuesta de marco reglamentario

La Actividad 3.2 tiene como objetivo principal la preparación de una propuesta de marco reglamentario que establezca las normas y los lineamientos para el desarrollo de los mercados de carbono forestal en Honduras. Esta propuesta se basará en los resultados obtenidos en la evaluación del estado actual realizada en la Actividad 3.1, así como en las mejores prácticas internacionales y las experiencias de otros países.

Durante esta actividad, se llevará a cabo un proceso de consulta y diálogo con actores clave, incluyendo representantes del sector público, privado, organizaciones de mujeres y la sociedad civil, para asegurar la participación y el consenso en la elaboración de la propuesta. Se abordarán aspectos como la estructura institucional, los mecanismos de supervisión y monitoreo, los requisitos para la participación en los mercados de carbono forestal, los criterios de elegibilidad, la regulación de la contabilización y verificación de las reducciones de emisiones y el impacto y beneficios para las mujeres y los grupos vulnerables.

La preparación de esta propuesta de marco reglamentario es fundamental para sentar las bases sólidas y claras que guiarán el desarrollo de los mercados de carbono forestal en Honduras. La propuesta busca garantizar la transparencia, la confiabilidad y la consistencia en las transacciones, así como establecer las condiciones necesarias para que las acciones de mitigación se contabilicen correctamente y contribuyan al logro de los compromisos climáticos del país.

Los productos de conocimiento (entregables) del producto 3 serán:

- 1 Diagnóstico del estado de la situación en Honduras en términos de regulación, infraestructura y capacidades institucionales y técnicas relacionadas con los mercados de carbono forestal.
- 1 Propuesta de reglamento nacional de la Ley de Transacciones de Carbono Forestal en Honduras que tenga en cuenta el enfoque de género e inclusión.

Producto 4: Planes de implementación de medidas de NDC en el sector energéticoEl objetivo de este producto es fortalecer las medidas del sector energético que suponen el principal soporte de la ambición de Honduras en su NDC. Para ello se revisarán los acuerdos y pactos, para evitar barreras que impidan la implementación, se actualizarán las estimaciones de mitigación de las medidas y se trabajará en conseguir financiamiento para su implementación. En conjunto se espera que estas actividades aseguren la implementación efectiva de las medidas del sector contribuyendo en gran medida a la mitigación comprometida por Honduras.

Actividad 4.1: Actualización de los acuerdos vinculados a las medidas NDC y pactos energéticos con perspectiva de género

La Actividad 4.1 tiene como objetivo principal actualizar los acuerdos existentes relacionados con las medidas de energía de la NDC para que sirvan como instrumentos de planificación para su

implementación. Esta actualización tendrá en cuenta los nuevos datos estadísticos del sector y los objetivos de la NDC, así como el enfoque de género y transición justa.

En el marco de esta actividad, se llevará a cabo la revisión y actualización de los Pactos Energéticos de Honduras ante las Naciones Unidas. Estos pactos constituyen compromisos específicos y acciones concretas para impulsar la transición hacia una matriz energética más sostenible y de bajas emisiones. La actualización de los pactos energéticos permitirá alinearlos con los objetivos y metas de la NDC, garantizando así su contribución efectiva a la mitigación del cambio climático.

Actividad 4.2: Evaluación del impacto de las medidas de NDC según prospectiva energética

La Actividad 4.2 tiene como objetivo principal apoyar a la Secretaría de Energía de Honduras (SEN) en la realización de una prospectiva energética que brinde información sobre el impacto de las medidas de mitigación de las NDC.

Durante esta actividad, se realizará un análisis exhaustivo del sector energético de Honduras, considerando las medidas de mitigación establecidas en la NDC. Este análisis prospectivo permitirá evaluar el impacto de estas medidas en términos de reducción de emisiones, transformación del sector energético y logro de los objetivos climáticos del país. La información obtenida será fundamental para tomar decisiones informadas y diseñar estrategias efectivas de implementación de las medidas de la NDC en el sector energético.

Actividad 4.3: Elaboración de una estrategia financiera para la implementación de las medidas NDC

La Actividad 4.3 tiene como objetivo principal desarrollar una estrategia financiera que proporcione directrices para financiar las medidas de mitigación de la NDC relacionadas con los pactos energéticos. Esta estrategia incluirá recomendaciones para acceder a fondos climáticos, así como una estimación de los requerimientos financieros y la identificación de las fuentes y los instrumentos de financiamiento más adecuados para el país.

La elaboración de esta estrategia financiera es fundamental para asegurar la disponibilidad de recursos financieros necesarios para implementar las medidas de mitigación en el sector energético. Esto incluye identificar oportunidades de financiamiento tanto a nivel nacional como internacional, así como promover la participación del sector privado y el uso eficiente de los recursos financieros disponibles. La estrategia financiera permitirá garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de las acciones de mitigación, contribuyendo así al logro de los objetivos de la NDC y a la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático en Honduras.

Los productos de conocimiento (entregables) del producto 4 serán:

- Pactos energéticos actualizados y vinculados a las medidas energéticas de la NDC con enfoque de género.
- 1 Estudio prospectivo energético para el sector energético en Honduras para evaluar el impacto de las medidas de la NDC.
- 1 Estrategia financiera para la implementación de las medidas de mitigación propuestas en los pactos energéticos del sector energético.

Producto 5: Hoja de ruta para el NDC 2025 en alineación con el LT-LEDS y con perspectiva de género

El objetivo de este producto es fomentar la efectiva implementación de la NDC de 2021 y facilitar la preparación para la actualización de la NDC en 2025. De esta manera, se fortalecen los compromisos establecidos en la NDC de Honduras, abarcando tanto aspectos de mitigación como otros campos

relevantes. Asimismo, esta acción se alinea con la estrategia climática de largo plazo, promoviendo la creación de sinergias y el cambio transformacional que se busca en el país.

Actividad 5.1: Desarrollo de una hoja de ruta para actualizar el NDC en alineación con LT-LEDS

En esta actividad se elaborará una hoja de ruta detallada para la actualización de la NDC en línea con la Estrategia de Desarrollo a Largo Plazo Baja en Emisiones (LT-LEDS, por sus siglas en inglés). Esta hoja de ruta incluirá acciones específicas, métricas e indicadores para el monitoreo y verificación, así como la incorporación de medidas tempranas de implementación de la LT-LEDS y otros aspectos relevantes para lograr la armonización de ambos instrumentos. Además, se pondrá un énfasis especial en la formulación de estrategias que promuevan y amplíen, en la medida de lo posible, los compromisos de género e inclusión social establecidos en la NDC.

Actividad 5.2: Apoyo a la aplicación de la hoja de ruta

En esta actividad se brindará apoyo para la implementación de la hoja de ruta desarrollada. Esto implica proporcionar asistencia técnica, capacitación y recursos necesarios para que las instituciones y actores relevantes puedan llevar a cabo las acciones definidas en la hoja de ruta de manera efectiva e integrando el enfoque de género. El objetivo es asegurar que las medidas propuestas se implementen de manera oportuna y eficiente, y contribuyan al logro de los objetivos establecidos en la actualización de la NDC. Dentro de esta actividad se llevará a cabo un monitoreo de los avances para poder coordinar los esfuerzos, así como se desarrollará el NDC Partnership Plan 2023-2024 y su plan de implementación.

Adicionalmente, se realizará un proceso de consultas con los actores clave para la implementación de la hoja de ruta, incluyendo representantes del sector público, privado, organizaciones de mujeres y la sociedad civil, para asegurar la participación y el consenso en la elaboración de la propuesta. Los resultados de estas consultas serán socializados mediante un taller, con lo cual se dará por válido el proceso consultivo desarrollado desde la elaboración de la hoja de ruta hasta su implementación.

Actividad 5.3: Campaña de comunicación de la LT-LEDS

Esta actividad se enfoca en la realización de una campaña de comunicación para difundir y promover la LT-LEDS. La campaña buscará generar conciencia y comprensión sobre los objetivos, beneficios y acciones contempladas en la LT-LEDS, tanto entre la población en general como entre los actores relevantes, con especial énfasis en las organizaciones de mujeres, grupos vulnerables y la sociedad civil. Se utilizarán diferentes medios y estrategias de comunicación para asegurar una amplia difusión de la información y fomentar la participación de diversos grupos de interés en la implementación de la estrategia de comunicación, que enfatizará el componente de género de la LT-LEDS.

Entregables:

- 1 Hoja de ruta para las NDC de 2025.
- Informes de evaluación trimestrales sobre la implementación de la NDC.
- 1 documento de validación del proceso consultivo.
- 1 NDC Partnership plan y su plan de implementación.
- 1 Campaña de difusión de la LT-LEDS.

Como se muestra en la Figura 3 del Anexo “Relación de los productos con los objetivos”, el proyecto se encuentra alineado con el Programa de País del PNUD, específicamente con el producto 3.1: "La población hondureña, la administración pública y el sector privado han fortalecido capacidades para promover una economía sostenible y la resiliencia al cambio climático, brindando medios de vida sostenibles a grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes". Asimismo, se enmarca en el Efecto 2.3 del UNSDCF: "El Estado Hondureño implementa políticas, estrategias y programas que permiten fortalecer la sostenibilidad y resiliencia de su desarrollo". El proyecto se vincula al plan estratégico, según el indicador 1.1 La Agenda 2030, el

Acuerdo de París y otros marcos acordados intergubernamentalmente se integran en los planes de desarrollo nacionales y locales, se establecen medidas para acelerar el progreso y se evalúan los presupuestos y el progreso utilizando soluciones basadas en datos.

Además, el resultado 1 del plan de trabajo del proyecto Climate Promise, denominado "Escala y velocidad: los países han fortalecido efectivamente los mecanismos de gobernanza y financiamiento inclusivos y con perspectiva de género para permitir la entrega y el seguimiento de los objetivos de NDC en todos los sectores ", es respaldado por los productos 1, 2, 3 y 4 de este proyecto. Específicamente, el producto 1 apoya el resultado 1.4 "Sistemas y procesos de datos y transparencia para el ETF", mientras que los productos 2, 3 y 4 respaldan el resultado 1.1 "Políticas, estrategias, planes y marcos regulatorios inclusivos para respaldar la implementación de las NDC y promover la recuperación verde". Por su parte, el producto 5 contribuye al resultado 2 "Amplificar la ambición: los países han establecido vías de desarrollo a largo plazo netas cero y resilientes al clima alineadas con el Acuerdo de París", a través del resultado 2.1: "Fortalecimiento de capacidades para mejorar las NDC alineadas con las LTN".

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados

El PNUD se apoyará de profesionales que apoyen la coordinación del proyecto. El personal clave de PNUD Honduras será: Rol de Coordinación Nacional de Proyectos (100%) responsable de supervisar y gestionar los procesos técnicos, administrativos, financieros y políticos de las actividades a nivel nacional, la inclusión de enfoques clave como género, resiliencia y gobernanza y coordinación con entidades de nivel nacional para el desarrollo de productos de alto gobierno; un cargo de apoyo administrativo (50%) que prestará apoyo a las actividades logísticas, financieras y de gestión del proyecto, complementado por oficiales de Género y Monitoreo y Evaluación del PNUD. Asimismo, para la realización de productos de este proyecto se contará con apoyo externo en forma de consultores/as nacionales e internacionales, y empresas de consultoría y comunicación. Los recursos necesarios se complementarán tambien con el equipo técnico de la Direccion Nacional de Cambio Climático de SERNA y el apoyado por el NDC Partnership.

Alianzas

La implementación del proyecto implicará la participación de múltiples actores clave, entre ellos SERNA, SEN, SRECI y SEFIN. Además, existen varios proyectos en curso o recientemente completados que se relacionan con varias áreas de interés cubiertas por este proyecto. Honduras ha realizado ya dos procesos relacionados con la NDC, la creación de la primera INDC (posteriormente confirmada como NDC) y la actualización de la NDC en 2021, por lo que dispone de información sobre lecciones aprendidas en ese proceso. Existen varias oportunidades de colaboración, principalmente en áreas como el diseño e implementación de políticas y estrategias, el fortalecimiento institucional, la capacitación y el análisis intersectorial. La Tabla 1 resume los principales proyectos en curso que tienen el potencial de contribuir a este proyecto.

Tabla 1. Posible intercambios y asociaciones con otras iniciativas

Nombre del proyecto	***Información de línea base***
Sistema Nacional Integrado de Monitoreo del Cambio Climático de Honduras (CBIT)	Objetivo general: Diseño, establecimiento e implementación de un Sistema de Transparencia Climática en Honduras, que sirva para monitorear el progreso nacional en materia de cambio climático, a través de un proceso participativo e inclusivo que permita definir una serie de acciones y lineamientos adecuados, orientados al cumplimiento de los compromisos del país, tanto de la agenda climática nacional como internacional. La implementación de la NDC debe estar recogida y monitoreada dentro del sistema de monitoreo y utilizarán las herramientas y resultados de la plataforma como parte del proceso.

Nombre del proyecto	*Información de línea base*
Programa de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal (CLIFOR)	Objetivo general: El programa promueve la extensión de la silvicultura comunitaria con un enfoque de adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad de las comunidades a sus efectos. Al mismo tiempo, se busca la sinergia con los esfuerzos del país contra la tala ilegal y la mitigación del cambio climático. Esta es una de las medidas que contribuirán a alcanzar la ambición incluida en la NDC.
Apoyo Rápido de Preparación para la Recuperación Resiliente ("Resilient Recovery Rapid Readiness Support")	Objetivo general: Desarrollo de una Estrategia Nacional de Recuperación Resiliente y un plan de inversión para la implementación de la Estrategia, incluida la identificación de la cartera de proyectos priorizados. La adaptación y recuperación es una parte fundamental de los objetivos de la NDC de Honduras a la cual apoya este proyecto.
Adaptación Basada en Ecosistemas en el Corredor Forestal Central de Tegucigalpa (Proyecto AdaptarC+)	Objetivo general: El objetivo principal del proyecto es aumentar la resiliencia climática de las comunidades más vulnerables en el Corredor Forestal Central y la capacidad de adaptación de sus municipios con énfasis en asegurar los medios de vida y la provisión continua de bienes y servicios ecosistémicos para Tegucigalpa y sus alrededores. La adaptación y recuperación es una parte fundamental de los objetivos de la NDC de Honduras a la cual apoya este proyecto.

El proyecto tiene como objetivo apoyar la implementación de las hojas de ruta técnicas de la NDC 2021 para mejorar las oportunidades de implementación de medidas en mitigación, adaptación, financiamiento y la inclusión social e igualdad de género, que habiliten condiciones y contribuyan al cumplimiento de compromisos de la NDC, CMNUCC y Acuerdo de Paris. Por lo tanto, la participación de diferentes sectores y actores es de gran importancia para el desarrollo de este proyecto.

La integración de los diferentes sectores se basará en acuerdos institucionales que se están desarrollando actualmente en el marco de los diferentes proyectos que apoyan el diseño e implementación de un sistema nacional de transparencia, así como sistemas sectoriales de MRV.

Los principales interesados identificados para establecer asociaciones son:

Instituciones gubernamentales
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
Secretaría de Energía (SEN)
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI)
Secretaría de Finanzas (SEFIN)
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL) and Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)
ONG
Alianza Hondureña frente al Cambio Climático (AHCC)

Riesgos y Supuestos

El análisis de riesgos y supuestos se muestra en el Anexo "Análisis de Riesgo".

Participación de las Partes Involucradas

El proceso de preparación de las anteriores Comunicaciones Nacionales y los Informes Bianuales de Actualización presentados ante CMNUCC ha contribuido al fortalecimiento institucional de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) como entidad líder competente para la aplicación de la Convención, así como de otras instituciones relevantes a nivel nacional. Este proyecto mejorará la capacidad para actualizar e implementar las NDC, adicionalmente fortalecerá la sostenibilidad para la preparación futura de Comunicaciones Nacionales, BTR y Estrategias a Largo Plazo, y facilitará los requisitos de reporte ante la CMNUCC. Se facilitará la participación de todos los actores interesados

en la formulación de políticas y medidas de mitigación y adaptación para asegurar la apropiación y sostenibilidad del proyecto.

La participación, sensible al género y apropiada para todas las generaciones de los interesados y procesos de consulta, es fundamental para el éxito del proyecto. Se ha logrado una participación efectiva de los principales interesados durante la actualización de la NDC 2021 que es la base del presente proyecto, y se espera que, durante su implementación, monitoreo y evaluación, se fortalezca la identificación de actores mediante el desarrollo de las actividades, respondiendo a las necesidades nacionales en constante mejora. La propuesta del proyecto pretende fortalecer la participación de los actores interesados para que participen de manera conjunta en abordar los problemas y desafíos del cambio climático, tanto en la adaptación como en la mitigación. Se espera que los interesados del proyecto provengan de una amplia gama de sectores, incluyendo ministerios y agencias competentes, comunidades locales, autoridades locales y ONG, medios de comunicación, instituciones de investigación, el sector privado y organizaciones internacionales, con énfasis en sectores relacionados. La participación y consulta de los actores se basará en un enfoque de derechos humanos e igualdad de género, garantizando la participación plena y efectiva de las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes. El objetivo es forjar fuertes alianzas con todos los actores, incluida la sociedad civil, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las comunidades y el sector privado.

Se entiende que la manera más efectiva de abordar el cambio climático es permitir una verdadera cogestión del enfoque hacia el tema, involucrando a todos los actores clave, particularmente en relación con el diseño e implementación de acciones de mitigación y adaptación, en el marco de lograr los objetivos más amplios del desarrollo sostenible. La integración de los diferentes sectores fortalece la capacidad institucional y técnica de los distintos actores e instituciones, no limitándose a un pequeño grupo de expertos y tomadores de decisiones en la institución gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones nacionales en virtud de la Convención. Se harán esfuerzos para tener en cuenta las necesidades de los grupos excluidos y marginados, que son los más afectados por el cambio climático y tienen menos recursos para adaptarse. En particular, se promoverá la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a lo largo de las actividades del proyecto y la participación de los actores se llevará a cabo de manera inclusiva y sensible al género. Además, la participación de los interesados se desarrollará mediante consultas y diálogos culturalmente apropiados con los pueblos indígenas y afrodescendientes, realizados por expertos especializados.

Con el fin de facilitar la participación y mejorar la transparencia y el acceso a la información, el equipo del proyecto utilizará diversas herramientas, incluyendo el pensamiento de diseño, la ciencia del comportamiento y la prospectiva, creando así un espacio colaborativo donde diferentes actores se unirán para implementar y mejorar las NDC del país. Como puede verse en la Tabla 2, la participación será promovida por el proyecto a través de la organización de talleres con diferentes actores de los grupos de interés identificados, así como reuniones bilaterales y requisitos específicos de acuerdo con la disponibilidad y brechas de información durante la implementación del proyecto.

Tabla 2. Medios de participación de los actores involucrados

Nombre del actor	***Papel en el proyecto***	***Métodos de participación***
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)	Entidad clave y coordinación institucional.	Reuniones bilaterales.
Secretaría de Energía (SEN)	Institución líder del Producto 4: Planes de implementación de medidas de NDC en el sector energético.	Reuniones bilaterales y talleres.
Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Institución sectorial	Reuniones bilaterales y talleres.
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI)	Institución sectorial.	Reuniones bilaterales y talleres.

Nombre del actor	*Papel en el proyecto*	*Métodos de participación*
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Institución sectorial.	Reuniones, encuestas, plataforma MRV (cuando esté desarrollada) y talleres.
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)	Institución sectorial.	Reuniones, encuestas, plataforma MRV (cuando esté desarrollada) y talleres.
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL) y Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)	Institución sectorial clave en igualdad de género y grupos vulnerables.	Reuniones bilaterales, encuestas y talleres.

Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr)

Durante la implementación del proyecto se explorarán aún más las oportunidades de aprendizaje entre países y transferencia de tecnología. Con el fin de presentar oportunidades de replicación en otros países, el proyecto codificará buenas prácticas y facilitará su difusión a través de plataformas globales Sur-Sur y plataformas globales como la Plataforma de Compartir Conocimiento Sur-Sur de la ONU y PANORAMA[6].

Además, para hacer oír la voz de Honduras en foros globales y regionales, el proyecto explorará oportunidades de participación significativa en eventos específicos en los que el PNUD pueda respaldar el compromiso en el discurso global de desarrollo sobre cambio climático y resiliencia climática, así como apoyar la participación para fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de Honduras para llevar a cabo actividades permanentes de información sobre el cambio climático, como los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (IGEI), el progreso en la implementación y el logro de las NDC, escenarios climáticos y análisis de costo-beneficio de medidas de mitigación, entre otros. El proyecto también brindará oportunidades de cooperación regional con países que están implementando iniciativas sobre descarbonización y desarrollo verde en contextos geopolíticos, sociales y ambientales relevantes para el proyecto propuesto en Honduras.

Conocimiento

Los productos del proyecto representan herramientas para ayudar a implementar las NDC y por tanto deben estar documentadas y aprobadas, así como adecuadamente difundidas y disponibles públicamente para que no se pierda el conocimiento adquirido no solo en beneficio de Honduras sino también de la comunidad internacional, sobre todos de países similares.

Es decir, productos como el modelo de gestión del marco reforzado de transparencia, las regulaciones para mercados de carbono y programas de huellas de carbono, la estrategia de financiamiento para el sector energía, etc., representan medidas habilitantes estratégicas sobre las cuales se podrá escalar la ambición en el país, por lo que es imprescindible hacer una adecuada gestión de conocimiento para que nos pierda todo la experiencia y conocimiento adquirido y poder seguir trabajando sobre ella. Por tanto, se prepararán infografías, diagramas, publicaciones y otras herramientas comunicacionales para facilitar la gestión de conocimiento.

Los resultados del proyecto serán difundidos dentro y más allá del área de intervención del proyecto a través de redes y foros existentes de intercambio de información. El proyecto identificará y participará, según sea relevante y apropiado, en redes científicas, políticas y/o cualquier otra red que pueda beneficiar al proyecto. El proyecto identificará, analizará y compartirá lecciones aprendidas que puedan ser beneficiosas para el diseño e implementación de proyectos similares y difundirá ampliamente estas

[6] https://panorama.solutions/es

lecciones. Habrá un intercambio continuo de información entre este proyecto y otros proyectos de enfoque similar en el mismo país, región y a nivel global.

Sostenibilidad y Escalamiento

El Proyecto se inscribe en un esquema de desarrollo y ejecución que está deliberadamente delimitado para seguir pautas en procedimientos y contenido, sin ser su propósito introducir innovaciones o cambios sustanciales en ellos. Sin embargo, se esperan innovaciones y potencial de escalabilidad en los sistemas, instrumentos y herramientas relacionadas con las NDC, es decir, el marco legal e institucional, así como el conocimiento y know-how para enfrentar los impactos del cambio climático y cumplir con los compromisos internacionales.

En este sentido, se buscará la innovación, sostenibilidad y potencial de escalabilidad de manera continua, dadas las regulaciones en torno al marco de transparencia del Acuerdo de París, la necesidad de una comparación sistemática del progreso en la reducción de gases de efecto invernadero y los procesos de adaptación, y la revisión periódica de la estrategia nacional frente al cambio climático.

Aunque los productos del proyecto se centren en diversas áreas, como el INGEI, los mercados de carbono, entre otros, todos estarán integrados en el sistema de transparencia climática que Honduras está desarrollando. Si bien este sistema aún no está operativo, se espera que comience a desarrollarse y funcionar durante el período del proyecto. Por tanto, el proyecto aprovechará al máximo dicho sistema para asegurar la sostenibilidad de los resultados y proporcionar una guía para otros proyectos que permitan el escalamiento de las actividades desarrolladas.

Implementar ciertas acciones puede reforzar eficazmente la sostenibilidad de los resultados, especialmente en lo que respecta a la creación de un Inventario de Gases de Efecto Invernadero fácilmente actualizable y confiable, así como el cálculo preciso de la mitigación potencial y escenarios consistentes en el sector energético. Una acción fundamental es asegurar que el equipo en Honduras esté bien preparado y capacitado para manejar de manera independiente el sistema y utilizar las herramientas y metodologías establecidas. La calidad y la resiliencia del sistema se mejorarán gracias a la participación y capacitación de todos los actores involucrados en el proceso, incluidos los funcionarios gubernamentales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. Dotar a los expertos con los conocimientos y habilidades necesarios para utilizar el sistema y analizar los datos es crucial para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las estimaciones.

Además, el proyecto apoyará que los escenarios utilizados para la planificación de la mitigación sean consistentes y se actualicen periódicamente, contribuyendo así a sostener los resultados. Esto permitiría un análisis y ajuste continuo de las estrategias de mitigación según sea necesario. En resumen, la implementación de estas acciones respaldaría la sostenibilidad a largo plazo de los procesos de mitigación y adaptación en Honduras.

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO

Eficiencia y Efectividad de los Costos

El proyecto ha sido formulado bajo la premisa de lograr la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos, tanto humanos como económicos. Para maximizar la eficiencia y efectividad de los costos, se ha usado un enfoque basado en el análisis de la teoría del cambio del proyecto. Esto permitió explorar diferentes opciones y seleccionar aquellas que muestren un mayor potencial para lograr resultados positivos dentro de los recursos disponibles. Para ello, se llevó a cabo una evaluación exhaustiva de las intervenciones previas en el país y en contextos similares, identificando las prácticas exitosas y los enfoques efectivos que han demostrado obtener resultados tangibles en términos de implementación de proyectos de medio ambiente apoyados por fondos internacionales en Honduras.

El proyecto se beneficiará de una economía de escala para acceso a servicios esenciales para su funcionamiento incluyendo el acceso a las plataformas del PNUD y sus mecanismos de adquisición para contratación de bienes y servicios, lo que favorecerá a que las adquisiciones se realicen de una forma más expedita, con control de calidad y gestión de contratos más eficiente, y posible reducción de costos. Estos mecanismos de compra son establecidos a partir de procesos competitivos a nivel mundial y son una herramienta muy valiosa y efectiva en proyectos con calendarios muy exigentes, como es el caso de Honduras, ya que reduce significativamente los tiempos y los costos necesarios para la adjudicación de contratos.

Otro de los grandes desafíos para la eficiencia del proceso es la participación de los beneficiarios de las distintas instituciones implicadas (SERNA, SEN y SRECI). En este sentido el equipo de proyecto desarrollará actividades de inicio que garantice el conocimiento de los expertos de estas instituciones sobre las generalidades, actividades del proyecto y los mecanismos de colaboración, monitoreo y aprobación.

Servicios de apoyo directo: la Oficina de País del PNUD proveerá el espacio físico, así como los servicios logísticos y operativos para el buen funcionamiento del equipo de proyecto (comunicaciones y tecnologías, entre otros).

Además, se proporcionará apoyo a los servicios de carácter técnico, financiero y administrativo necesarios para la ejecución de las actividades programáticas (servicios de contratación y adquisiciones, entre otros). Los costos asociados a estos servicios están incluidos en el presupuesto del proyecto.

Gestión del Proyecto

Este proyecto se ejecutará utilizando la modalidad de Implementación Directa (DIM) por el PNUD y coordinará para su implementación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), la Secretaría de Energía (SEN) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI).

Ubicación del proyecto: Tegucigalpa al ser un proyecto de carácter nacional.

Auditoría: en relación con la auditoría se aplicarán las normas y procedimientos de PNUD.

Lecciones aprendidas: se prevé varios ejercicios internos regulares de lecciones aprendidas permita identificar las buenas prácticas, oportunidades y recomendaciones en el informe final del proyecto.

Servicios de apoyo directo: Para contribuir al logro de los resultados propuestos en este documento, la Oficina de País de PNUD apoyará la implementación del proyecto con los servicios de adquisiciones y contrataciones, así como asistencia técnica, gestión financiera y administrativa de los recursos necesarios para ejecución de las actividades. Para implementar las compras y contrataciones, el PNUD aplicará sus propias reglas y regulaciones políticas y procedimientos.

V. MARCO DE RESULTADOS[7]

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Outcome 3. El Estado hondureño implementa políticas, estrategias y programas que fortalecen la sostenibilidad y resiliencia de su desarrollo. Output 3.1. La población hondureña, la administración pública y el sector privado han reforzado las capacidades para promover una economía sostenible y la resiliencia al cambio climático, proporcionando medios de vida sostenibles a grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes.
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: 3.1.1. Número de iniciativas emprendidas para la promoción de una economía sostenible, con un enfoque de género Base de referencia: 0 Meta: 2 Fuente: PNUD, anual
Producto Aplicable del Plan Estratégico del PNUD: 1.1 La Agenda 2030, el Acuerdo de París y otros marcos acordados a nivel intergubernamental integrados en planes de desarrollo nacionales y locales, medidas para acelerar el progreso implementadas, y presupuestos y avances evaluados utilizando soluciones basadas en datos.
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Quantum: Apoyo a la implementación de los procesos de NDC de Honduras (00130309)

[7] El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS			METODOLOGÍA[8] Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 1	Año 2	FINAL	
Producto 1: Fortalecimiento del SINGEI y de la presentación de informes en el ETF GEN2	INGEI completado para el periodo 2016-2020	Consultoría del INGEI	0	2023	INGEI 2016-2020 completado	n.a.	INGEI 2016-2020 completado	**Metodología:** Documento del inventario (NIR) y ficheros Excel entregados a DNCC. **Riesgos:** Calidad del INGEI y su documentación insuficiente. Falta de avances con respecto al anterior INGEI. Falta de completitud de la serie temporal.
	BUR2 elaborado	Consultoría del INGEI	0	2023	BUR2	n.a.	BUR2	**Metodología:** Registro del envío oficial del BUR a UNFCCC. **Riesgos:** Retrasos en la compleción del documento. Documento de baja calidad. Anexo REDD+ no adecuadamente desarrollado. Falta de información sobre los ítems del informe.
	Propuesta para BTR1 y 4NC/BTR2 presentada para financiamiento	UNDP	0	2023	1 ProDoc	n.a.	1 Documento de Propuesta de proyecto	**Metodología:** Registro del envío del documento a GEF. **Riesgos:** No aprobación del documento. ProDoc sin la calidad suficiente para guiar el proceso.
Producto 2: Regulación nacional de la huella de carbono GEN2	Propuesta de marco reglamentario de huella de carbono aprobada por DNCC que tenga en cuenta la perspectiva de género	Consultoría huella de carbono	0	2023	1 propuesta de marco reglamentario	n.a.	1 propuesta de marco reglamentario	**Metodología:** Aprobación de la propuesta reglamentaria por parte de DNCC. **Riesgos:** Propuesta no clara que no permite el desarrollo de la herramienta. Falta de acuerdo con DNCC.
	Herramienta electrónica para huella de carbono integrada en la página del ministerio	Consultoría huella de carbono	0	2023	1 herramienta electrónica	n.a.	1 herramienta electrónica	**Metodología:** Herramienta online disponible para el uso del público. **Riesgos:** Herramienta poco amigable. Inconsistencias con la propuesta de reglamento o con la metodología del INGEI.
Producto 3: Reglamento nacional de la	Informe con la evaluación del estado actual de la regulación aprobado por SERNA	Consultoría reglamento nacional de Ley de	0	2023	1 documento de evaluación	n.a.	1 documento de evaluación	**Metodología:** Aprobación del documento por parte de PNUD. **Riesgos:** Documento no claro que no

[8] Cada consultoría utilizará su propia metodología para la elaboración de los documentos mencionados anteriormente

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS			METODOLOGÍA[8] Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 1	Año 2	FINAL	
Ley de Transacciones de Carbono Forestal integrando la perspectiva de género GEN2		Transacciones de Carbono Forestal						permite el desarrollo de la propuesta reglamentaria.
	Propuesta de marco reglamentario de mercados de carbono con perspectiva de género aprobada por SERNA	Consultoría reglamento nacional de Ley de Transacciones de Carbono Forestal	0	2023	1 propuesta de reglamento	n.a.	1 propuesta de reglamento	**Metodología:** Aprobación de la propuesta reglamentaria por parte de SERNA. **Riesgos:** Propuesta no clara que no permite la implementación efectiva. Falta de acuerdo con SERNA sobre el contenido.
Producto 4: Planes de implementación de medidas de NDC en el sector energético GEN2	Acuerdos vinculados a las medidas NDC y pactos energéticos actualizados, teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias de las mujeres y los grupos vulnerables	Consultoría internacional	0	2023	30% acuerdos actualizados	70% acuerdos actualizados	100% acuerdos actualizados	**Metodología:** Listado de los acuerdos y pactos actualizados verificando la inclusión del enfoque de género. **Riesgos:** Falta de acuerdo con SEN y los actores sobre la actualización de los acuerdos.
	Evaluación del impacto de las medidas de NDC según prospectiva energética realizada	SEN	0	2023	n.a.	1 evaluación del impacto	1 evaluación del impacto	**Metodología:** Aprobación del documento por parte de PNUD y SEN. **Riesgos:** Impactos no alineados con la metodología del INGEI. Falta de concreción en las medidas y los métodos de implementación que limita la capacidad para estimar el efecto.
	Estrategia financiera para la implementación de las medidas NDC aprobada por SEN	Consultoría internacional	0	2023	n.a.	1 estrategia financiera	1 estrategia financiera	**Metodología:** Aprobación de la estrategia financiera por parte de SEN. **Riesgos:** Falta de información nacional para desarrollar una estrategia detallada. No identificación de fondos para la financiación de la implementación de las medidas. Falta de acuerdo con SEN sobre la estrategia.
Producto 5: Hoja de ruta para el NDC 2025 en alineación con el LT-LEDS	Documento de hoja de ruta para actualizar el NDC en alineación con LT-LEDS aprobado por DNCC que tenga en cuenta cómo lograr los compromisos de género e inclusión social de la NDC y ampliarlos	Consultoría internacional	0	2023	1 hoja de ruta	n.a.	1 hoja de ruta	**Metodología:** Aprobación del documento por parte de DNCC. **Riesgos:** Documento no claro que no permite la actualización efectiva.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS			METODOLOGÍA[8] Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 1	Año 2	FINAL	
GEN2	Informes trimestrales del apoyo a la aplicación de la hoja de ruta aprobados por PNUD	Consultores nacionales de mitigación y adaptación	0	2023	2 informes	4 informes	6 informes	**Metodología:** Aprobación de los informes por parte de PNUD. **Riesgos:** Retrasos en la entrega. Falta de claridad en las actividades realizadas.
	NDC Partnership Plan 2023-2024 aprobado por PNUD	Consultor internacional	0	2023	1 plan	n.a.	1 plan	**Metodología:** Aprobación del documento por parte de PNUD. **Riesgos:** Falta de detalle del informe que limita el desarrollo del plan de implementación.
	Plan de implementación del NDC Partnership aprobado por PNUD	Consultor internacional	0	2023	1 plan de implementación	n.a.	1 plan de implementación	**Metodología:** Aprobación del documento por parte de PNUD. **Riesgos:** Documento no claro que no apoya la implementación efectiva.
	Consulta a principales grupos de interés realizada	Consultor internacional	0	2023	30 actores consultados (50% mujeres)	30 actores consultados (50% mujeres)	60 actores consultados (50% mujeres)	**Metodología:** a) Registro e informe de actividades relacionadas con el proceso de participación y b) Lista de participantes en las consultas. **Riesgos:** Los grupos interesados se abstienen de participar en la consulta.
	Campaña de comunicación de la LT-LEDS completada con perspectiva de género	Consultoría de comunicación	0	2023	20% de los productos	80% de los productos	1 campaña completa	**Metodología:** Registros de la compleción de los distintos productos. **Riesgos:** La campaña no tiene la difusión adecuada. Los productos no son los adecuados para el público objetivo.

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Plan de Monitoreo

Actividad de monitoreo	*Objetivo*	*Frecuencia*	*Medidas a seguir*	*Responsable*	*Costo*
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	PNUD	US$5539
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Semestral	El equipo del proyecto de manera interna capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	PNUD	US$1846
Aseguramiento de calidad anual del proyecto	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual (principio de 2024 y de 2025)	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	PNUD	US$1846
Revisión anual del proyecto	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. Esta revisión se basará en el aseguramiento de calidad anual del proyecto realizado por PNUD.	Una vez por año (principio de 2024)	La Junta Directiva debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas. Asimismo, la Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Junta Directiva del Proyecto	US$2946
Informe final del Proyecto	Se desarrollará un Informe del Proyecto incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Al finalizar el proyecto (principio de 2025)	El equipo del PNUD desarrollará el documento teniendo en cuenta los insumos de los participantes en el proyecto.	PNUD	US$923
Revisión final del proyecto	En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto, basada en el Informe final del proyecto, para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al finalizar el proyecto (principio de 2025)	La Junta Directiva analizará los resultados finales del proyecto y extraerá lecciones aprendidas de estos.	Junta Directiva del Proyecto	US$923

Plan de Evaluación

De acuerdo con las Guías del Evaluación del PNUD, por el momento no es requerida una evaluación externa, por el monto y duración del proyecto, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Umbrales para las evaluaciones de proyectos obligatorias

UMBRALES PARA LAS EVALUACIONES DE PROYECTOS OBLIGATORIAS	EVALUACIONES
Proyectos con un presupuesto previsto o un gasto efectivo de más de 5 millones de dólares de EE. UU. Si el proyecto tiene una duración inferior a cuatro años, solo es necesario realizar una evaluación[15]	Evaluación final **y** de mitad de período
Proyectos con un presupuesto previsto o un gasto efectivo de entre 3 millones y 5 millones de dólares	Evaluación final **o** de mitad de período
Proyectos con una duración de más de cinco años	Al menos una evaluación (final o de mitad de período)
Proyectos que emprenden una segunda fase o una etapa posterior[16]	Una evaluación antes de iniciar la nueva fase
Iniciativas de desarrollo que se están estudiando para su posible ampliación	Una evaluación antes de la expansión

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL[9][10]

		PRESUPUESTO POR SEMESTRE				PRESUPUESTO PREVISTO		
PRODUCTOS ESPERADOS	**ACTIVIDADES PREVISTAS**	**A1- S2**	**A2-S1**	**A2-S2**	**RESPONSABLE**	**Fuente de Financiamiento**	**Descripción del Presupuesto**	**Monto (USD)**
Producto 1: Fortalecimiento del SINGEI y de la presentación de informes en el ETF	1.1 Elaboración del INGEI para el período 2016-2020				UNDP-SERNA	UNDP Climate Promise	- IC (Consultor internacional): Preparación de la propuesta del Proyecto para acciones habilitantes en el CMNUCC (22,781.48 USD) - cuenta 71200*	$22,781.48
		$79,968.52			UNDP-SERNA		- Contractual services - Companies: Consultoría para desarrollar las actividades 1.1 a 1.2 (129,746.00 USD) - cuenta 72100	$79,968.52
	1.2 Elaboración del segundo BUR	$49,777.48			UNDP-SERNA			$49,777.48
	1.3 M&E: Seguimiento del progreso en el logro de los resultados, Aprendizaje, Aseguramiento de calidad anual del proyecto, Revisión anual del proyecto e Informe final del Proyecto	$5,345.67			UNDP-SERNA		- Consultor Local- M&E del proyecto (4848.75 USD)- cuenta 71400 -Talleres y Conferencias- Revisión anual del proyecto (496.92 USD)- cuenta 75700	$5,345.67
	Subtotal para el Producto 1							**$157,873.15**
Producto 2: Regulación nacional de la huella de carbono	2.1 Elaboración de propuestas procesos complementarios de NDC de Honduras	$10,000.00			UNDP-SERNA	UNDP Climate Promise	- IC (Consultor Internacional): Preparación del Documento de proyecto NDC (10.000, 00 USD) -cuenta 71200	$10,000.00
	2.2 Desarrollo de la propuesta de marco reglamentario que integre la perspectiva de género	$20,031.48			UNDP-SERNA		- Contractual services - Companies: Consultoría para desarrollar las actividades 2.2 y 2.3 (30,031.48 USD) - cuenta 72100	$20,031.48
	2.3 Diseño de la herramienta electrónica	$10,000.00			UNDP-SERNA			$10,000.00
	2.4 M&E: Seguimiento del progreso en el logro de los resultados, Aprendizaje, Aseguramiento de calidad anual del proyecto, Revisión anual del proyecto e Informe final del Proyecto	$827.58			UNDP-SERNA		- Consultor Local- M&E del proyecto (676.73 USD)- cuenta 71400 -Talleres y Conferencias- Revisión anual del proyecto (150.84 USD)- cuenta 75700	$827.58

[9] En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.


		PRESUPUESTO POR SEMESTRE				PRESUPUESTO PREVISTO		
PRODUCTOS ESPERADOS	**ACTIVIDADES PREVISTAS**	**A1- S2**	**A2-S1**	**A2-S2**	**RESPONSABLE**	**Fuente de Financiamiento**	**Descripción del Presupuesto**	**Monto (USD)**
	Subtotal para el Producto 2							**$40,859.06**
Producto 3: Reglamento de Transacciones de Carbono Forestal integrando la perspectiva de género	3.1 Evaluación del estado actual	$10,000.00			UNDP-SERNA	UNDP Climate Promise	- Viajes para desarrollar las actividades 3.1 y 3.2 (Apoyo a la COP27) (10,000.00 USD) - cuenta 71600*	$10,000.00
		$10,000.00			UNDP-SERNA		- Contractual services - Companies: Consultoría para desarrollar las actividades 3.1 y 3.2 (51,300.00 USD) -cuenta 72100	$10,000.00
	3.2 : Preparación de una propuesta de marco reglamentario y socialización del mismo	$41,300.00			UNDP-SERNA			$41,300.00
	3.3 M&E: Seguimiento del progreso en el logro de los resultados, Aprendizaje, Aseguramiento de calidad anual del proyecto, Revisión anual del proyecto e Informe final del Proyecto	$1,267.26			UNDP-SERNA		- Consultor Local- M&E del proyecto (1036.28 USD)- cuenta 71400 -Talleres y Conferencias- Revisión anual del proyecto (230.98 USD)- cuenta 75700	$1,267.26
	Subtotal para el Producto 3							**$62,567.26**
Producto 4: Planes de implementación de medidas de NDC en el sector energético	4.1 Actualización de los acuerdos vinculados a las medidas NDC y pactos energéticos	$16,450.00	$6,550.00	$6,550.00	UNDP-SEN	UNDP Climate Promise	- IC (Consultor nacional) para la actividad 4.1 (13,100.00 USD) -cuenta 71300 - Viajes para desarrollar la actividad 4.1 (13,050.00 USD) -cuenta 71600 -Talleres y Conferencias para la actividad 4.1 (3,400.00 USD) -cuenta 75700	$29,550.00
	4.2 Evaluación del impacto de las medidas de NDC según prospectiva energética		$16,666.67	$8,333.33	UNDP-SEN		- Contractual services - Companies: Parte responsable para la actividad 4.2 (25,000.00 USD) -cuenta 72100	$25,000.00
	4.3 Elaboración de una estrategia financiera para la implementación de las medidas NDC		$6,680.86	$13,361.73	UNDP-SEN		- IC (Consultor internacional) para la actividad 4.3 (20,042.59 USD) - cuenta 71200	$20,042.59
	4.4 M&E: Seguimiento del progreso en el logro de los resultados, Aprendizaje, Aseguramiento de calidad anual del proyecto, Revisión anual del proyecto e Informe final del Proyecto	$666.67	$666.67	$666.66	UNDP-SEN		- Consultor Local- M&E del proyecto (2,000.00 USD)- cuenta 71400	$2,000.00
	Subtotal para el Producto 4							**$76,592.59**
Producto 5: Hoja de ruta	5.1 Desarrollo de una hoja de ruta para actualizar el NDC en alineación con LT-LEDS	$30,000.00			UNDP-SERNA	UNDP Climate Promise	- IC (Consultor internacional) para la actividad 5.1 (30,000.00 USD) - cuenta 71200	$30,000.00

		PRESUPUESTO POR SEMESTRE				PRESUPUESTO PREVISTO		
PRODUCTOS ESPERADOS	**ACTIVIDADES PREVISTAS**	**A1- S2**	**A2-S1**	**A2-S2**	**RESPONSABLE**	**Fuente de Financiamiento**	**Descripción del Presupuesto**	**Monto (USD)**
para el NDC 2025 en alineación con el LT-LEDS	5.2 Apoyo a la aplicación de la hoja de ruta	$7,650.00	$7,650.00	$7,650.00	UNDP-SERNA		- Consultor local para mitigación (22,950.00 USD) - cuenta 71300 (NDC Partnership)	$22,950.00
		$9,066.67	$9,066.67	$9,066.66	UNDP-SERNA		- Consultor local para gobernanza e inclusión (27,200.00 USD) - cuenta 71300 (NDC Partnership)	$27,200.00
		$5,000.00	$14,425.00	$14,425.00	UNDP-SERNA		- IC (Consultor internacional) para desarrollar el NDC Partnership Plan y su plan de implementación (13,053.00 USD) - cuenta 71200 (NDC Partnership)	$33,850.00
		$10,000.00			UNDP-SERNA		- IC (Consultor internacional) para asistencia técnica en consultas con grupos de interés (10,000.00 USD) - cuenta 71200	$10,000.00
	5.3 Campaña de comunicación de la LT-LEDS	$15,000.00			UNDP-SERNA		- Contractual services - Companies: Consultoría para desarrollar la actividad 5.3 (15,000.00 USD) - cuenta 72100	$15,000.00
	5.4 M&E: Seguimiento del progreso en el logro de los resultados, Aprendizaje, Aseguramiento de calidad anual del proyecto, Revisión anual del proyecto e Informe final del Proyecto	$3,559.50			UNDP-SERNA		- Consultor Local- M&E del proyecto (3,568.28 USD)- cuenta 71400 -Talleres y Conferencias- Revisión anual del proyecto (297.36 USD)- cuenta 75700	$3,559.50
	Subtotal para el Producto 5							**$142,559.50**
TOTAL DE LOS PRODUCTOS								**$480,451.56**
PMU								**$45,100.00**
Apoyo a auditoria y evaluación de CP	**Subtotal Apoyo auditoría y/o evaluación de Climate Promise**						- IC (Consultor internacional) para la actividad 5.1 (2,000.00 USD) - cuenta 71200	**$2,000.00**
Direct Project Cost (DPC)	**Subtotal para el DPC**							**$12,004.00**
Costo de Apoyo (GMS)	**Subtotal para el GMS**							**$43,164.44**

		PRESUPUESTO POR SEMESTRE				PRESUPUESTO PREVISTO		
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	A1- S2	A2-S1	A2-S2	RESPONSABLE	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto (USD)
TOTAL								$582,720.00

Nota: *Ejecutado en el Marco del Plan de Inicio "Apoyo a la implementación de los procesos de NDC de Honduras" .

VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

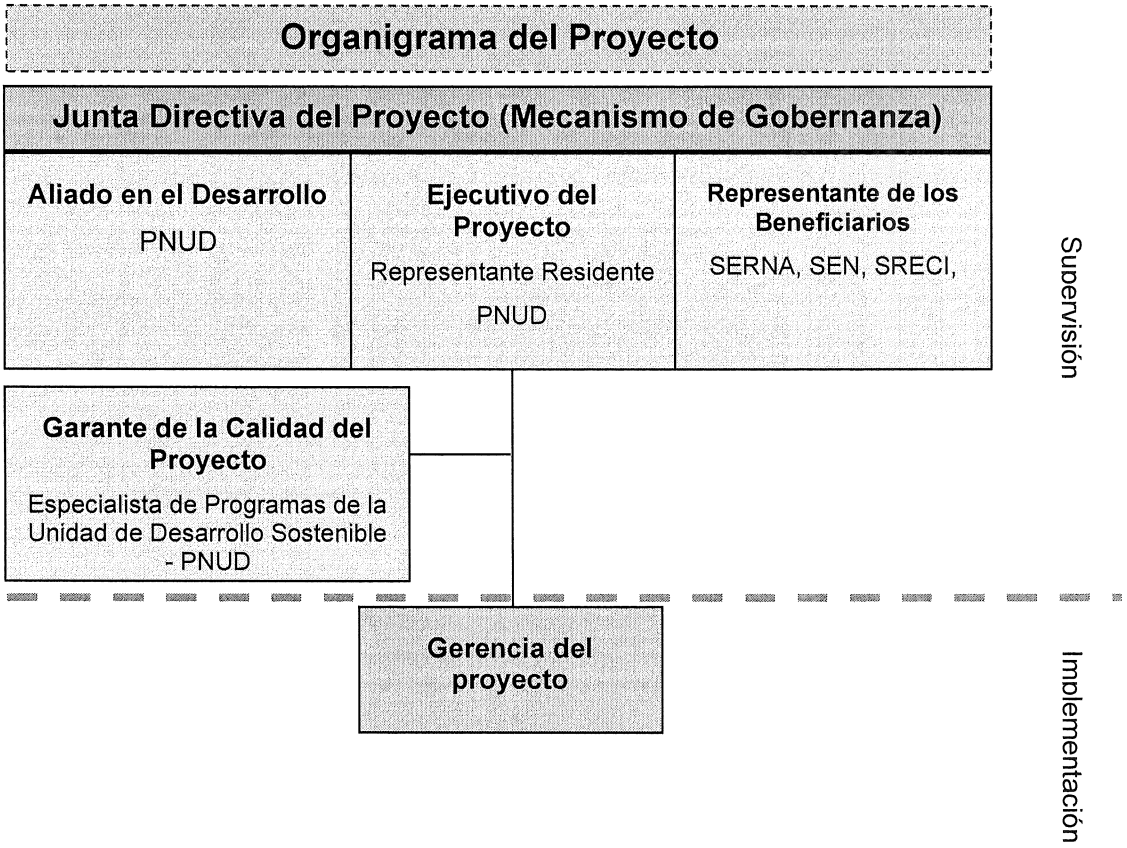

Nota: Unidad de Desarrollo Sostenible y Resiliente (UDSR); Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); Secretaría de Energía (SEN); Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI);

Junta de Proyecto

La Junta del Proyecto es el grupo responsable de tomar decisiones de gestión sobre la base de un consenso para asegurar que el proyecto alcanza sus objetivos específicos, así como cuando el Coordinador del Proyecto requiere de algún tipo de orientación o la aprobación de cualquier modificación al proyecto. La adopción de la decisión final sobre las actividades y la rendición de cuentas del proyecto descansan en el PNUD, de acuerdo con sus reglamentos, normas, políticas y procedimientos, y decisión de la junta de proyecto. El seguimiento y aseguramiento de calidad del proyecto efectuado por este grupo se lleva a cabo según los hitos de decisión diseñados durante el desarrollo del proyecto o, cuando así lo considere el Coordinador del Proyecto. Este grupo es consultado por el Coordinador del Proyecto cuando se trata de tomar decisiones en caso de que las tolerancias del proyecto hayan sido excedidas. El mencionado grupo contempla los siguientes roles:

- Ejecutivo: El ejecutivo es un individuo que representa el proyecto y preside la Junta del Proyecto. Este rol es asumido por el Representante Residente de PNUD como responsable de los resultados del proyecto. Su tarea es asegurar que el proyecto esté enfocado a lo largo de la ejecución en alcanzar sus objetivos y productos esperados que contribuirán al cumplimiento de los resultados.
- Aliado en el desarrollo: Individuos o grupos que representan los intereses de quienes proveen financiamiento o asistencia técnica al proyecto (diseño, desarrollo, facilitación, adquisición e implementación). La función principal del proveedor dentro de la Junta de Proyecto es proveer orientación respecto a la factibilidad técnica del proyecto. Este rol es asumido por PNUD, en representación del donante.

- Representante de los beneficiarios: individuos o grupos que representan los intereses de los beneficiarios finales del proyecto. El objetivo primordial de este rol en la junta es asegurar la consecución de los resultados del proyecto desde la perspectiva de los beneficiarios. Este rol es asumido por la SERNA, SEN, SRECI.

Garante del Proyecto

La garantía del proyecto es responsabilidad de cada miembro de la Junta del Proyecto. Sin embargo, el PNUD tiene una particular función de aseguramiento en la realización de las funciones de supervisión y monitoreo del uso de los recursos y el logro de los resultados acordados. El aseguramiento del proyecto debe ser realizado independiente del gerente del proyecto. El Especialista de Programas de la Unidad de Desarrollo Sostenible del PNUD tendrá el rol de aseguramiento del proyecto en nombre del PNUD.

Los potenciales miembros de la Junta del Proyecto son propuestos y recomendados para su aprobación durante la reunión del Comité de Revisión de Proyectos (LPAC, por sus siglas en inglés). La Junta del Proyecto, se reunirá trimestralmente. Se documentarán las reuniones de la junta de proyecto y se monitorea el cumplimiento de los acuerdos.

Coordinación del Proyecto

La coordinación del proyecto, en estrecha coordinación con la oficina de PNUD Honduras, serán responsables de la ejecución del proyecto día a día, dentro de los límites establecidos por la Junta del Proyecto. Su responsabilidad principal es asegurar que el proyecto produzca los resultados especificados en el documento de proyecto, y que llenen los estándares de calidad requeridos y dentro de los límites de tiempo y costo establecidos.

Las responsabilidades específicas de la Coordinación Nacional del Proyecto incluyen:

- Proporcionar dirección y orientación al equipo técnico del proyecto,
- Servir de enlace con la Junta de Proyecto para asegurar dirección general e integralidad en el proyecto,
- Trabajar en estrecha coordinación con el asesor principal de PNUD para la planificación de actividades y monitoreo del progreso,
- Identificar y obtener cualquier apoyo y asesoramiento requerido para la gestión, planificación y control del proyecto, principalmente del PNUD,
- Planificar las actividades y monitorear el progreso en relación con el marco de resultados del proyecto.

IX. CONTEXTO LEGAL

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado el 27 de abril de 1995 entre el Gobierno de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la "Agencia de Ejecución" se interpretará como una referencia al "Asociado en la Implementación".

Este proyecto será implementado por PNUD ("Asociado en la Implementación") que será el encargado de implementar el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD. Cuando la gobernanza financiera de un Asociado en la implementación no proporcione la orientación requerida para garantizar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva, se aplicará la gobernanza financiera del PNUD.

X. GESTIÓN DE RIESGOS

1. El PNUD como Asociado en la Implementación cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas del Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS por sus siglas en inglés).
2. El PNUD como Asociado en la Implementación realizará todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que ninguno de los fondos del proyecto se utilice para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por Resolución 1267 del año 1999. Este listado puede consultarse en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos y subacuerdos firmados en el marco del presente Documento de Proyecto.
3. Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (http://www.PNUD.org/ses), y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (http://www.PNUD.org/secu-srm).
4. PNUD como Asociado en la Implementación: (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa en conformidad con los Estándares y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas. El PNUD se asegurará de que los organismos y otras partes interesadas estén debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.
5. En la implementación de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el PNUD, como el Asociado en la Implementación, manejará cualquier denuncia de explotación y abuso sexual (EAS) y acoso sexual (AS) de acuerdo con sus regulaciones, reglas, políticas y procedimientos.
6. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Ello incluye el acceso a sitios del proyecto, personal relevante, información y documentación.
7. El PNUD como Asociado en la Implementación velará que las obligaciones siguientes sean vinculantes para cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario:

    a) De conformidad con el Artículo III de la SBAA, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario tendrá la responsabilidad de la seguridad y protección de cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario:

        i) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto;

ii) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la parte responsable, del subcontratista y del sub-beneficiario y la plena implementación del plan de seguridad.

b) El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigor y de sugerir modificaciones al plan cuando sea necesario. El incumplimiento de mantener e implementar un plan de seguridad apropiado como se requiere en este documento se considerará un incumplimiento de las obligaciones de la parte responsable, subcontratista y sub-receptor bajo este Documento de Proyecto.

c) En el desempeño de las actividades bajo este Proyecto, el PNUD como el Asociado en la Implementación, asegurará, con respecto a las actividades de cualquiera de sus partes responsables, sub-receptores y otras entidades involucradas en el Proyecto, ya sea como contratistas o subcontratistas, su personal y cualquier persona que preste servicios para ellos, que esas entidades cuenten con procedimientos, procesos y políticas adecuadas y apropiadas para prevenir y/o abordar la EAS y el AS.

d) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario adoptará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o programa o utilizando los fondos del PNUD. Garantizará que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude se apliquen y se apliquen a todos los fondos recibidos de o por conducto del PNUD.

e) Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org.

f) En caso de que se requiera una investigación, el PNUD realizará las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a sus locales (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario para encontrar una solución.

g) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario mantendrá informado al PNUD, como Asociado en la Implementación, de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad.

Cuando la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación.

h) Cada parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario está conforme con que, cuando proceda, los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente total o parcial de los fondos para las actividades objeto de este Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso a la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto.

Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las partes responsables, subcontratistas y sub-receptores.

i) Cada contrato emitido por la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario en relación con el presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario,

gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago.

j) En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD.

k) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, *mutatis mutandis*, en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto.

XI. ANEXOS

Árbol de problemas

Figura 1. Árbol de problemas


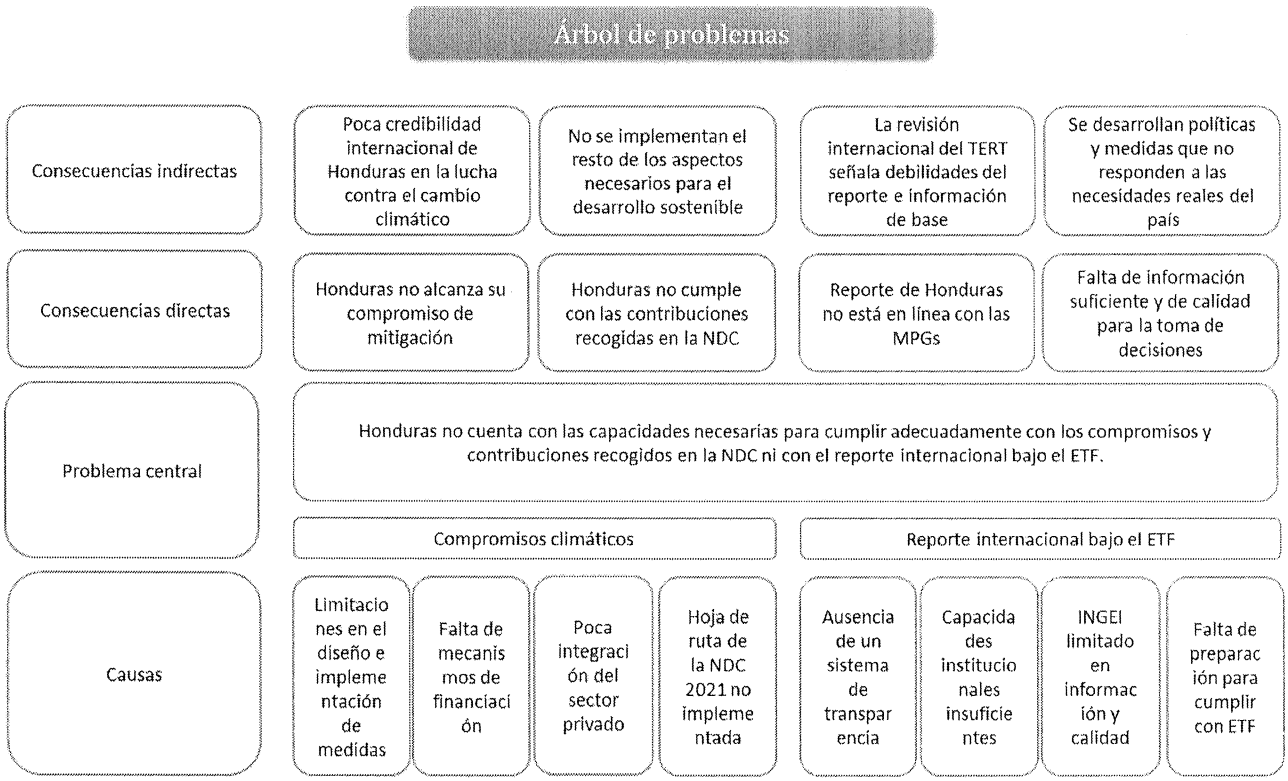



Diagrama de teoría del cambio

Figura 2. Diagrama de teoría del cambio

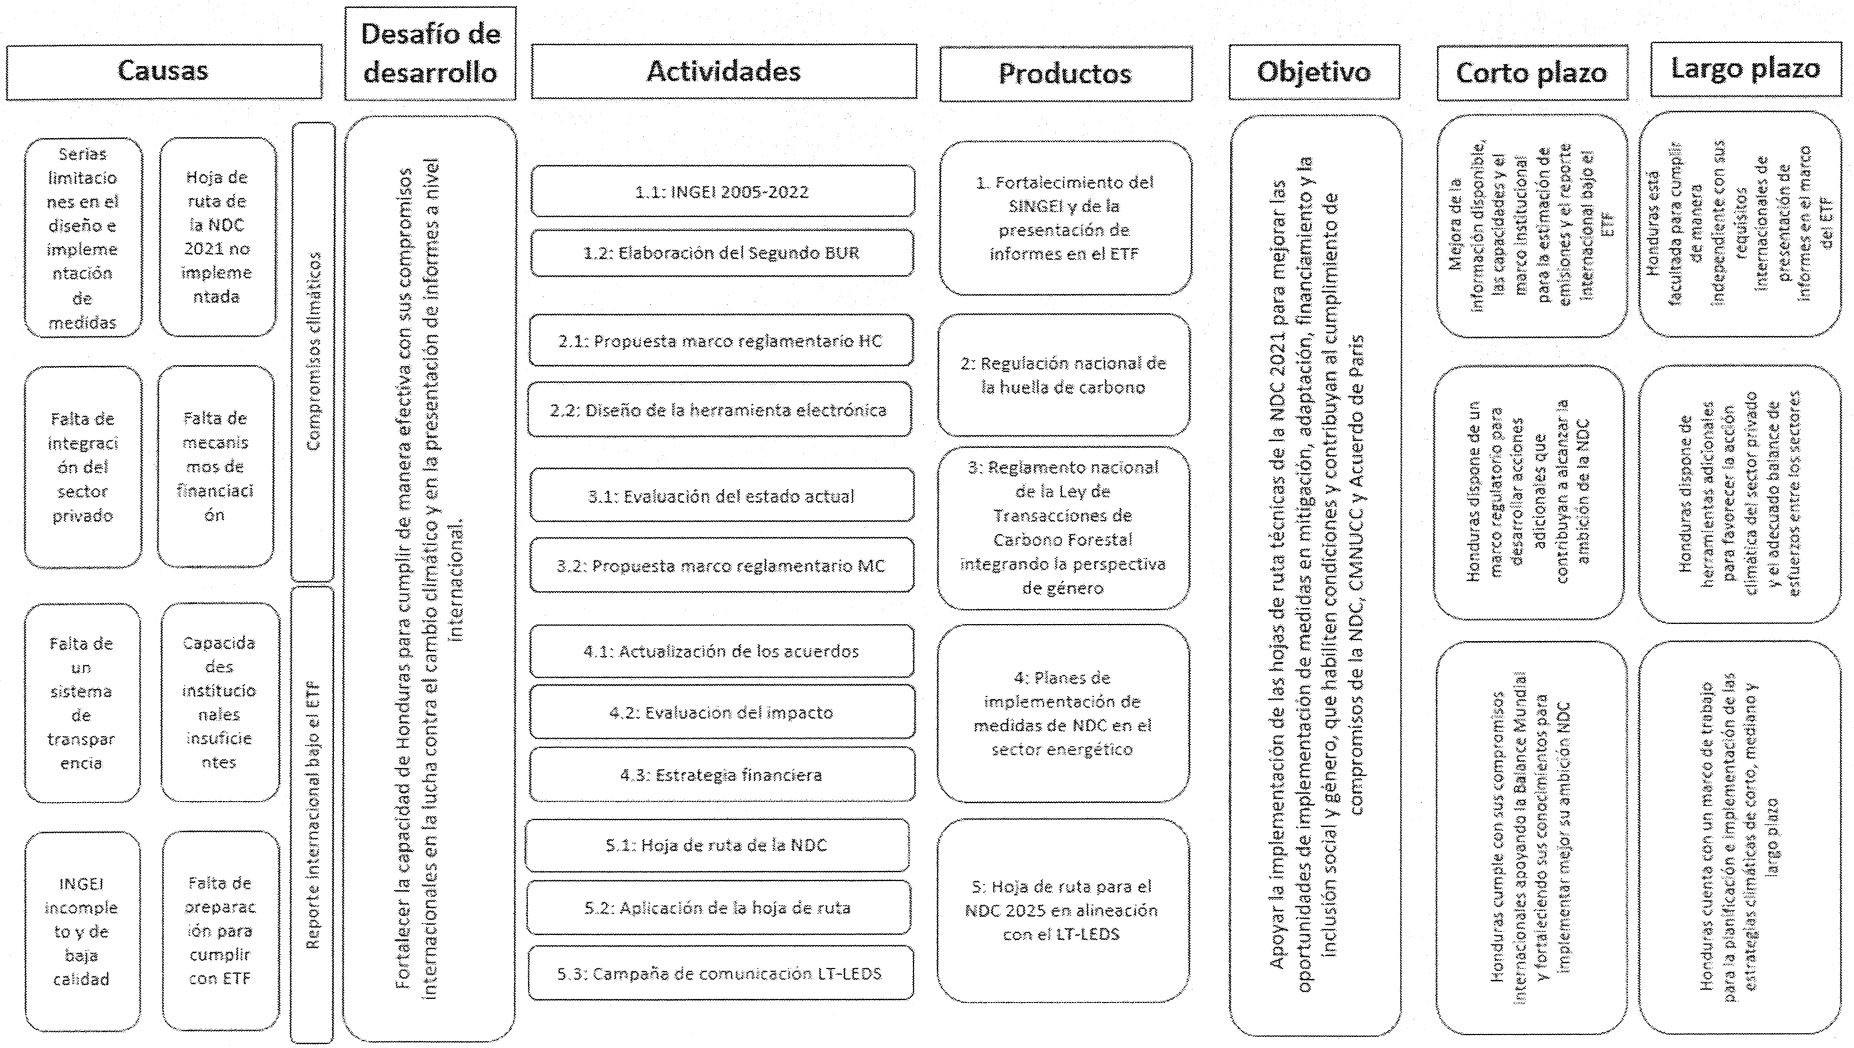


Relación de los productos con los objetivos

Figura 3. Relación de los productos con los objetivos del Programa nacional del PNUD y con el plan de trabajo de Climate Promise

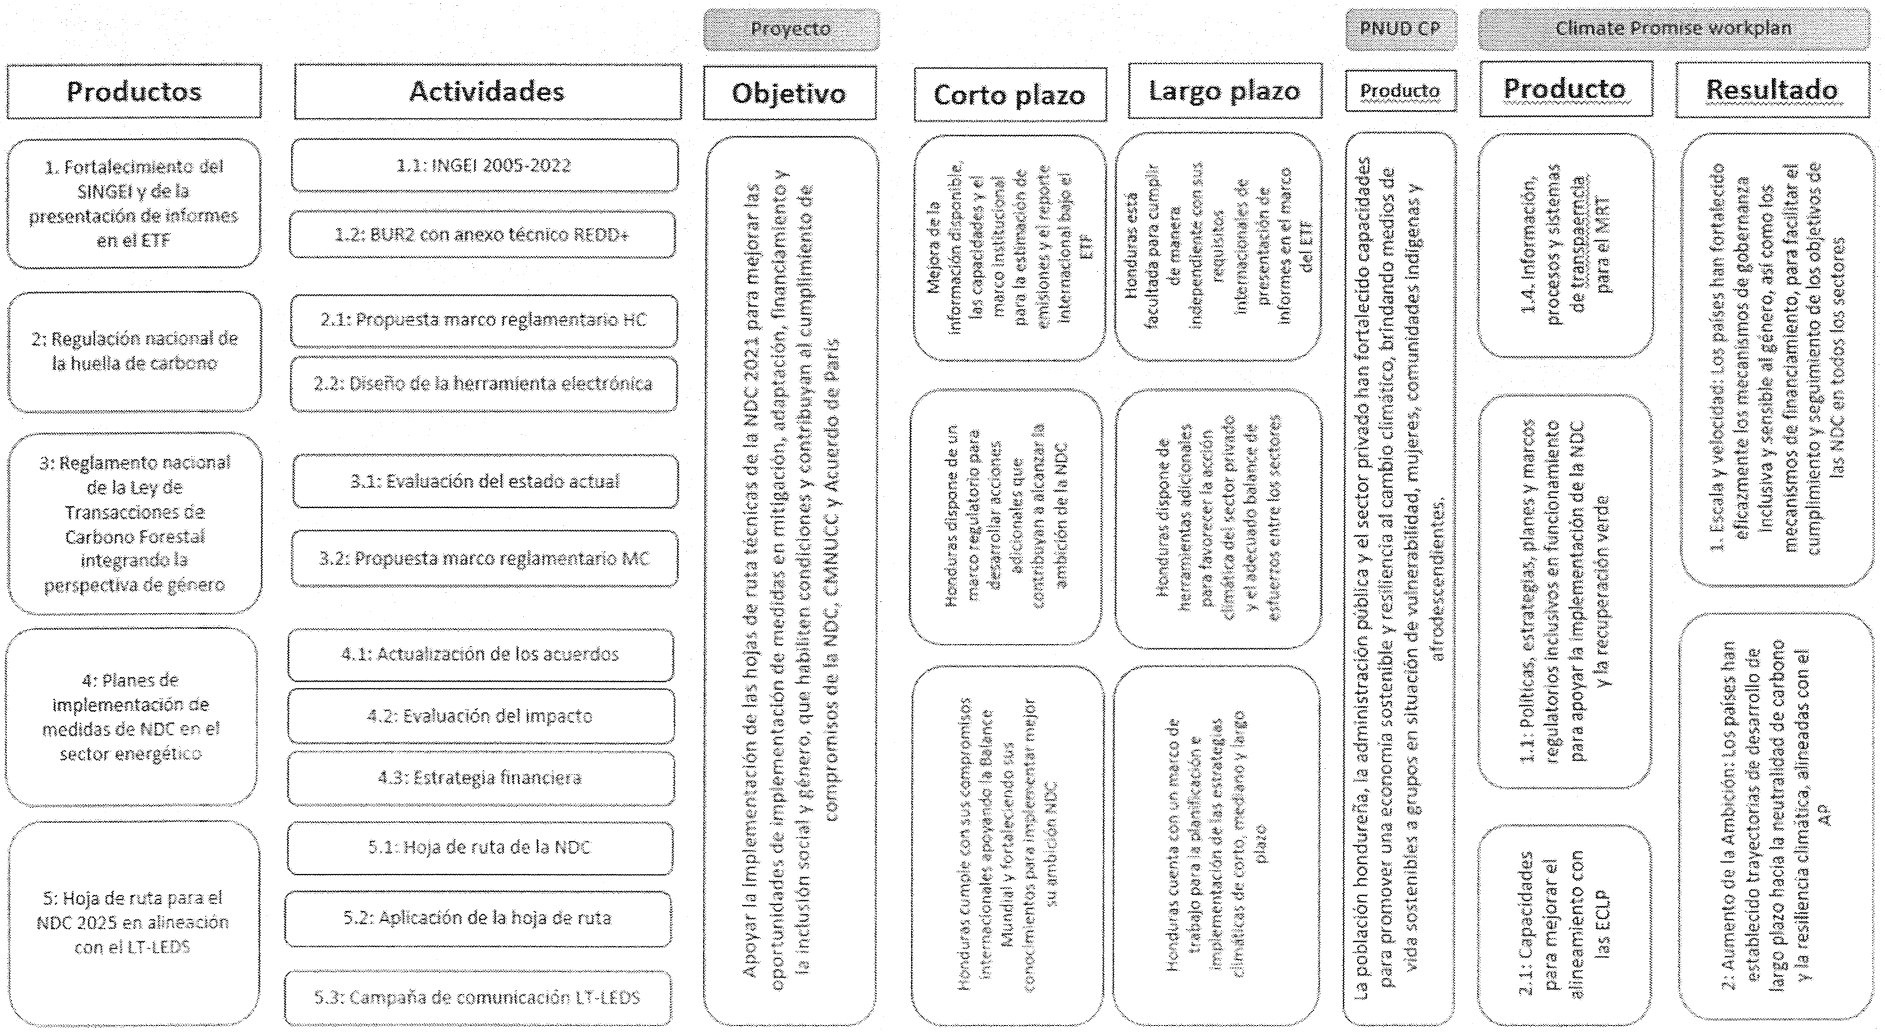

Productos y Actividades del Proyecto

Figura 4. Productos y actividades del proyecto

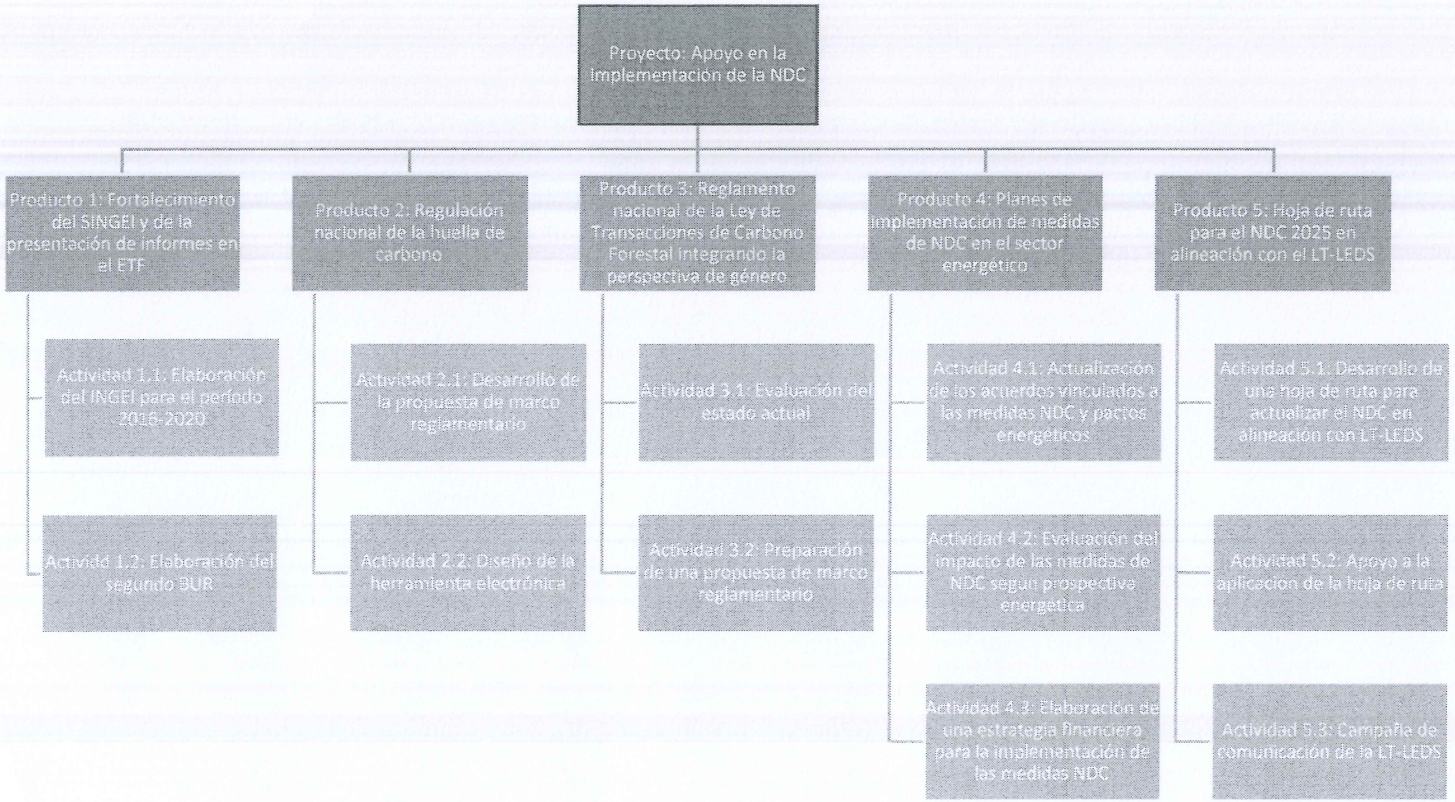

Informe de Calidad del Proyecto

☐	GARANTÍA DE LA CALIDAD (QA) DEL PROYECTO - DISEÑO
	1. ESTRATÉGICO
	1. ¿Especifica el proyecto cómo contribuirá al cambio de alto nivel a través de su vinculación con la Teoría del Cambio del programa?
☐	• 3: El proyecto está claramente vinculado a la teoría del cambio del programa. Tiene una vía de cambio explícita que explica cómo el proyecto contribuirá al cambio a nivel de efecto (*outcome*) y por qué la estrategia del proyecto probablemente conducirá a este cambio. El análisis está respaldado por evidencia creíble de lo que funciona eficazmente en este contexto e incluye supuestos y riesgos.
☒	• 2: El proyecto está claramente vinculado a la teoría del cambio del programa. Tiene una vía de cambio que explica cómo el proyecto contribuirá al cambio a nivel de efecto (*outcome*) y por qué la estrategia del proyecto probablemente conducirá a este cambio.
☐	• 1: El documento del proyecto puede describir en términos genéricos cómo el proyecto contribuirá a los resultados de desarrollo, sin un vínculo explícito con la teoría del cambio del programa. *Nota: Los proyectos que no contribuyen a un programa deben tener una Teoría del Cambio específica para el proyecto. En estos casos, consulte el icono de información para una pregunta alternativa.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El Documento de Proyecto incluye una teoría del cambio basada en un árbol de problemas y con una identificación clara a los efectos del proyecto, incluyendo los vínculos con los objetivos del Programa de País del PNUD, el UNSDCF y el plan de trabajo del proyecto Climate Promise.
	2. ¿El proyecto está alineado con el Plan Estratégico del PNUD?
☒	• 3: El proyecto responde al menos a una de las direcciones de cambio (*directions of change*)[11] especificadas en el Plan Estratégico y adapta al menos una solución emblemática (*signature solution)*[12]. El Marco de Resultados y Recursos del proyecto incluye todos los indicadores de resultados relevantes del Plan Estratégico. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)
☐	• 2: El proyecto responde al menos a una de las direcciones de cambio (*directions of change*)[13] especificadas en el Plan Estratégico. El Marco de Resultados y Recursos del proyecto incluye al menos un indicador de producción del Plan Estratégico, si procede. (Debe responder de forma positiva a ambass cláusulas.)
☐	• 1: El proyecto responde a la necesidad identificada por un socio, pero esta necesidad queda fuera del Plan Estratégico del PNUD. Seleccione también esta opción si ninguno de los indicadores relevantes del Plan Estratégico está incluido en el Marco de Resultados y Recursos del proyecto.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El proyecto responde a las tres direcciones de cambio del Plan Estratégico: transformación estructural, no dejar a nadie atrás y resiliencia se encuentra enmarcado en la solución emblemática 1 Pobreza y desigualdad, ya que el proyecto apoya de manera específica el reporte y los objetivos del Acuerdo de París, alineándose con el producto 1.1 "1.1 La Agenda 2030, el Acuerdo de París y otros marcos acordados a nivel intergubernamental integrados en planes de desarrollo nacionales y locales, medidas para acelerar el progreso implementadas, y presupuestos y avances evaluados utilizando soluciones basadas en datos".
	3. ¿Está el proyecto vinculado a los productos (*outputs)* del programa? (es decir, el Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF)/ Documento de Programa País (CPD), Documento del Programa Regional (RPD) o el Marco Integrado de Resultados y Recursos (IRRF) del Plan Estratégico para intervenciones estratégicas que no forman parte de un programa)
☒	• Sí

[11] Las tres direcciones de cambio en el Plan Estratégico 2022-2025 del PNUD son: transformación estructural, no dejar a nadie atrás y resiliencia

[12] Las seis soluciones emblemáticas del Plan Estratégico 2022-2025 del PNUD son: pobreza y desigualdad, gobernanza, resiliencia, medio ambiente, energía e igualdad de género.

[13] Las tres direcciones de cambio en el Plan Estratégico 2022-2025 del PNUD son: transformación estructural, no dejar a nadie atrás y resiliencia

☐	GARANTÍA DE LA CALIDAD (QA) DEL PROYECTO - DISEÑO
☐	• No (el QA del proyecto no puede ser aprobado)
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El proyecto responde al Producto 1.1 "La Agenda 2030, el Acuerdo de París y otros marcos acordados a nivel intergubernamental integrados en planes de desarrollo nacionales y locales, medidas para acelerar el progreso implementadas, y presupuestos y avances evaluados utilizando soluciones basadas en datos" del IRRF del Plan Estratégico del PNUD. Además, con relación al UNSDCF/CPD, el proyecto responde al resultado 3 "El Estado hondureño implementa políticas, estrategias y programas que fortalecen la sostenibilidad y resiliencia de su desarrollo" y al producto 3.1 "La población hondureña, la administración pública y el sector privado han reforzado las capacidades para promover una economía sostenible y la resiliencia al cambio climático, proporcionando medios de vida sostenibles a grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes". .
	2. RELEVANTE
	4. ¿Identifica el proyecto a los grupos objetivo, y en particular a los marginados, vulnerables y dejados más atrás (LNOB)? [14]
☐	• 3: Los grupos objetivo están claramente especificados, priorizando a los discriminados y marginados que quedan más atrás, identificados a través de un proceso riguroso basado en la evidencia.
☒	• 2: Los grupos objetivo están claramente especificados, priorizando a los grupos que quedan más atrás.
☐	• 1: El público objetivo no está claramente especificado.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): En el documento se indican los grupos objetivos, resaltando continuamente la necesidad de incluir y tener en cuenta las necesidades de las mujeres y grupos vulnerables.
	5. ¿El conocimiento, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas del PNUD y otros han influido en el diseño del proyecto?
☐	• 3: El conocimiento y las lecciones aprendidas, respaldados por evidencia creíble de fuentes tales como evaluaciones, políticas/estrategias corporativas y/o monitoreo, se han utilizado explícitamente, con referencias apropiadas, para justificar el enfoque utilizado por el proyecto.
☒	• 2: El diseño del proyecto menciona el conocimiento y las lecciones aprendidas respaldadas por evidencia/fuentes, pero no se han utilizado para justificar el enfoque seleccionado.
☐	• 1: Hay poca o ninguna mención del conocimiento y las lecciones aprendidas que informan el diseño del proyecto. Cualquier referencia hecha es anecdótica y no está respaldada por evidencia.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El diseño del proyecto se basa en las lecciones aprendidas de otros procesos, teniendo en cuenta las necesidades del país gracias a una valoración en conjunto con las autoridades climáticas de Honduras.
	6. ¿Tiene el PNUD una clara ventaja para participar en el papel previsto por el proyecto frente a los asociados nacionales/regionales/mundiales y otros actores?
☒	• 3: Se ha realizado un análisis sobre el papel de otros asociados en la esfera en que el proyecto se propone trabajar, y hay pruebas fidedignas que respaldan la participación propuesta del PNUD y sus asociados a través del proyecto, incluida la identificación de posibles asociados en la financiación. Está claro cómo los resultados logrados por los socios complementarán los resultados previstos del proyecto y existe una estrategia de comunicación para comunicar los resultados y aumentar la visibilidad frente a los socios clave. Se han considerado, según proceda, opciones para la cooperación Sur-Sur y triangular. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)
☒	• 2: Se han realizado algunos análisis sobre el papel de otros asociados en la esfera en que el proyecto se propone trabajar, y las pruebas relativamente limitadas respaldan la participación y la división del trabajo propuestas entre el PNUD y los asociados a través del proyecto, con estrategias o planes de financiación y comunicación poco claros.
☐	• 1: No se ha realizado un análisis claro sobre el papel de otros socios en el área en la que el proyecto pretende trabajar. Existe el riesgo de que el proyecto se superponga y/o no se coordine con las intervenciones de los socios en esta área. No se han considerado opciones para la cooperación Sur-Sur y triangular, a pesar de su posible pertinencia.

[14] Puesta en práctica de la nota de buenas prácticas para el equipo de las Naciones Unidas en el país (https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams)

☐	GARANTÍA DE LA CALIDAD (QA) DEL PROYECTO - DISEÑO
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Durante la elaboración del documento de proyecto, se han identificado claramente los asociados y su rol dentro del proceso, sosteniendo reuniones con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. El proyecto es financiado por la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo y el Gobierno Alemán, mediante Promesa Climática. Asimismo, se han tenido en cuenta las posibles fuentes de financiamiento, la estrategia de comunicación y la posible colaboración Sur-Sur. Finalmente, el proyecto fortalecerá la sostenibilidad para la preparación futura de Comunicaciones Nacionales, BTR y Estrategias a Largo Plazo, y facilitará los requisitos de reporte ante la CMNUCC. Se facilitará la participación de todos los actores interesados en la formulación de políticas y medidas de mitigación y adaptación para asegurar la apropiación y sostenibilidad del proyecto, e incorporará una campaña de comunicación para difundir y promover las Estrategias de Desarrollo con Bajas Emisiones (LTS-LEDS).
	3. PRINCIPIOS
	7. ¿El proyecto aplica un enfoque basado en los derechos humanos?
☒	• 3: El proyecto se guía por los derechos humanos e incorpora los principios de rendición de cuentas, participación significativa y no discriminación en la estrategia del proyecto. El proyecto respeta las leyes y normas internacionales y nacionales pertinentes. Se identificaron y evaluaron rigurosamente como pertinentes todos los posibles efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos, incorporando medidas adecuadas de mitigación y gestión en el diseño y el presupuesto del proyecto. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)
☐	• 2: El proyecto se guía por los derechos humanos al priorizar la rendición de cuentas, la participación significativa y la no discriminación. Se identificaron y evaluaron los posibles efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos como pertinentes, y se incorporaron medidas apropiadas de mitigación y gestión en el diseño y el presupuesto del proyecto. (Debe responder de forma positiva a ambas cláusulas.)
☐	• 1: No hay evidencia de que el proyecto esté guiado por los derechos humanos. Pruebas limitadas o nulas de que se consideraran los posibles efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El proyecto principios incluye rendición de cuentas, participación significativa y no discriminación en la estrategia del proyecto. No se han identificado efectos adversos para los derechos humanos
	8. ¿El proyecto utiliza el análisis de género en el diseño del proyecto?
☒	• 3: Se ha llevado a cabo un análisis participativo de género y los resultados de este análisis de género informan las secciones de desafío de desarrollo, estrategia y resultados esperados del documento del proyecto. Los productos e indicadores del marco de resultados incluyen referencias explícitas a la igualdad de género, e indicadores específicos miden y monitorean los resultados para garantizar que las mujeres se beneficien plenamente del proyecto. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)
☐	• 2: Se ha llevado a cabo un análisis básico de género y los resultados de este análisis están dispersos (es decir, fragmentados y no son consistentes) en las secciones de desafío y estrategia de desarrollo del documento del proyecto. El marco de resultados puede incluir algunos productos y/o actividades que tengan en cuenta las cuestiones de género, pero las desigualdades de género no se integran sistemáticamente en cada producto. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)
☐	• 1: El diseño del proyecto puede o no mencionar información y/o datos sobre el impacto diferencial de la situación de desarrollo del proyecto en las relaciones de género, mujeres y hombres, pero las desigualdades de género no se han identificado claramente y reflejado en el documento del proyecto.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Se ha hecho un especial énfasis en desarrollar la componente de género en el diseño del proyecto, incluyendo acciones y condiciones específicas para los productos, indicadores con enfoque de género y acciones encaminadas a la mayor participación de las mujeres.
	9. ¿El proyecto apoyó la resiliencia y sostenibilidad de las sociedades y/o ecosistemas?
☒	• 3: Existe evidencia creíble de que el proyecto aborda las dimensiones de sostenibilidad y resiliencia de los desafíos de desarrollo, que están integradas en la estrategia y el diseño del proyecto. El proyecto refleja las interconexiones entre las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible. Se han identificado y evaluado rigurosamente los choques, los peligros y los efectos sociales y ambientales adversos pertinentes, incorporando medidas adecuadas de gestión y mitigación en el diseño y el presupuesto del proyecto. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)

☐	**GARANTÍA DE LA CALIDAD (QA) DEL PROYECTO - DISEÑO**
☐	• 2: El diseño del proyecto integra las dimensiones de sostenibilidad y resiliencia de los desafíos del desarrollo. Se han identificado y evaluado los choques, los peligros y los efectos sociales y ambientales adversos pertinentes, y se han incorporado las medidas de gestión y mitigación pertinentes en el diseño y el presupuesto del proyecto. (Debe responder de forma positiva a ambas cláusulas.)
☐	• 1: Las dimensiones e impactos de sostenibilidad y resiliencia no se consideraron adecuadamente.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El proyecto no afecta de manera directa a la resiliencia y sostenibilidad de las sociedades y ecosistemas. Sin embargo, los productos considerados, cuando es pertinente, incluyen un enfoque sostenible y resiliente en el desarrollo del país.
	10. ¿Se ha llevado a cabo el Procedimiento de Evaluación Social y Ambiental (SESP) para identificar posibles impactos y riesgos sociales y ambientales? El SESP no es necesario para proyectos en los que el PNUD es únicamente Agente Administrativo y/o proyectos que consisten exclusivamente en la preparación y difusión de informes y materiales de comunicación; organización de eventos, talleres o capacitación; el fortalecimiento de la capacidad de los asociados para participar en negociaciones y conferencias internacionales; coordinación de asociaciones (incluida la coordinación de las Naciones Unidas) y gestión de redes; y proyectos mundiales/regionales sin actividades a nivel de país, así como proyectos de eficacia del desarrollo y proyectos de eficacia institucional. [Si no se requiere SESP, seleccione todos los criterios de exención que se apliquen.]
☐	• Sí
☐	• No (el QA del proyecto no puede ser aprobado)
☒	• SESP no es necesario porque el proyecto consiste únicamente en (Seleccione todos los criterios de exención que se aplican) *Aplicable solo a la opción "No se requiere SESP" ☒ 1: Preparación y difusión de informes, documentos y materiales de comunicación ☐ 2: Organización de un evento, taller, formación ☐ 3: Fortalecimiento de la capacidad de los asociados para participar en negociaciones y conferencias internacionales ☐ 4: Coordinación de asociaciones (incluida la coordinación de las Naciones Unidas) y gestión de redes ☐ 5: Proyectos mundiales/regionales sin actividades a nivel nacional (por ejemplo, actividades como la gestión de los conocimientos, los procesos intergubernamentales) ☐ 6: El PNUD actúa como Agente Administrativo ☐ 7: Proyectos de Efectividad en el Desarrollo y Proyectos de Efectividad Institucional
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El proyecto se centra en la preparación de informes y la información de base necesaria para estos.
	4. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
	11. ¿Tiene el proyecto un marco de resultados sólido?
☐	• 3: La selección de productos y actividades del proyecto se encuentra en un nivel apropiado. Los productos van acompañados de indicadores SMART, orientados a los resultados, que miden los principales cambios previstos en materia de desarrollo, cada uno con fuentes de datos fidedignas y líneas de base y metas pobladas, incluidos indicadores sensibles al género, centrados en los grupos objetivos y desglosados por sexo, cuando proceda. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)
☒	• 2: La selección de productos y actividades del proyecto se encuentra en un nivel apropiado. Los productos van acompañados de indicadores SMART orientados a los resultados, pero es posible que las líneas de base, las metas y las fuentes de datos aún no estén plenamente especificadas. Existe algún tipo de uso de indicadores centrados en los grupos objetivos y desglosados por sexo, según proceda. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)
☐	• 1: La selección de productos y actividades del proyecto no se encuentra en un nivel apropiado; los productos no van acompañados de indicadores SMART, orientados a los resultados, que midan el cambio esperado y no se han rellenado con líneas de base y metas; Las fuentes de datos no están especificadas y/o no tienen en cuenta el género, desglosando los indicadores por sexo. (Debe seleccionar esta valoración si alguna de las cláusulas es cierta.)

☐	GARANTÍA DE LA CALIDAD (QA) DEL PROYECTO - DISEÑO
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Los indicadores desarrollados (véase sección "Marco de Resultados") son SMART, por la naturaleza del proyecto van orientados a entregables estratégicos y a resultados a mediano y largo plazo (ver Teoría de Cambio). Asimismo, los productos y actividades son claras y están bien definidas.
	12. ¿Está claramente definido el mecanismo de gobernanza del proyecto en el documento del proyecto, incluida la composición de la junta del proyecto?
☒	• 3: El mecanismo de gobernanza del proyecto está completamente definido. Se han especificado individuos para cada posición en el mecanismo de gobierno (especialmente todos los miembros de la Junta del Proyecto). Los miembros de la Junta del Proyecto han acordado sus funciones y responsabilidades según lo especificado en el mandato. El mandato de la Junta del Proyecto se ha adjuntado al documento del proyecto. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)
☐	• 2: Se define el mecanismo de gobernanza del proyecto; Se observa que instituciones específicas desempeñan funciones clave de gobernanza, pero es posible que aún no se hayan especificado individuos. El documento del proyecto enumera las responsabilidades más importantes de la Junta del Proyecto, el director/gerente del proyecto y las funciones de garantía de calidad. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.)
☐	• 1: El mecanismo de gobernanza del proyecto está vagamente definido en el documento del proyecto, solo mencionando roles clave que deberán cubrirse en una fecha posterior. No se proporciona información sobre las responsabilidades de los puestos clave en el mecanismo de gobernanza.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El mecanismo de gobernanza del proyecto está completamente definido, incluyendo los expertos para cada posición y el mandato de la Junta del Proyecto se ha adjuntado al documento del proyecto.
	13. ¿Se han identificado los riesgos del proyecto utilizando las herramientas de evaluación de riesgos (garantía de calidad del proyecto, procedimiento de selección social y ambiental, herramienta de evaluación de la capacidad de los socios, enfoque armonizado para la transferencia de efectivo, diligencia debida del sector privado, etc., si procede), con planes claros para gestionar y mitigar cada riesgo?
☒	• 3: Los riesgos del proyecto relacionados con el logro de resultados se describen completamente en el registro de riesgos del proyecto, basado en un análisis exhaustivo basado en la teoría del cambio del programa, las normas sociales y ambientales y la selección, el análisis de la situación, las evaluaciones de la capacidad y otros análisis, como el potencial de financiación y el riesgo para la reputación. Los riesgos se han identificado mediante un proceso consultivo con los principales interesados internos y externos, incluida la consulta con la Oficina de Seguridad del PNUD según sea necesario. Plan claro y completo para gestionar y mitigar cada riesgo, incluidos los riesgos de seguridad, reflejados en los planes de presupuesto y supervisión del proyecto. (Debe responder de forma positiva a ambas cláusulas.)
☐	• 2: Los riesgos del proyecto relacionados con el logro de resultados se identifican en el registro inicial de riesgos del proyecto sobre la base de un nivel mínimo de análisis y consulta, con medidas de mitigación identificadas para cada riesgo.
☐	• 1: Algunos riesgos pueden identificarse en el registro inicial de riesgos del proyecto, pero no se han identificado pruebas de consulta o análisis ni medidas claras de mitigación de riesgos. Esta opción también se selecciona si los riesgos no están claramente identificados, no se incluye ningún registro de riesgos inicial con el documento del proyecto y/o no se ha llevado a cabo ningún proceso de gestión de riesgos de seguridad para el proyecto.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Se ha incluido un análisis detallado de riesgos, identificando posibles riesgos y las correspondientes medidas de mitigación
	5. EFICIENTE
	14. ¿Se han mencionado explícitamente medidas específicas para garantizar un uso costo-eficiente de los recursos como parte del diseño del proyecto? Esto puede incluir, por ejemplo: **i) Utilizar el análisis de la teoría del cambio para explorar diferentes opciones para lograr los máximos resultados con los recursos disponibles.** **ii) Utilizar un enfoque de gestión de cartera para mejorar la rentabilidad a través de sinergias con otras intervenciones.** **iii) A través de operaciones conjuntas (por ejemplo, monitoreo o adquisición) con otros socios.** **iv) Compartir recursos o coordinar la entrega con otros proyectos.**

☐	GARANTÍA DE LA CALIDAD (QA) DEL PROYECTO - DISEÑO
	v) Utilizar enfoques y tecnologías innovadoras para reducir el costo de la prestación de servicios u otros tipos de intervenciones.
☒	• Sí
☐	• No
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Se utiliza un un enfoque de gestión de cartera para mejorar la rentabilidad a través de sinergias con otras intervenciones.
	15. ¿Está justificado el presupuesto y respaldado con estimaciones válidas?
☒	• 3: El presupuesto del proyecto está en el nivel de actividad con fuentes de financiación, y se especifica para la duración del período del proyecto en un presupuesto plurianual. Existen planes realistas de movilización de recursos para cubrir los componentes no financiados. Los costos se respaldan con estimaciones válidas utilizando puntos de referencia de proyectos o actividades similares. Las consecuencias financieras derivadas de la inflación y la exposición cambiaria se han estimado e incorporado en el presupuesto. Se han incorporado costos adecuados de supervisión, evaluación, comunicaciones y seguridad.
☐	• 2: El presupuesto del proyecto está en el nivel de actividad con fuentes de financiamiento, cuando es posible, y se especifica para la duración del proyecto en un presupuesto plurianual, pero no existe un plan de financiamiento. Los costos se respaldan con estimaciones válidas basadas en las tarifas vigentes.
☐	• 1: El presupuesto del proyecto no se especifica a nivel de actividad y/o puede no estar incluido en un presupuesto plurianual.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El presupuesto del proyecto está en el nivel de actividad con fuentes de financiación y con presupuesto semestral. Los recursos ya están movilizados y los costos se basan en experiencias de proyectos o actividades similares. Asimismo, se han incorporado costos adecuados de supervisión, evaluación, comunicaciones y seguridad.
	16. ¿La Oficina de País / Proyecto Regional / Global está recuperando completamente los costos involucrados con la implementación del proyecto?
☒	• 3: El presupuesto cubre íntegramente todos los gastos del proyecto atribuibles al proyecto, incluidos los servicios de gestión de programas y eficacia del desarrollo relacionados con la planificación estratégica de los programas por países, la garantía de calidad, la elaboración de proyectos de desarrollo, los servicios de promoción de políticas, las finanzas, las adquisiciones, los recursos humanos, la administración, la emisión de contratos, la seguridad, los viajes, los activos, los servicios generales, la información y las comunicaciones, sobre la base de los costos completos de conformidad con las políticas vigentes del PNUD (es decir, UPL, LPL.)
☐	• 2: El presupuesto cubre los costos significativos del proyecto que son atribuibles al proyecto sobre la base de las políticas prevalecientes del PNUD (es decir, UPL, LPL) según corresponda.
☐	• 1: El presupuesto no cubre adecuadamente los costos del proyecto que son atribuibles al proyecto, y el PNUD está subvencionando el proyecto.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Sí, dentro del presupuesto se incluyen los costos de PNUD.
	6. EFICAZ
	17. ¿Los grupos objetivos, y en particular los marginados, vulnerables y dejados más atrás (LNOB), han participado en el diseño del proyecto?[15]
☐	• 3: Evidencia creíble de que todos los grupos objetivos, priorizando a las poblaciones discriminadas, vulnerables y marginadas que participarán o se verán afectadas por el proyecto, han participado activamente en el diseño del proyecto. El proyecto tiene una estrategia explícita para identificar, involucrar y garantizar la participación significativa de los grupos objetivos como partes interesadas a lo largo del proyecto, incluso a través del monitoreo y la toma de decisiones (por ejemplo, representación en la Junta del Proyecto, inclusión en muestras para evaluaciones, etc.).
☐	• 2: Alguna evidencia de que los grupos objetivos clave han sido consultados en el diseño del proyecto.

[15] Puesta en práctica de la nota de buenas prácticas para el equipo de las Naciones Unidas en el país (https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams)

☐	GARANTÍA DE LA CALIDAD (QA) DEL PROYECTO - DISEÑO
☐	• 1: No hay evidencia de compromiso con los grupos objetivos durante el diseño del proyecto.
☒	• No aplicable.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El proyecto tiene una estrategia explícita para identificar, involucrar y garantizar la participación significativa de los grupos objetivos como partes interesadas a lo largo del proyecto. Asimismo, el proyecto obedece al apoyo al Gobierno de Honduras en el cumplimiento de acuerdos internacionales y reporte
	18. ¿Se plantea el proyecto la adaptación y la corrección del curso si las actividades regulares de monitoreo, evaluación y lecciones aprendidas demuestran que existen mejores enfoques para lograr los resultados previstos y/o las circunstancias cambian durante la implementación?
☒	• Sí
☐	• No
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y cargue un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Se ha desarrollado un sistema de monitoreo semestral con el objetivo de identificar barreras y lecciones aprendidas para mejorar y modificar, si fuera preciso, las actividades del proyecto.
	19. El marcador de género para todos los productos del proyecto se califican en GEN2 o GEN3, lo que indica que el género se ha incorporado plenamente en todos los productos del proyecto como mínimo.
☐	• Sí
☒	• No
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y cargue un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Los productos incluyen un componente de género que aboga por la mejora de las condiciones e información sobre las mujeres.
	20. ¿Se han tenido en cuenta los riesgos y oportunidades digitales de la sociedad al diseñar el enfoque del proyecto y se han considerado soluciones digitales o de tecnología de datos para mejorar la eficiencia, la eficacia y la escalabilidad de los resultados del proyecto?[16]
☐	• 3: En la medida de lo posible, se han investigado los riesgos y oportunidades digitales de la sociedad al diseñar la estrategia y la Teoría del Cambio, y se ha considerado el posible uso de tecnologías digitales o de datos en las actividades del proyecto de acuerdo con los estándares digitales y los principios de datos del PNUD. (Debe responder de forma positiva a todas las cláusulas.) [17][18]
☐	• 2: Solo se ha considerado el uso potencial de soluciones digitales o de datos en las actividades del proyecto de acuerdo con los estándares digitales y los principios de datos del PNUD, pero no hay evidencia o hay evidencia limitada de que se hayan considerado aspectos de sociedades digitales inclusivas en el diseño de la estrategia o la Teoría del Cambio.[19][20]
☐	• 1: Ni los riesgos y oportunidades digitales de la sociedad, ni las soluciones digitales o de tecnología de datos se consideraron específicamente en el diseño del proyecto o los estándares digitales y los

[16] Para obtener una lista de verificación y una plantilla de evidencia, consulte las Directrices para incorporar el pensamiento digital en el diseño de proyectos (https://rebrand.ly/DbDProjectGuideEN).

[17] Los diez Estándares Digitales del PNUD son: a) Comenzar con la necesidad; b) Cerrar la brecha digital; c) Prueba temprana y frecuente; d) (Quizás) No lo construyas; e) No hacer daño; f) formar el equipo adecuado; g) Medir lo que importa; h) Seguir El Principios de datos del PNUD; i) de forma predeterminada para abrir; y j) Plan a Largo Plazo (https://www.undp.org/digital/standards).

[18] Los ocho Principios Digitales del PNUD son: a) Salvaguardar los datos personales; b) Mantener los más altos estándares éticos; c) Gestionar los datos de forma responsable; d) Hacer que los datos sean abiertos por defecto; e) Planificar la reutilización y la interoperabilidad; f) Empoderar a las personas para que trabajen con datos; g) Ampliar las fronteras de los datos; y h) Tener en cuenta las limitaciones de los datos (https://data.undp.org/data-principles).

[19] Los diez Estándares Digitales del PNUD son: a) Comenzar con la necesidad; b) Cerrar la brecha digital; c) Prueba temprana y frecuente; d) (Quizás) No lo construyas; e) No hacer daño; f) formar el equipo adecuado; g) Medir lo que importa; h) Seguir El Principios de datos del PNUD; i) de forma predeterminada para abrir; y j) Plan a Largo Plazo (https://www.undp.org/digital/standards).

[20] Los ocho Principios Digitales del PNUD son: a) Salvaguardar los datos personales; b) Mantener los más altos estándares éticos; c) Gestionar los datos de forma responsable; d) Hacer que los datos sean abiertos por defecto; e) Planificar la reutilización y la interoperabilidad; f) Empoderar a las personas para que trabajen con datos; g) Ampliar las fronteras de los datos; y h) Tener en cuenta las limitaciones de los datos (https://data.undp.org/data-principles).

☐	GARANTÍA DE LA CALIDAD (QA) DEL PROYECTO - DISEÑO
	principios de datos del PNUD no se tienen en cuenta al intentar utilizar soluciones digitales o de tecnología de datos en las actividades del proyecto. [2122]
☒	• Las consideraciones digitales no son relevantes para este proyecto. *Aplicable solo a la opción "Las consideraciones digitales no son relevantes" ☐ 1: La transformación digital de la sociedad no es una prioridad gubernamental o contextual ☐ 2: Un enfoque no digital produce una mayor eficacia y eficiencia ☒ 3: Otros (especifique en la sección "Evidencia")
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El proyecto utiliza las tecnologías existentes y no se ve afectado por los riesgos y oportunidades digitales de la sociedad al tener un enfoque de desarrollo de informes.
	7. SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN NACIONAL
	21. ¿Los socios nacionales / regionales / globales han liderado o participado proactivamente en el diseño del proyecto nacional / regional / global, respectivamente?
☒	• 3: Los socios nacionales / regionales / globales tienen plena propiedad del proyecto nacional / regional / global y dirigieron el proceso de desarrollo del proyecto juntamente con el PNUD.
☐	• 2: El proyecto ha sido desarrollado por el PNUD en estrecha consulta con socios nacionales / regionales / mundiales.
☐	• 1: El proyecto ha sido desarrollado por el PNUD con un compromiso limitado o nulo con los asociados nacionales.
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Se ha contado con la participación en el diseño y toma de decisiones de los socios locales, en particular DNCC y SEN.
	22. ¿Se han identificado instituciones y sistemas clave, y existe una estrategia para fortalecer las capacidades específicas / integrales basadas en las evaluaciones de capacidad realizadas?
☐	• 3: El proyecto tiene una estrategia para fortalecer las capacidades específicas de las instituciones y/o actores nacionales basada en una evaluación de capacidad completada. Esta estrategia incluye un enfoque para supervisar periódicamente las capacidades nacionales utilizando indicadores claros y métodos rigurosos de reunión de datos, y ajustar la estrategia para fortalecer las capacidades nacionales en consecuencia.
☐	• 2: Se ha completado una evaluación de la capacidad. Hay planes para desarrollar una estrategia para fortalecer las capacidades específicas de las instituciones y/o actores nacionales sobre la base de los resultados de la evaluación de la capacidad.
☐	• 1: No se han llevado a cabo evaluaciones de capacidad.
☒	• No aplicable
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El proyecto no busca el fortalecimiento de capacidades sino el desarrollo de los documentos necesarios para el reporte internacional y la creación de oportunidades para mejorar la ambición climática de Honduras. Sin embargo, se incluye el desarrollo, que no implementación, de un plan de capacitación para la DNCC y los principales socios, así como la capacitación en el uso de la herramienta digital de la huella de carbono. En el marco de estas actividades se llevará a cabo una evaluación de las capacidades de las instituciones y actores clave.
	23. ¿Existe una estrategia clara incorporada en el proyecto que especifique cómo el proyecto utilizará los sistemas nacionales (es decir, adquisiciones, monitoreo, evaluaciones, etc.) en la medida de lo posible?
☐	• Sí

[21] Los diez Estándares Digitales del PNUD son: a) Comenzar con la necesidad; b) Cerrar la brecha digital; c) Prueba temprana y frecuente; d) (Quizás) No lo construyas; e) No hacer daño; f) formar el equipo adecuado; g) Medir lo que importa; h) Seguir El Principios de datos del PNUD; i) de forma predeterminada para abrir; y j) Plan a Largo Plazo (https://www.undp.org/digital/standards).

[22] Los ocho Principios Digitales del PNUD son: a) Salvaguardar los datos personales; b) Mantener los más altos estándares éticos; c) Gestionar los datos de forma responsable; d) Hacer que los datos sean abiertos por defecto; e) Planificar la reutilización y la interoperabilidad; f) Empoderar a las personas para que trabajen con datos; g) Ampliar las fronteras de los datos; y h) Tener en cuenta las limitaciones de los datos (https://data.undp.org/data-principles).

☐	GARANTÍA DE LA CALIDAD (QA) DEL PROYECTO - DISEÑO
☐	• No
☒	• No aplicable
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): Los procesos de adquisición, así como el monitoreo y evaluación, los lleva a cabo PNUD por ser un proyecto de implementación directa.
	24. ¿Existe un acuerdo claro de transición / plan de cierre gradual desarrollado con las principales partes interesadas para mantener o ampliar los resultados (incluida la movilización de recursos y la estrategia de comunicaciones)?
☒	• Sí
☐	• No
	Evidencia (Ingrese una breve explicación y adjunte un documento que proporcione evidencia para su respuesta): El proyecto prevé la transición de los productos que estará generando para continuidad y escalamiento a través de la propuesta de proyecto para la preparación de la cuarta comunicación nacional y los informes bienales de transparencia.

I

Nombre y título	*Firma y fecha*	*Descripción*
Asesor de QA: <Nombre> <Título>	Firma: Fecha:	El asesor de la garantía de calidad debe ser responsable de la garantía del proyecto, que es independiente del gerente del proyecto. Un oficial de programas o supervisión y evaluación del PNUD suele desempeñar la función de garantía de proyectos en nombre del PNUD. En el caso de los proyectos financiados por el FMAM y el FVC, la garantía de los proyectos se lleva a cabo de conformidad con las necesidades de los fondos verticales, y estos servicios están cubiertos por la tasa proporcionada por el fondo vertical.
Aprobador de QA: <Nombre> <Título>	Firma: Fecha:	El aprobador de la garantía de calidad suele ser el Representante Residente, el Representante Residente Adjunto o el jefe de cartera. El aprobador de control de calidad debe funcionar con un nivel más alto de responsabilidad que el asesor de control de calidad. El aprobador de control de calidad no puede ser también el asesor de control de calidad.

Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental

De acuerdo con los requisitos de diseño de proyectos, "aquellos proyectos que únicamente comprenden informes, coordinación de eventos, capacitaciones, talleres, reuniones, conferencias, preparación de material de comunicación, fortalecimiento de las capacidades de los asociados para participar en negociaciones y conferencias internacionales, coordinación de alianzas y gestión de redes, o proyectos globales/regionales sin actividades a nivel de país" no requieren de un Diagnóstico Social y Ambiental. Dado que este proyecto se basa en el desarrollo de informes y fortalecimiento de capacidades queda exento del Diagnóstico Social y Ambiental.

Análisis de Riesgo

Título del proyecto: Apoyo a la implementación de los procesos de NDC de Honduras	**Número del proyecto: 00130309**	**Fecha:** 21-Jul-23

#	Evento	Causa	Impactos	Categoría y subcategoría de riesgo	Impacto, probabilidad y nivel de riesgo	Riesgo válido desde/a	Responsable del riesgo	Tratamiento del riesgo y responsable
1	Hay un riesgo de futuras potenciales emergencias nacionales	Como resultado de eventos climáticos extremos o pandemias.	Cuyo impacto causa interrupciones en los procesos de capacitación, grupos de trabajo y actividades.	8.6 Seguridad (riesgos naturales)	Probabilidad: 1 Impacto: 3 Nivel de riesgo: Bajo	Desde: Comienzo del proyecto. Hasta: Fin del proyecto.	PNUD	**Tratamiento del riesgo:** Uso de herramientas virtuales para mantener una estrecha comunicación con los actores y continuar con el proceso. **Responsable del tratamiento:** PNUD, consultores y consultorías.
2	Hay un riesgo de cambio en las prioridades del gobierno	Como resultado de los cambios políticos	Cuyo impacto debilita el compromiso y respuesta a las obligaciones definidas bajo la UNFCCC y el Acuerdo de París debido a otras preocupaciones apremiantes.	7.5 Estratégico (Compromiso del Gobierno)	Probabilidad: 3 Impacto: 2 Nivel de riesgo: Bajo	Desde: Comienzo del proyecto. Hasta: Fin del proyecto.	SERNA	**Tratamiento del riesgo:** Se deberá trabajar para difundir información sobre la máxima importancia del cambio climático y los compromisos de reporte bajo la UNFCCC para garantizar que esos temas sean considerados de alta prioridad en la agenda política. **Responsable del tratamiento:** SERNA, SEN, SRECI, y el PNUD
3	Hay un riesgo de retrasos en los desembolsos y procesos de adquisiciones	Como resultado de la aprobación de donantes. Falta de interés o participación de proveedores, y/o de capacidades para brindar los servicios.	Cuyo impacto genera retrasos en el inicio o desarrollo de las consultorías/servicios que repercuten en los productos finales.	2.5 Financiero (entrega)	Probabilidad: 1 Impacto: 3 Nivel de riesgo: Bajo	Desde: Comienzo del proyecto. Hasta: Fin del proyecto.	PNUD	**Tratamiento del riesgo:** Realizar constantemente el monitoreo y seguimiento técnico y administrativo, a través de reuniones periódicas de equipo sobre los siguientes hitos del proyecto y sus implicaciones administrativas. **Responsable del tratamiento:** PNUD, SERNA, SEN.
4	Hay un riesgo de cambios de los funcionarios gubernamentales de instituciones públicas involucradas en el proceso.	Como resultado de cambios de gobierno, falta de resiliencia de los trabajadores, búsqueda de mejores oportunidades.	Cuyo impacto es la pérdida de conocimiento y retrasos y ralentización en las actividades de coordinación y entrega de productos	4.7 Organizacional (recursos humanos)	Probabilidad: 3 Impacto: 3 Nivel de riesgo: Moderado	Desde: Comienzo del proyecto. Hasta: Fin del proyecto.	SERNA	**Tratamiento del riesgo:** Mantener una estrecha comunicación y participación en procesos conjuntos con los delegados de instituciones públicas y diálogos con diferentes niveles de la administración pública (técnicos o tomadores de decisiones) para asegurar que no haya brechas en los recursos humanos clave. **Responsable del tratamiento:** PNUD, SERNA, instituciones beneficiarias.
5	Hay un riesgo de que las instituciones	Como resultado de una capacidad técnica y humana	Cuyo impacto es una menor calidad de los productos finales por	3.8 Operacional (capacidad de	Probabilidad: 3 Impacto: 3	Desde: Comienzo del proyecto.	PNUD	**Tratamiento del riesgo:** Proporcionar asistencia técnica, fortalecimiento de las capacidades y conocimiento en la recopilación y procesamiento de datos, diseño de medidas

#	Evento	Causa	Impactos	Categoría y subcategoría de riesgo	Impacto, probabilidad y nivel de riesgo	Riesgo válido desde/a	Responsable del riesgo	Tratamiento del riesgo y responsable
	gubernamentales, empresas públicas y privadas tengan dificultades para recopilar, proporcionar y procesar los datos necesarios.	insuficiente para realizar esta tarea.	falta de completitud y exactitud que afecta de manera indirecta a la toma de decisiones.	los actores clave)	Nivel de riesgo: Moderado	Hasta: Fin del proyecto.		y papel en el sistema a las instituciones y expertos involucrados. **Responsable del tratamiento:** PNUD, SERNA; SEN, consultores y consultorías.
6	Hay un riesgo de excluir a las poblaciones interesadas potencialmente afectadas, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco del proyecto	Como resultado de una falta de identificación de dichos grupos y de contacto efectivo con ellos.	Cuyo impacto es una visión sesgada de los desafíos y falta de compromiso de algunos actores	1.9 Social y medioambiental (pueblos indígenas)	Probabilidad: 2 Impacto: 2 Nivel de riesgo: Bajo	Desde: Comienzo del proyecto. Hasta: Fin del proyecto.	SERNA	**Tratamiento del riesgo:** Garantizar el mapeo de los actores que deben ser consultados en el informe y no dejar a nadie atrás, así como hacer visibles los resultados, así como disponer de un sistema de monitoreo que asegure que se considera la parte social del proyecto. **Responsable del tratamiento:** PNUD, SERNA.

Evaluación de Capacidades

Las evaluaciones de capacidades del Asociado en la Implementación (incluida la Micro Evaluación del Método Armonizado de Transferencias en Efectivo - HACT) no aplica por ser de implementación directa, se realizará en la fase de arranque del proyecto.

Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales

https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gerardo_cerrato_undp_org/EUj0pN04k-VEkr9WC9D98RoBBOXsu30zVdB3XwgxuJSE0Q?e=30goCR
