PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

Au service des peuples et des nations

DOCUMENT DE PROJET
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Intitulé du projet: Programme National de Volontariat pour le Développement Durable en Mauritanie
Numéro du projet:
Partenaire de réalisation : Ministère de l'Emploi de la Jeunesse et des Sports
Date de démarrage: 1er Octobre 2020; Date d'achèvement: 1er Octobre 2024; Date de réunion du CLEP: 26 Juin 2020.

Description succincte

Le présent projet vise l'accompagnement à la mise en place d'un Programme National de promotion de la responsabilisation de la jeunesse à travers l'engagement volontaire et l'institutionnalisation d'un corps national de volontaires pour le Développement Durable. De façon spécifique le projet vise à :**(i) Créer un environnement juridique favorable à l'engagement de jeunes volontaires sur des chantiers de développement à travers le pays (ii) Opérationnaliser un dispositif national inclusif pérenne et opérationnel de gestion des volontairesmobilisés pour le volontariat et le bénévolat ; (iii) Mobiliser et déployer plus de 10,600 jeunes (dont 50% de filles) dans le cadre d'activités de développement communautaire** notamment dans les secteurs d'éducation/formation, de la santé communautaire et de proximité, de l'assistance juridique et de la cohésion sociale, de la préservation de l'environnement, de la protection civile, du développement durable.

Cette initiative se justifie particulièrement dans le contexte de mobilisation urgente de tous les acteurs y compris les jeunes, dans le cadre de l'accompagnement du plan national de riposte contre les crises sanitaires (notamment la COVID 19) et environnementales (notamment les inondations).

Effet contribuant :

Produit(s) indicatif(s) avec marqueur genre :

Output 2.6: Les jeunes (filles et garçons) au niveau national, et des zones frontalières disposent de connaissances améliorées sur le Civisme, les dangers de la radicalisation et du terrorisme

CPD : Axe d'intervention n° 1 : Renforcer la gouvernance dans toutes ces dimensions.

Effet connexe du Plan Stratégique :

Effet 2: Les attentes des populations en terme de participation systèmes de gouvernance plus résilients.

Total des ressources nécessaires :	**USD 1,933,000**	
Total des ressources allouées :		
	TRAC du PNUD :	USD 250.000
	Donateur : **UNV** **OMS**	USD 100.000 USD 150.000
	Gouvernement :	USD 260.000
	Apports en nature :	Locaux
À Mobiliser :	1, 407,000 USD	

Approuvé par (signatures) :

Gouvernement	PNUD
Taleb Ould Sidi Ahmed, Ministre de la jeunesse, de l'emploi et des sports	**Anthony NGORORANO**, Représentant Résident
Date : 20 AUG 2020	Date : 17 AUG 2020

Table des matières

I. Problématique de développement 3
II. STRATEGIE 5
III. Alignement du Projet 6
IV. Résultats et partenariats 8
1. Résultats escomptés 8
2. Rressources requises pour atteindre les résultats escomptés 9
3. Partenariats 9
V. Bénéficiaires 9
VI. Risques et hypothèses 10
VII. Durabilité et amplification 10
1. La garantie du financement 11
2. Disponibilité des candidats au volontariat 11
3. Prise en charge des Volontaires 11
4. Accompagnement des volontaires en mission 11
VIII. Gestion du projet 12
1. Arrangement financier 12
2. Modalité d'exécution 12
IX. CADRE DES RESULTATS 14
X. Suivi et évaluation 16
1. Plan de suivi 16
2. Plan d'évaluation 17
XI. Plan de travail pluriannuel 18
XII. Modalités de gouvernance et de gestion 21
1.1. Le comité de pilotage 21
2. Structure de Governance du Projet 22
XIII. Gestion des risques 22
XIV. ANNEXES 27

I. PROBLÉMATIQUE DE DÉVELOPPEMENT

- Analyse de la situation

La Mauritanie est un Pays essentiellement désertique qui dispose de grandes étendues pastorales et de seulement 0,5 % de terres arables. Avec environ 4 millions d'habitants (2018) selon l'Office National de la Statistique et une densité de 3,9 personnes au kilomètre carré, c'est le quatrième pays le moins densément peuplé d'Afrique. En 2020, la population urbaine estplus importante que celle rurale avec 52,8 % de citadins, contre 48,3 % en 2013. Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH de 2013), la population mauritanienne est de 3.537.368 habitants avec une dominante féminine et jeune. 41% de cette population est âgée de moins de 15 ans et plus de 60 % a moins de 30 ans. En outre, le taux de chômage des jeunes est de 15,2 %, pour les jeunes de 15 à 24 ans et de 14,3 % pour les jeunes de 15 à 35 ans, tandis qu'un pourcentage de 38 % représente les jeunes qui ne sont ni employés, ni inscrits dans le système éducatif national.

En 2018, la croissance économique a poursuivi sa reprise progressive. Elle est passée de 3,1 % en 2017 à 3,6 % en 2018. Cette progression a été tirée par l'activité robuste des télécommunications, des transports, de l'électricité et du secteur primaire. En revanche, le secteur extractif continue de freiner la croissance, et d'impacter négativement sur les termes d'échange. Par ailleurs, la croissance démographique dynamique (environ 2,8 %) augmente plus vite que la reprise économique qui, de fait, demeure insuffisante et ne se traduit que par une hausse de 0,6 % du PIB réel par habitant. Cette situation compromet les progrès accomplis en matière de réduction de la pauvreté entre 2008 et 2014. Cependant les perspectives économiques à moyen terme sont favorables et le taux de croissance devrait augmenter pour atteindre une moyenne de 6,2 % sur la période 2019-2021.

- Situation sociale

La jeunesse Mauritanienne est confrontée à un certain nombre des défis due à la pauvreté, au chômage, au manque d'espace d'échange, et aux défis de la radicalisation. En effet, La société mauritanienne traverse une importante "transition" sociologique; ce qui conduit à une remise en question des normes traditionnelles par rapport aux nouvelles exigences de gouvernance publique, consécutive à des demandes publiques d'une population toujours plus jeune. L'État est donc sollicité à agir pour engager les jeunes dans le processus démocratique tout en essayant de trouver des solutions adéquates pour accompagner de façon constructive les changements sociaux.Dans ce contexte, une enquête récente sur la participation de la jeunesse à la vie publique a conclu d'un sentiment d'exclusion de la jeunesse. Partant, la Politique Générale du Gouvernement met l'accent sur la volonté de mettre entions permettant à la jeunesse d'accomplir son devoir civique, à travers une participation effective au développement socio-économique du pays.

En outre, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures institutionnelles et opérationnelles stratégiques pour relever les défis de la jeunesse, à savoir : (i) la mise en place d'un system de dialogue entre les jeunes et le Président de la République; (ii) la création d'un Ministère de la Jeunesse et des Sports (aujourd'hui Ministère de l'Emploi de la Jeunesse et des Sports) bénéficiant directement de l'appui des pouvoirs publics; (iii) la création d'un Haut Conseil national de la Jeunesse; (iv) l'élaboration d'une Stratégie Nationale pour la Jeunesse, les Sports et les loisirs (SNJSL,2015-2020) dont la révision est en cours

La Mauritanie a connu une période de croissance soutenue entre 2008 et 2014, qui s'est accompagnée de progrès significatifs sur le plan du bien-être des ménages. La croissance réelle des dépenses des ménages s'élevait en moyenne à 1,52 % par habitant et par an. Toutes les catégories de revenu en ont bénéficié et le pays a enregistré une nette réduction du taux de pauvreté, qui a reculé de 44,5 à 33 % sur cette période. En revanche, les termes d'échange défavorables, combinée avec des problèmes persistants de production dans les industries extractives, ont aggravé le déficit du compte courant, qui est passé de 13,9 % du PIB en 2018 à 18,7 % du PIB en 2019. L'amélioration des niveaux de vie a été plus marquée pour les populations vivant dans la pauvreté et l'extrême pauvreté que pour le reste de la population. Les inégalités ont par conséquent diminué : le coefficient de Gini, qui mesure les disparités de revenu dans une population donnée, a baissé de 35,3 à 31,9 entre 2008 et 2014. Ces avancées s'expliquent par la hausse de la production, de la productivité et des revenus enregistrée dans les zones rurales à la suite de la restructuration du secteur de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que par d'autres facteurs tels que les migrations internes et l'évolution des prix relatifs.

En dépit de l'instabilité sociopolitique qui a caractérisé les pays de la région dans les dernières décennies et malgré la menace terroriste et le conflit d'insécurité au Mali, son voisin, la Mauritanie a connu des avancées considérables dans l'apprentissage de la démocratie qui s'illustre notamment par la mise en place d'institutions démocratiques, la garantie des libertés publiques et individuelles, l'organisation d'élections apaisées et l'alternance démocratique. Aussi, des programmes de développement socio-économique ; tel « TEAZOUR » (compassion) ont été conçus et mis en œuvre pour la prise en charge de groupes socialement vulnérables, issus de milieux sociaux historiquement défavorisés et pour faire face à l'afflux des réfugiés maliens fuyant les conflits et autres flux migratoires avec leurs lots de tensions intercommunautaires.

Perspectives de développement :« La Mauritanie sera ce qu'en fera sa jeunesse », dixit le premier Président de la Mauritanie, Maître Moktar OULD DADDAH (1960-1978).

Depuis 2016 le pays a adopté et mis en œuvre une nouvelle stratégie de développement, la Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) en vue d'apporter des réponses aux nouveaux défis et de prendre la trajectoire d'une émergence économique et sociale soutenue. S'agissant de la jeunesse, plus de deux leviers stratégiques de la SCAPP adressent des solutions pérennes visant l'autonomisation individuelle et collective de cette importante frange de la population. Ainsi le Levier« Développer le capital humain et l'accès aux services sociaux de base », et plus particulièrement son chantier stratégique de « l'emploi pour tous et de la promotion de la jeunesse et des sports »; ainsi que le levier 3 « Renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions ».

Dans ce contexte, la mise en place d'un Programme National de Volontariat en Mauritanie consacre la volonté du gouvernement par le biais du Ministère de l'Emploi, de la Jeunesseet des sports,à apporter la meilleure réponse à la promotion de la participation et de la valorisation de la jeunesse mauritanienne. Ainsi, le programme vise à promouvoir la participation de la jeunesse aux efforts de développement socio-économique du pays, en vue d'en faire des acteurs dynamiques et engagés dans la sphère publique. Cette politique visant en outre à renforcer l'esprit d'unité nationale, de respect des valeurs culturelles du pays et à promouvoir la tolérance et l'apprentissage de nouvelles compétences de vie.

II. STRATEGIE

Le Programme s'inscrit dans la continuité des engagements du Gouvernement dans la promotion de l'engagement civique de la jeunesse dans la réalisation des Objectifs de Développement Durables (ODD). Dans ce cadre, il vise à renforcer la participation active de la jeunesse en appui aux collectivités locales et aux plans d'actions du gouvernement dans différents secteurs. Le projet sous-tend le principe d'engagement bénévole comme une dimension civique permettant de matérialiser la contribution individuelle à l'œuvre du développement national. L'objectif étant le développement d'un outil national servant l'autonomisation socioéconomique de la jeunesse en vue de l'épanouissement de son potentiel civique, et le renforcement de son leadership sur les questions publiques. Ainsi le présent programme vise une ambition plus large et s'inscrit dans la perspective de la politique nationale de la jeunesse qui sous-entend à terme le développement d'une jeunesse responsable, engagée et en charge de son propre développement comme acteur citoyen.

Le programme s'articule sur la théorie de changement selon laquelle, si la jeunesse nationale a accès à des cadres inclusifs d'encadrement favorables à son épanouissement, et si elle bénéficie de mécanismes inclusifs d'accompagnement pour construire leur potentiel, alors cette jeunesse sera un vecteur de développement pour le pays, favorisant le renforcement de la cohésion sociale à travers la généralisation d'une offre de services sociaux de proximité

A cet effet, le Programme répond directement à la priorité nationale d'instituer un service civil volontaire dénommé "Watanouna",avec lequel, le projet pourra alignerson plaidoyer. A travers la promotion d'un esprit de bénévolat et de mise à disposition du « temps de soi », le projet offrira aux jeunes (mais aussi aux moins jeunes) des opportunités de participation active aux interventions de développement au niveau communautaire et national.Spécifiquement, cela se traduira par la création des conditions propices pour consacrer de façon libre une partie du tempsdes jeunes à différentes formes d'expressions de la solidarité nationale dans le cadre d'actions de développement local, d'éducation et d'appui conseil à d'autres et à leurs communautés.

Dans ce cadre, la Mauritanie avait déjà initié un premier programme de volontariat sur la période 2014-2017. Par conséquent, le présent projet bâtira sur les acquis et les leçons apprises de ce premier programme de volontariat tout en veillant à étendre le dispositif initial. Ainsi le présent projet prendra en considération les principales leçons tirées de la mise en œuvre du programme précédent pour articuler une stratégie adaptée de mobilisation sociale favorisant la promotion de l'esprit de volontariat et des principes du bénévolat, tout en mettant en exergue la contribution individuelle aux réalisations de développement durable.

La stratégie du programme se fonde sur la promotion du principe de volontariat et de bénévolat, et dans ce cadre le Programmemobilisera en priorité des jeunes bénévoles qui acceptent de participer aux initiatives d'intérêt publicnational, régional ou communautaire lorsque le besoin se manifestera. Il déploiera des volontaires nationaux pour appuyer la mise en œuvre d'actions sectorielles de développement.

Le bénévolat :

L'intervention des bénévoles s'inscrira dans le cadre de missions ponctuelles sur de très courtes durées. Le bénévolat étant définit comme l'engagement libre et gratuit,peu formalisé,de personnes qui agissent, pour d'autres ou pour l'intérêt collectif.

Le volontariat :

Les volontaires nationaux, interviendront à travers des missions de plus ou moins longue durée pour appuyer la mise en œuvre d'actions jugées à forte contribution au développement du pays et apportant une plus-value à leurs compétences.A la différence du bénévolat, le volontariat implique un engagement formalisé en plein temps pour une durée définie pour une mission précise. Une indemnité forfaitaire sera allouée au volontaire en vue de contribuer à ses frais.

Le programme initiera dans le cadre d'une consultation élargie un cadre de réflexion pour circonscrire le périmètre des interventions et élaborera un référentiel national inclusif intégrant une dimension genre effective, mais également prenant en compte l'ensemble des jeunes ou personnes désireuses de contribuer au développement du pays. Spécifiquement, le programme favorisera l'accès universels de tous, avec ou sans diplômes, les personnes vivant avec un handicap, jeunes ruraux et urbains. Dans ce cadreles missions s'appuieront sur une base de données de référence pour le déploiement des volontaires du projet

Prioritairement le Programme optera pour les interventions des volontaires nationaux dans les domaines pertinents de réalisation des ODD et du plan de développement nationale. Il s'agira en l'occurrence des domaines liés àla promotion de la santé communautaire, la protection de l'environnement; la promotion de l'"Éducation, l'agriculture; la Protection sociale ; le Développement communautaire ; la Promotion de la justice ; la protection civile; la Cohésion sociale et tout autre domaine sollicité par un département sectoriel.

Le programme s'attèlera à définir pour chacune des formes d'engagement un cadre d'intervention et des conditions d'exercice.Il fonctionnera sur la base d'une planification des besoins en appui des volontaires nationaux au niveau des différents secteurs de développement du pays et des structures œuvrant pour l'épanouissement et le développement des diverses communautés du pays. La stratégie de mise en œuvre sera probablement influencée par la crise sanitaire du COVID 19. Cependant une évaluation de son impact devrait être envisagée pour prendre des mesures de mitigation pour réduire ses effets sur la mise en œuvre des activités du Projet.

III. ALIGNEMENT DU PROJET

- **Sur la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP)**

Depuis le 2016, la République Islamique de Mauritanie s'est dotée d'une stratégie nationale de développement, la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée, (SCAPP), un cadre de référence dans lequel, devront s'inscrire toutes les interventions majeures du Gouvernement au profit des populations pour la période 2016–2030. La mise en place du Programme de volontariat national s'inscrit dans ce cadre et contribuera à atteindre les objectifs du levier 2 « Développer le capital humain et l'accès

aux services sociaux de base », et plus particulièrement son chantier stratégique de l'emploi pour tous et de la promotion de la jeunesse et des sports.

A travers le Programme de volontariat national, non seulement la jeunesse sera associée aux réflexions sur le développement du pays mais surtout elle prendra une part active dans la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan d'actions prioritaires de la SCAPP. Ainsi le Programme, à travers la promotion de l'engagement volontaire pourra contribuer de manière transversale à l'atteinte des objectifs spécifiques des chantiers des autres leviers de la Stratégie.

- **Sur le Cadre Partenarial pour le Développement Durable (CPDD) et sur la Stratégie pays du PNUD (CPD 2018-2022).**Le programme national de promotion de l'engagement volontaire contribuera au CPDD à travers l'atteinte de l'Effet 1, de la priorité 3 portant sur la promotion de la gouvernance sous toutes ses formes. Ainsi l'effet stipule « Les institutions démocratiques travaillent de manière plus transparente et participative, en élargissant l'espace démocratique pour améliorer la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et la sécurité, et le système de justice et pénitentiaire est plus indépendant et efficace ».

- **Sur le Plan-cadre stratégique du programme des Volontaires des Nations Unies (2018-2021)** : L'initiative de la mise en place du Programme national de promotion de l'engagement volontaire en Mauritanie s'aligne sur la vision du Programme des Volontaires des Nations unies, d'aider les pays à intégrer plus efficacement le volontariat dans leurs cadres nationaux de développement et à permettre ainsi une meilleure participation des citoyens aux processus de développement. Ce choix stratégique s'aligne sur la Réalisation 1 « Le volontariat, qui est un moyen efficace de mise en œuvre et de mobilisation, permettra d'appuyer les efforts déployés par les États Membres en vue d'exécuter le Programme2030 » que vise son cadre stratégique.

- **Sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) :** Les ODD, basés sur les principes d'universalité et d'inclusion, ont pour ambition de placer l'humain au cœur de leur centre d'intérêt. Le partenariat global doit alors être étendu à l'ensemble des parties-prenantes des secteurs public, privé et solidaire, et les moyens traditionnels de mise en œuvre doivent être renforcés afin de donner la capacité aux individus d'y prendre part activement. Dans cette perspective, le volontariat dans sa diversité a un rôle crucial à jouer dans ce nouvel agenda du développement durable. Il participe à la construction d'une citoyenneté active et contribue à l'appropriation par les citoyens des enjeux et défis du développement durable. La mise en place du Programme de volontariat en Mauritanie répond à cette réflexion universelle de faire du volontaire un outil de mobilisation et d'encadrement des masses actives du pays pour apporter leurs pierres à l'édifice de la construction nationale.

- **Sur la riposte nationale contre la pandémie COVID-19 :** Dans le cadre de la riposte nationale prioritaire contre la COVID-19, le projet s'avère une contribution immédiate à la mobilisation d'un corps de jeunes volontaires qui vont appuyées les services de la santé en vue de renforcer le dispositif de veille et de détection des cas communautaires. Ainsi plus de 14,000 jeunes volontaires sont attendus d'être mobilisés et mis à la disposition à travers les différentes régions du pays afin d'apporter les informations de proximité utile sur la prévention et la protection contre la maladie. Sans ce dispositif, les moyens logistiques de communication et de prise de

conscience communautaire contre la COVID -19 seront insuffisants. Le dispositif s'avère être également important en matière de relance en période post COVID 19 notamment sur les questions de réponse socio-économiques a la pandemie.

IV. RÉSULTATS ET PARTENARIATS

1. Résultats escomptés

Le projet va contribuer à l'institutionnalisation d'un Programme national pour l'engagement volontaire en Mauritanie fonctionnel et durable en vue d'accompagner l'essor du pays dans toutes ses dimensions.De façon spécifique le projet visera à :

1)- Créer un environnement juridique favorable à l'engagement volontaire dans le pays. Ce cadre réglementaire (décret ou arrêté) s'avère nécessaire pour la mise en œuvre du projet, avant la mise en place d'un cadre juridique au terme du projet. Dans ce cadre, et pour être en phase avec les enjeux du 21ème siècle, il sera envisagé la mise en place d'un cadre légal à intégrant les jeunes comme cible prioritaire, mais ouvert aux moins jeunes qui peuvent apporter plus aux plus jeunes. Il sera envisagé un mécanisme de gestion allégé pour éviter de rendre son opérationnalité lourde. Le volontariat est une forme privilégiée d'expression de la volonté d'engagement au service d'une cause d'intérêt général. Il s'est essentiellement exprimé d'une façon empirique dans le cadre associatif et communautaire. Le Programme national de volontariat compte investir des secteurs et d'autres cadres d'accueil, telle que l'administration nationale ou locale ou encore le secteur privé. Cela ne pourra se faire que dans un cadre juridique harmonisé avec la mise en place de règles et d'institutions qui l'organisent, fixent les rôles et les responsabilités ainsi que les droits et devoirs des différents acteurs.

Ce cadre juridique permettra au gouvernement, mais également à tous les acteurs du développement qui souhaitent recourir à cette forme d'engagement de :

- Disposer d'une définition du volontariat national, de nature à éviter toute confusion entre : volontariat, salariat, fonctionnariat et bénévolat ;
- Consacrer un statut légal adapté, garantissant à la fois l'engagement du volontaire et l'implication de l'organisme d'accueil ;
- Créer les conditions favorables au développement en Mauritanie de l'engagement volontaire.

2)- Mettre en place un dispositif national pérenne et opérationnel de gestion des jeunes mobilisés pour le volontariat et le bénévolat, et prenant en compte l'apport des moins jeunesen termes d'expérience et de transfert de compétences. Il s'agit de mettre en place un cadre opérationnel et un système de recrutement, de gestion et d'administration des volontaires nationaux.

3)- Mobiliser et déployer 10,600 jeunes dans le cadre d'opérations publiques de développement communautaires. Ces jeunes bénéficieront d'un encadrement civique et d'une introduction à la profession auprès de laquelle ils seront déployés en appui durant leur mission. Dans ce cadre les technologies numériques modernes seront favorisées, permettant ainsi d'ouvrir les perspectives d'insertion durable des participants au programme.

A l'issue du Projet, un dispositif national de promotion de l'engagement volontaire serait opérationnel sur l'ensemble du territoire national et offrira un cadre qui fédérera et coordonnera les initiatives volontaires dans le pays. Ce dispositif sera également un outil stratégique pour engager la participation des jeunes sur le long terme dans le développement du pays.

Le déploiement du dispositif sera progressif, principalement pour la mise en mission des volontaires nationaux. Pour se faire, la mise en place de la base de données de candidats au bénévolat se fera au démarrage dans toutes les Régions du pays et celle des candidats au volontariat national sera en fonction de la programmation des Régions pour accueillir le Programme.

2. Rressources requises pour atteindre les résultats escomptés

La mise en œuvre du projet nécessitera une combinaison de compétence nationale, d'une assistance technique au démarrage et d'un soutien opérationnel et logistique notamment du matériel roulant pour faciliter les suivis du Projet au regard de l'étendue du territoire.

Divers acteurs notamment de l'administration centrale, de la Société civile et des collectivités locales seront sollicités dans les réflexions stratégiques et opérationnelles du projet notamment dans le développement du dispositif de mobilisation et de gestion des volontaires.

3. Partenariats

Le Programme national de volontariat s'exécutera en partenariat avec différents ministères et départements nationaux impliqués dans la mobilisation des jeunes, mais éalement titre de bénéficiaire directe ou indirecte des missions des volontaires et bénévoles. Les acteurs de la société civile et du secteur privé seront associés au programme.

Par ailleurs, le programme développera une approche startégique complémentaire avec la démarche universelle de promotion du volontariat, et par conséquent des synergies seront baties avec d'autres programmes de déploiement de volontaires aussi ben au niveau national qu'international.

Le renforcement de la participation des différents partenaires assurera une mise en œuvre efficace et efficiente du projet mais aussi contribuera également à assurer une intégration adéquate du volontariat dans l'agenda de développement du pays et garantira sa durabilité.

Dans ce cadre de manière spécifique, il sera ouvert à certaines organisations de la société civile (Associations, ONG.) nationaleset internationales convaincues de l'engagement volontaires et prêtes à accompagner le projet par l'accueil de volontaires à titre expérimental. La structure nationale de volontariat pourra capitaliser les outils contractuels et les types de missions d'intérêt général à construire avec les OSC. Il pourra également être ouvert au secteur privé dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

V. BÉNÉFICIAIRES

i. Les beneficiaries directs

Le principal bénéficiaire de ce Projet est l'Etat, qui disposera d'un cadre pour la promotion du civisme actif pour accompagner ses efforts, et ceux des Organisations de la société civileet des populations pour relever les défis de développement.

- La population active du pays notamment les jeunes hommes et femmes, émanant de tous les horizons et de divers groupes sociaux. Ces derniers développeront à travers leur engagement une expérience personnelle pouvant améliorer leur capacité à s'insérer dans la vie professionnelle et sociale. Ceci leur permettra de contribuer de façon durable aux actions de développement du pays.

- Les volontaires eux-mêmes qui, à travers leurs engagements, s'accomplissement sur le plan personnel, éprouvent le sentiment d'utilité nationale et celui d'avoir promu les valeurs auxquelles ils croient.
- Les Structures dans les différentes Wilayas, les Projets /Programmes dont les interventionsdes volontaires viendront renforcer la capacité de leurs équipes dans la planification, l'exécution et le suivi de leurs actions.

ii. **Les bénéficiairesindirects**

- Lespopulations dontles conditions de vie seront améliorées par la contribution des actions des volontaires ;
- Les partenaires au développement qui, grâce aux volontaires nationaux mis à contribution dans le cadre de leurs interventions en faveur du pays, renforceront leur présence sur le terrain et de réduiront, de façon substantielle, le coût de leurs interventions.

VI. RISQUES ET HYPOTHÈSES

La mise réussite du programme est tributaire de la prise en compte des risques ci après, et de la mise en œuvre de leur mesures de d'atténuation :

Risques	Mesures d'atténuation
Manque d'adhésion de la population aux principes du civisme volontaire	Le Ministère de la Jeunesse déploiera une intense stratégie de mobilisation sociale en partenariat avec d'autres ministères et institutions républicaines.
Faible intérêt des jeunes à une participation au programme	Le projet accompagnera une large campagne d'information et de sensibilisation des jeunes pour leur expliquer les avantages du volontariat, ainsi que les modalités de mobilisation et de déploiement.
Faible mobilisation des ressources pour l'encadrement et le déploiement des volontaires, mais également pour le renforcement du cadre institutionnel devant pérenniser le dispositif	Une communication active sur les avantages, et les objectifs du projet sera conduite à l'attention des partenaires, en lien avec la réalisation des ODD.
La pandémie sanitaire de la COVID pourrait freiner le déploiement des activités de terrain	Le projet mettre en avant une stratégie opérationnelle basée sur les principes de distanciation sociale, le recours aux gestes barrières. Par ailleurs des équipements de protection seront envisagés.

VII. DURABILITÉ ET AMPLIFICATION

Elles devront reposer sur trois (3) dimensions que sont :

1. La garantie du financement

Un partenariat solide devra être développé durant la période de mise en œuvre du projet à travers un programme stratégique de mobilisation des ressources. Le besoin en financementdu futur Programme devra être déterminé durant la phase de sa mise en place et les budgets projetés avec la contribution des différents partenaires, à savoir :

- l'Étatqui devra allouer un budget sous forme de contrepartie affectée au Programme National de Volontariat, mais aussi prospecter la possibilité de mobiliser d'autres Fonds auprès de partenaires bi ou multilatéraux ;
- le secteur privé à travers le prisme de leur Responsabilité sociale;
- les collectivités locales ;
- lespotentielles Structures/Organisations d'accueil des volontaires;
- les partenaires techniques et financiers qui pourront intervenir à trois niveaux de contribution (i) à travers une collaboration/synergie de leurs projets/programmes de renforcement de capacités et d'appui aux actions à la base dans les wilayas, (ii) le financement direct d'appui institutionnel ou des activités à mettre en œuvre par des volontaires.

2. Disponibilité des candidats au volontariat

La disponibilité des candidatures est de nature à garantir la pérennisation des activités du futur Programme par la satisfaction continuelle de la demande avec une adéquation entre la qualité du produit fourni (les volontaires) et le besoin d'appui sollicité. Pour cela, le Programme devra constituer une base de données, un fichier thématique des candidats au volontariat et celui des potentielles Organisations d'accueil des volontaires.

Ces fichiers devront être informatisés et suffisamment fournis de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture au niveau de la capacité de satisfaction de la demande en volontaires des Structures d'accueil, qui seront elles aussi, répertoriées, codifiées et priorisées selon les requêtes envoyées auprès de la coordination du Programme.

Des conditions de service qui permettent l'épanouissement des volontaires à travers une claire définition des devoirs et droits des volontaires et des organisations hôtes devront être développées.

Des campagnes de sensibilisation et de promotion de volontariat national seront organisées pour permettre une appropriation du concept de volontariat.

Les structures sollicitant le service de volontaires devront préalablement identifier une mission dont elles sont convaincues de la pertinence de la présence d'un volontaire.

3. Prise en charge des Volontaires

Pour permettre aux volontaires de remplir leur mission, une indemnité de subsistance sera versée à chacun. Cette indemnité n'est pas à confondre avec un salaire, étant donné que la première motivation du volontaire n'est pas la rémunération mais c'est contribuer aux efforts de développement du pays. Le contenu de ce montant et la modalité de son allocation au volontaire devront être spécifiés dans l'accord signé entre le Volontaire et l'unité coordinatrice du Programme.

4. Accompagnement des volontaires en mission

La pérennité du Programme dépendra aussi de l'intérêt qu'il suscitera auprès des candidats au volontariat et des volontaires en mission. Cet intérêt pourrait être nourri en :

- Renforçant les capacités techniques des volontaires à s'auto employer en fin de mission ;

- Développant les compétences à caractère stratégique des volontaires afin de renforcer leurs capacités à l'insertion sur le plan professionnel.

VIII. GESTION DU PROJET

1. Arrangement financier

Les ressources financières requises pour la mise en œuvre complète du Projet sont détaillées dans le Plan de travail pluriannuel. Ces ressources qui continueront à être mobilisées de manière active incluent également les besoins matériels et des ressources humaines.

Le coût opérationnel du projet sera principalement financé par le Gouvernement avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme des Volontaires pour les Nations Unies.

Les ressources de l'État couvriront les frais pour la prise en charge communautaire des volontaires, le renforcement de leurs capacités, le déploiement du Directeur National du Programme

Les appuis du PNUD et du Programme de Volontariat des Nations Unies porteront sur la prise en charge de l'assistance technique pour la mise en place des outils cadres du programme et la création du cadre juridique. Leurs ressources financeront aussi (i) les missions de supervision et les évaluations externes ; (ii) les campagnes d'information et de communication sur le volontariat ; (iii) les équipements et matériels nécessaires pour la mise en œuvre du Projet.

2. Modalité d'exécution

Le projet sera mis en œuvre selon la modalité d'exécution nationale (NEX) [1]par le Ministère chargé de la jeunesse comme partenaire d'exécution. Il veillera à ce que les activités du Programme s'insèrent dans le cadre des objectifs fixés par le gouvernement en matière de promotion et d'inclusion des jeunes. A cet égard, l'équipe du projet travaillera de manière étroite avec la coordination nationale du programme Watanouna, lequel coordonnateur apportera des conseils sur les complémentarités opérationnelles.

Le projet d'appui sera mis en œuvre avec des services d'appui du bureau pays du PNUD, dont le détail des interventions sera défini dans le plan de travail opérationnel. Toutes les opérations de recrutement et d'acquisition de biens et services confiées au bureau du PNUD, seront effectuées selon les règles de transparence et de compétitivité et en conformité avec les procédures du PNUD.

Le projet sera audité conformément aux procédures du PNUD en matière d'audit des projets de l'exécution nationale.

[1] La modalité finale dépendra du résultat de la micro évaluation des capacités.

IX. CADRE DES RESULTATS

Résultat Escompté CPDD : Les institutions en charge du pilotage économique élaborent et mettent en œuvre des politiques qui contribuent à une croissance inclusive et durable

Indicateur de résultat CPD :1.1 Taux d'emploi par sexe, âge, région (moughataa).

Référence :50,66 % (F :40 % ; H : 75,15 %)

Cibles :55 % (F : 45 % ; H : 82 %)

Produit (s) applicable (s) du Plan stratégique du PNUD: La croissance et le développement revêtent d'un caractère global et durable, intégrant les capacités de production qui créent de l'emploi et des moyens de subsistance pour les pauvres et les exclus ;

Titre du Projet : Mise en place du Programme National de Volontariat en Mauritanie

Numéro Atlas du Projet :

PRODUITS ATTENDUS	INDICATEUR DE PRODUIT	SOURCE DE DONNEES	REFERENCE		CIBLES					METHODE DE COLLECTE DE DONNEES ET RISQUES
			VALEUR	ANNÉE	2020	2021	2022	2023	FINAL	
PRODUIT 1 Un cadre légal favorable à la promotion à l'engagement volontaire est mis en place	Loi instituant et réglementant les modalités l'engagement volontaire en Mauritanie	Journal officiel	Adoption de l'arrêté sur le volontariat	2020	-	Plaidoyer en faveur de l'adoptionpar l'Assemblée Nationale d'une loi pour l'institutionnalisation et la pérennisation de l'engagement volontaire en Mauritanie.	-	Elaboration du projet de loi et adoption de la loi par l'Assemblée Nationale	Promulgation de la loi et prise des décrets d'application	**Méthode de collecte des données :** Echange avec le Ministère de la jeunesse ; Se procurer le cadre légal au Ministère de la jeunesse ou au journal officiel de la République **Risque :** Refus de légiférer sur le volontariat national

PRODUIT 2 Un dispositif de promotion et de gestion du Programme National de Volontariat est opérationnel	Cadre des opérations du programme	Rapport du projet	Absence de cadre de référence de promotion du volontariat	2019	Développement des outils pour la promotion et la gestion du Programme	Consolidation du dispostif	-	-	Document des opérations du Programme	**Méthode de collecte des données** : Echange avec l'unité de gestion **Risque :** - Faible adhésion des acteurs - Faibles capacités nationales
PRODUIT 3 Le leadership civique et citoyen est développé chez 5000 volontaires et 10.000 bénévoles dont au moins 50% de filles	Nombre volontaires mobilisés,	Rapport périodique du projet	55	2017	150	200	350	300	5 000	**Méthode de collecte des données :** Examen de documents ; Echange avec l'équipe projet ; Visite de terrain **Risque :** - Faible intérêt des jeunes - Manque de ressources pour la prise en charge des jeunes - Persistance de la crise sanitaire
	Nombre de bénévoles mobilisés		0	2019	300	3 000	3 000	4000	10 000	

X. SUIVI ET ÉVALUATION

Conformément aux politiques et procédures de programmation du PNUD, le projet fera l'objet d'un suivi selon les plans de suivi et d'évaluation ci-dessous :

1. Plan de suivi

ACTIVITÉ DE SUIVI	OBJET	FRÉQUENCE	ACTION PRÉVUE	PARTENAIRES ÉVENTUELS	COÛT ÉVENTUEL
Suivre les progrès vers les résultats	Recueillir et analyser les données sur les progrès par rapport aux indicateurs de résultats du Cadre des résultats afin de déterminer les progrès du projet vers l'obtention des produits convenus.	Trimestrielle.	Intervention du comité de pilotage en cas de progrès plus lents que prévus.		
Suivre et gérerles risques	Identifier les risques spécifiques susceptibles de menacer l'atteinte des résultats prévus. Identifier et suivre les mesures de gestion des risques au moyen d'un registre des risques. Ceci comprend les mesures et les plans de suivi qui ont pu être requis selon les normes sociales et environnementales du PNUD. Des audits seront réalisés conformément à la politique d'audit du PNUD pour gérer les risques financiers.	Trimestrielle	La direction du projet identifie les risques et prend des mesures de gestion de ces risques. Elle veille à la tenue et à l'actualisation du registre des risques pour assurer le suivi des risques repérés et des mesures prises.		
Apprendre	Les connaissances, les bonnes pratiques et les enseignements seront dégagés périodiquement des activités du projet ainsi que recherchés activement auprès d'autres projets et de partenaires puis réintégrés dans le projet.	Au moins annuelle	L'équipe du projet dégage les leçons appropriées et en tient compte pour éclairer les décisions de gestion.	Structures d'accueil des volontaires	
Assurance qualité du projet	La qualité du projet sera évaluée par rapport aux normes de qualité du PNUD pour repérer les forces et les faiblesses du projet et pour éclairer la prise de décisions de gestion afin d'améliorer le projet.	Annuelle	La direction du projet examine les forces et les faiblesses du projet et en tient compte pour éclairer ses décisions et améliorer les performances du projet.		
Revoir et Prendre des mesures correctives	Revue interne des données et des preuves issues de toutes les actions de suivi afin d'éclairer la prise de décisions.	Semestrielle	Les données sur les performances, les risques, les leçons et la qualité font l'objet d'un examen du comité de pilotage et sont utilisées pour prendre des mesures correctives.		

Rapport du projet	Il sera présenté au comité de pilotage du projet et aux parties prenantes clés un rapport d'avancement qui comprendra les données sur les résultats obtenus au regard des cibles annuelles prédéfinies au niveau des produits, le résumé d'évaluation annuel de la qualité du projet, un registre des risques actualisé avec indication des mesures d'atténuation et tous les rapports d'évaluation et de revue établis au cours de la période considérée.	Semestrielle, Annuelle et à la fin du projet (rapport final)			
Revue du projet	Le mécanisme de gouvernance du projet (comité de pilotage) effectuera des revues périodiques du projet pour en évaluer la performance et examiner le Plan de travail pluriannuel afin de garantir le réalisme des budgets pour la durée du projet. La dernière année du projet, le comité de pilotage effectue une revue du projet pour dégager les leçons à retenir, examiner les possibilités d'amplification d'échelle et diffuser les résultats et les enseignements à retenir du projet auprès des publics concernés.	Semestrielle	Il convient que le comité de pilotage examine toutes les préoccupations relatives à la qualité et à la lenteur de l'avancement du projet et que des mesures de gestion soient prises pour traiter les problématiques mises en évidence.		

2. Plan d'évaluation

Titre de l'évaluation	Partenaires (éventuels)	Produit associé du plan stratégique	Effet du PNUAD/DPP	Date d'achèvement prévue	Parties prenantes clés de l'évaluation	Coût et source du financement
Évaluation à mi-parcours				Janvier 2022	- PNUD, - Prog. VNU, - Ministère en charge de la jeunesse, - Structures d'accueil des volontaires	10 000 USD
Évaluation finale				Décembre 2023	- PNUD, - Prog. VNU, - Ministère en charge de la jeunesse, - Structures d'accueil des volontaires	15 000 USD

XI. PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Planned Budget by Year				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
		Y1	Y2	Y3	Y4		Funding Source	Budget Description	Amount
Produit 1 : Un cadre légal favorable à la promotion à l'engagement volontaire est mis en place	**Sous-produit 1.1 : Un arrêté créant, fixant et réglementant les modalités de l'engagement volontaire en Mauritanie est élaboré**								
	Plaidoyer a l'attention des autorités nationales sur le bien-fondé d'introduire une loi sur le volontariat	-	-	-	-		Gvt		-
	Elaborer, faire voter et adopter un texte de loi sur le volontariat	2 500,00	-	-	-	MEJS/PNUD	Gvt		2 500,00
	Elaborer et exécuter un programme de communication sur le cadre légal	5 000,00	-	-	-	MEJS/PNUD	Gvt		5 000,00
	Sous-produit 1.2 : Le projet de loi est adopté et voté								
	Faire un Lobbying à l'attention des députés et groupes parlementaires	-	-	-	-	MEJS/PNUD			-
	Vulgariser la loi votée	-	2 500,00	-	-	MEJS/PNUD	A Mobiliser		2 500,00
	Sous-Total Produit 1								**10 000,00**
Produit 2 : Un dispositif de promotion et de gestion du Programme National de Volontariat est opérationnel	**Sous-Produit 2.1 L'appui institutionnel est assuré**								
	Mettre en place l'équipe de coordination et de gestion du Projet	76 950,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	MEJS/PNUD	PNUD/autresdonnateurs		384 750
	Assistance Technique	45 000,00	-	-	-	MEJS/PNUD			45 000
	Mettre en place et former les équipes relais régionales	4 500,00	7 500,00	10 500,00	-	MEJS/PNUD	Mobiliser		22 500
	Faire fonctionner le dispositif des opérations du Programme	117 500,00	24 500,00	28 750,00	10 000,00	MEJS/PNUD	Gvt/ Autresdonnateurs		180 750
	Organiser des réunions du comité de pilotage	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	MEJS/PNUD	PNUD		3 500
									+

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Planned Budget by Year				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
		Y1	Y2	Y3	Y4		Funding Source	Budget Description	Amount
	Sous-Produit 2.2 : Un système opérationnel de déploiement et de gestion des volontaires est développé								
	Elaborer un référentiel des missions (Ateliers d'élaboration et validation)	12 500,00	-	-	-	MEJS/PNUD			12 500
	Elaborer le document des opérations du Programme	10 000,00	-	-	-	MEJS/PNUD	A mobiliser		10 000
	Elaborer une stratégie de communication	-	-	-	-	MEJS/PNUD	A mobiliser		
	Développer un site web pour le programme	12 500,00	-	-	-	MEJS/PNUD	A mobiliser		12 500,00
	Mener des actions de sensibilisation sur la vision, les missions et les actions du programme	7 500,00	12 500,00	17 500,00	-	MEJS/PNUD	A mobiliser		37 500,00
	Commémorer la Journée Internationale des Volontaires (JIV)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	MEJS/PNUD	A mobiliser		20 000,00
	Sous-Total Produit 2								**725 500,00**
Produit 3: Des bénévoles et des volontaires dont 50% de femmes sont sollicités et mis en service	**Sous-produit 3.1 Les candidats à l'engagement volontaire sont identifiés**								
	Mettre en place une base de données des candidatures au bénévolat et au volontariat	2 500,00	-	-	-	MEJS/PNUD	A Mobiliser		2 500,00
	Mobiliser les candidats à l'engagement volontaire (Sélection et Formation)	3 750,00	5 000,00	8 750,00	7 500,00	MEJS/PNUD	A mobiliser		25 000,00
	Mobiliser des bénévoles (Sélection et Formation)	-	-	-	-	MEJS/PNUD	A mobiliser		-
	Sous-produit 3.2 Les volontaires et les bénévoles sont mis en service								
	Mobiliser les structures d'accueil des volontaires (Enregistrement, accord d'agrément, formation)	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	MEJS/PNUD	Gvt		9 000,00
	Mettre en service les volontaires (Allocation et autres charges de gestion)	45 000,00	240 000,00	420 000,00	360 000,00	MEJS/PNUD/ OMS/UNICEF	PNUD/OMS/UNICEF/A mibiliser		1 065 000,00
	Deployer des bénévoles	-	-	-	-	MEJS/PNUD	Gvt		-

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Planned Budget by Year				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
		Y1	Y2	Y3	Y4		Funding Source	Budget Description	Amount
	Sous-Total Produit 3								**1 101 500,00**
Produit 4 : Un système de S&E est organisé et mis en œuvre	Concevoir un dispositif de suivi-évaluation	10 000,00	-	-	-	MEJS/PNUD	PNUD		10 000,00
	Organiser des rencontres de concertation avec les acteurs du dispositif	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	MEJS/PNUD	A mobiliser		30 000,00
	Organiser des missions de Suivi et de visite de terrain	2 500,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	MEJS			27 500,00
	Evaluer l'action des volontaires et des bénévoles	-	-	-	-	MEJS/PNUD			-
	Evaluer le Projet à mi-parcours	-	10 000,00	-	-	MEJS/PNUD	PNUD		10 000,00
	Evaluer le Projet à la fin de son cycle	-	15 000,00	-	-	MEJS/PNUD	PNUD		15 000,00
	Sous-Total Produit 4								**92 500,00**
General Management Support									
TOTAL									**1 933 500,00**

XII. MODALITÉS DE GOUVERNANCE ET DE GESTION

1. Cadre institutionnel et opérationnel de mise en œuvre du Projet

1.1. Le comité d'orientation stratégique

Le pilotage du Projet sera assuré par un Comité composé de représentants, du Ministère chargé de la jeunesse, du Programme VNU, du PNUD, d'Agences des Nations unies et d'infrastructures de volontariat représentées en Mauritanie, de ministères sectoriels, de la Société civile et des partenaires au développement contribuant au programme.En capitalisant sur l'expérience du précédent programme de volontariat, il est important que les représentants soient désignés nommément sur proposition de leur structure d'appartenance.Cette structure sera l'organe de concertation et d'orientation du projet. Elle se réunira deux fois par an en séance ordinaire sur demande de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin.

Le comité estcoprésidé par le Ministre en charge de la jeunesse, et le Représentant Résident du PNUD ou leurs représentants. Son Secrétariat est assuré par le Directeur national appuyé par l'Unité de Gestion du Projet

Il aura pour principales missions de :

- Définirles orientations stratégiquedu Projet,
- Orienter la mobilisation des ressources complémentaires,
- Valider la planification des résultats annuels du projet et examiner l'état leur état d'avancement;
- Proposer des aménagements éventuels pour améliorer la mise en œuvre ;
- Fournir des appui/conseils avisés à la coordination du projet sur les problèmes d'exécution éventuels et sur les ajustements nécessaires.

1.2. Le Directeur National de Projet (DNP)

Le Directeur National du Projet, agira comme l'interface représentant le Ministère chargé de la jeunesse,et aura la charge de l'exécution des activités programmées. Il sera responsable, à ce titre, de la réalisation des objectifs assignés au projet. Il sera habilité à engager les dépenses, dans les limites définies par les budgets approuvés par le Comité de suivi technique devant lequel il sera redevable des résultats programmatiques et de l'utilisation des ressources.

1.3. L'Unité de Gestion du Projet (UGP)

La gestion du Projet sera assurée par une Unité de Gestion du Projet (UGP) composé d'un Conseiller Technique Principal, spécilaitse en question de volontariat jeunesse, et d'une équipe d'appui.

Elle a pour mission de :

- Apporter les conseils techniques requis pour la finalisation des outils cadres du programme,
- Appuyer l'organisation des réunions des organes de gestion du Projet ;
- Élaborer les plans de travail budgétisés et les rapports d'activités à soumettre au Comité de Pilotage ;
- Appuyer la coordinationde l'exécution des activités du projet ;
- Assurer une gestion financière efficace et transparente des ressources ;
- Promouvoir l'amélioration continue des outils et méthodes d'intervention ;


En plus du Conseiller Technique Principal, elle se composera de :

- Un Assistant Technique spécialiste national en mobilisation de la jeunesse
- Un assistant administratif et financier;
- Un chargé de la mobilisation et de la formation (VNU National);
- Un chargé du suivi évaluation (VNU National);

L'unité de gestion s'appuiera sur des relais dans les Wilaya pour le déploiement des activités du Projet dans les Wilayas. Ces relais désignés Centres de volontariat contribueront à :

- Renforcer l'ancrage et la visibilité du Programme de mobilisation des volontaires au niveau des wilayas
- Rapprocher les Volontaires Nationaux en mission dans les wilayas de la Coordination du dispositif ; Assurer la mobilisation le déploiement et la gestion des volontaires et des bénévoles ;
- Assurer le suivi individuel des volontaires sur le terrain et dans les structures d'accueil ;
- Capitaliser l'impact de l'action des volontaires sur le développement des wilayas.

2. Structure de Governance du Projet

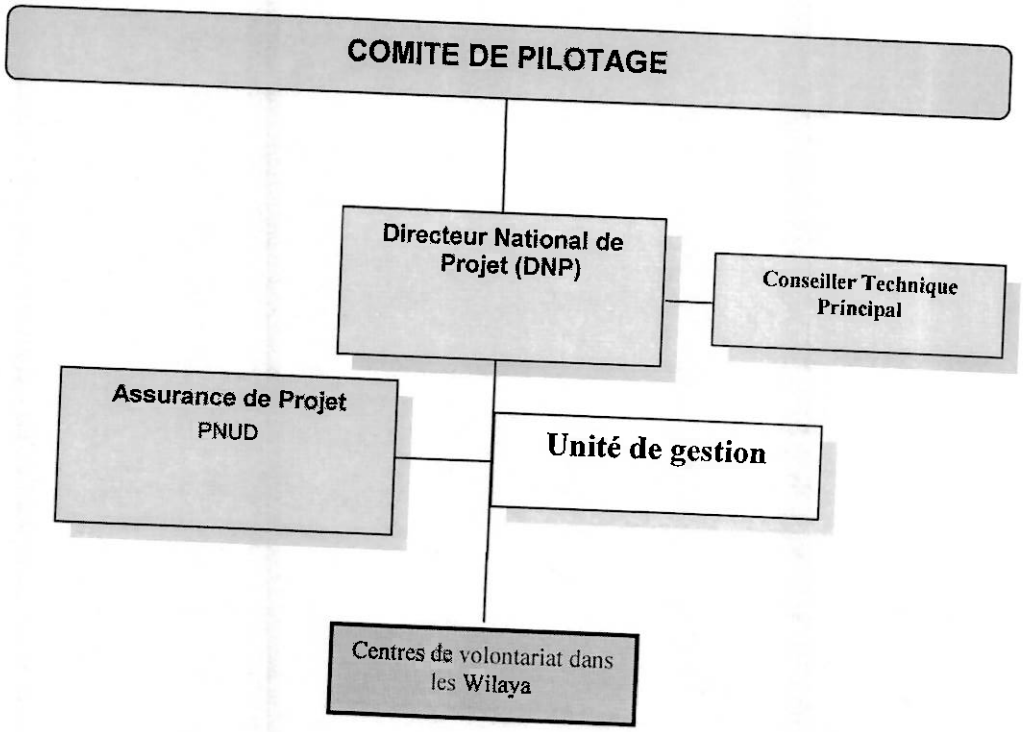

XIII. GESTION DES RISQUES

- Conformément aux dispositions de l'Article III du SBAA [ou des Dispositions supplémentaires du Document de projet], la responsabilité de la sécurité du Partenaire de réalisation et de son personnel et de ses biens, et de la propriété du PNUD sous la garde du Partenaire de réalisation, relève du Partenaire de réalisation. À cette fin, le Partenaire de réalisation :

a) met en place un plan de sécurité approprié et veille à son administration, compte tenu de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est réalisé;

b) assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à la mise en œuvre de la sécurité du Partenaire de réalisation et assure la mise en œuvre complète du plan de sécurité.

- Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer que des modifications y soient apportées si nécessaire. Le défaut de mise en place et de mise en œuvre d'un plan de sécurité approprié tel que requis en vertu du présent document sera réputé constituer un manquement aux obligations du Partenaire de réalisation au titre du présent Document de projet.

- Le Partenaire de réalisation convient de déployer tous les efforts raisonnables pour faire en sorte qu'aucuns des fonds du PNUD reçus en vertu du Document de projet ne soient utilisés pour financer des personnes physiques ou morales associées au terrorisme et à ce que les bénéficiaires de toute somme remise par le PNUD dans le cadre de ces dispositions ne figurent pas sur la liste administrée par le Comité du Conseil de sécurité établie en vertu de la résolution 1267 (1999), laquelle liste peut être consultée à https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

- La durabilité sociale et environnementale du projet sera favorisée par l'application des normes du PNUD en la matière (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilisation connexe (http://www.undp.org/secu-srm).

- Le Partenaire de réalisation est tenu : a) de mener les activités liées au projet et au programme en accord avec les normes du PNUD en matière sociale et environnementale, b) de mettre en œuvre tout plan de gestion ou d'atténuation élaboré pour le projet ou programme en conformité avec ces normes, et c) de s'employer de manière constructive et opportune à répondre à toute préoccupation et plainte émise par le biais du mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et autres parties prenantes au projet soient informées du mécanisme de responsabilisation et y aient accès.

- Tous les signataires du Document de projet sont tenus de coopérer de bonne foi à toute activité d'évaluation des engagements ou de respect des normes sociales et environnementales du PNUD en rapport avec le programme ou projet. Ceci inclut l'octroi de l'accès aux sites du projet au personnel correspondant et aux informations et à la documentation.

- Le Partenaire de réalisation prendra des mesures appropriées de prévention du mésusage des fonds, de la fraude ou de la corruption du fait de ses personnels officiels, des consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires dans la réalisation du projet ou l'emploi des fonds du PNUD. Le Partenaire de réalisation veillera à ce que ses politiques de gestion financière et de lutte contre la corruption et la fraude soient en place et appliquées pour tous les financements reçus provenant du PNUD ou acheminés par l'intermédiaire de celui-ci.

- Les exigences énoncées dans les documents suivants en vigueur à la date de la signature du Document de projet s'appliquent au Partenaire de réalisation : a)la Politiquedu PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et b)les Directives relatives aux enquêtesdu Bureau de l'audit et des enquêtes du

PNUD. Le Partenaire de réalisation accepte les exigences énoncées dans les documents ci-dessus, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à www.undp.org.

- Au cas où il s'impose de procéder à une enquête, le PNUD a l'obligation d'enquêter sur tout aspect de ses projets et programmes. Le Partenaire de réalisation est tenu d'accorder sa pleine coopération, notamment en mettant à disposition le personnel et la documentation appropriée et en accordant l'accès aux locaux du Partenaire de réalisation (et à ceux de ses consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires) à ces fins, à des heures et dans des conditions raisonnables ainsi que peut l'exiger l'objet de l'enquête. Au cas où l'exécution de cette obligation serait sujette à une limite, le PNUD consulte le Partenaire de réalisation pour trouver une solution.

- Les signataires du présent Document de projet s'informent promptement les uns les autres de tout cas éventuel d'emploi inapproprié de fonds ou d'allégation crédible de fraude ou de corruption en respectant dûment la confidentialité de cette information.

  Lorsque le Partenaire de réalisation a connaissance de ce qu'un projet ou une activité du PNUD fait, en tout ou en partie, l'objet d'une enquête suite à des allégations de fraude/corruption, il en informe le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui en informe promptement le Bureau de l'audit et des enquêtes (OAI) du PNUD. Le Partenaire de réalisation fournit des informations périodiques au responsable du PNUD dans le pays et à l'OAI sur le statut de ladite enquête et sur les actions y afférentes.

- Le PNUD a droit à un remboursement de la part du Partenaire de réalisation de tous fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conformes aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de réalisation au titre du présent accord ou de tout autre.

  Lorsque ces fonds n'ont pas été remboursés au PNUD, le Partenaire de réalisation convient que les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

  N.B.: Le terme « Document de projet » employé dans la présente clause est à interpréter comme incluant tout accord subsidiaire pertinent au titre du présent Document de projet, et notamment les accords avec les parties responsables, sous-traitants et sous-bénéficiaires.

- Chaque contrat émis par le Partenaire de réalisation en rapport avec le présent Document de projet doit comporter une disposition selon laquelle il ne saurait être accordé, reçu ou promis de redevances, gratifications, rabais, cadeaux, commissions ni autres paiements, si ce n'est ceux qui figurent dans la proposition, en rapport avec le processus de sélection ou de réalisation du contrat, et prévoyant que le bénéficiaire de fonds du Partenaire de réalisation est tenu de coopérer avec toute enquête et tout audit après paiement quels qu'ils soient.

- Au cas où le PNUD s'adresserait aux autorités nationales compétentes pour entamer des actions juridiques appropriées concernant toute faute présumée en rapport avec le projet, le gouvernement veillera à ce que lesdites autorités nationales enquêtent activement sur l'affaire et prennent des mesures juridiques appropriées à l'encontre de toutes les personnes dont il aura été déterminé qu'elles ont participé à la commission de la faute, recouvrent les fonds et rendent tous les fonds recouvrés au PNUD.

- Le Partenaire de réalisation est tenu de veiller à ce que toutes ses obligations énoncées dans la présente section à la rubrique « gestion des risques » soient transférées à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire et à ce que toutes les clauses de la présente section intitulées « clauses standard de gestion des risques » soient incluses, mutatis mutandis, dans tous les sous-contrats ou sous-accords conclus suite au présent Document de projet.

- La valeur du paiement, si celui-ci est effectué dans une devise autre que le dollar des États-Unis, est déterminée en appliquant le taux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur à la date du paiement. En cas de modification du taux de change opérationnel des Nations Unies avant l'utilisation complète des fonds par le PNUD, la valeur du solde toujours en sa possession à ce moment-là est ajustée en conséquence. Si dans un tel cas, une perte de valeur des fonds restants est enregistrée, le PNUD en informe le Gouvernement afin de déterminer s'il pourrait fournir un financement supplémentaire. En l'absence de financement supplémentaire, le PNUD peut réduire, suspendre ou mettre un terme à l'assistance devant être fournie dans le cadre du projet. Toutes pertes (y compris, sans toutefois s'y limiter, celles résultant de fluctuations de taux de change) sont imputées au projet.

- L'échéancier des paiements ci-dessus tient compte de l'obligation d'effectuer les paiements avant l'exécution des activités envisagées. Il peut être modifié en fonction de l'avancement du projet.

- Les fonds sont perçus et administrés par le PNUD conformément à ses règles, règlements, politiques et procédures.

- Tous les comptes et états financiers doivent être libellés en dollars des États-Unis.

- Si des augmentations [imprévues] de dépenses ou d'engagements sont anticipées ou réalisées (qu'elles soient dues à des facteurs d'inflation, à une fluctuation de taux de change ou à d'autres impondérables), le PNUD soumet au Gouvernement en temps opportun une estimation du financement complémentaire estimé nécessaire. Le Gouvernement fait tout son possible pour obtenir les fonds supplémentaires requis.

- Si les paiements mentionnés ci-dessus ne sont pas reçus conformément à l'échéancier des paiements, ou si le financement supplémentaire requis conformément au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être obtenu du Gouvernement ou d'autres sources, le PNUD peut réduire, suspendre ou mettre un terme à l'assistance devant être fournie dans le cadre du projet en vertu de cet Accord.

- Conformément aux décisions et directives du Conseil d'Administration du PNUD reprises dans sa Politique de recouvrement au titre des mécanismes de financement autres que les ressources de base,

les coûts indirects encourus par les entités du siège et des bureaux de pays du PNUD pour la fourniture de services généraux de gestion et d'appui sont imputés à la contribution. Pour couvrir ces coûts de gestion et d'appui, il sera imputé à la contribution une redevance équivalente à 5%. En outre, sous réserve qu'ils soient associés sans ambiguïté à ce projet, tous les coûts directs de mise en œuvre, y compris ceux encourus par le partenaire de réalisation, sont inscrits au budget du projet et imputables à un poste budgétaire spécifique et sont en conséquence à la charge du projet.

- La propriété des équipements, fournitures et autres biens financés à partir de la contribution est dévolue au PNUD. Les questions relatives au transfert de propriété par le PNUD sont déterminées conformément aux politiques et procédures pertinentes du PNUD.

- Le paiement ainsi que le projet sont exclusivement soumis aux procédures de vérification interne et externe prévues aux Règlement financier, règles de gestion financière et politiques du PNUD.

XIV. ANNEXES

- **Analyse des risques.**

#	Description	Date d'identification	Type	Impact et Probabilité	Action de mitigation	Responsable
1	La non matérialisation des engagements pris par le Gouvernement en matière : • Deinstitutionalisation du volontariat • D'allocation des ressources financières pour la prise en charge des volontaires.		Politique et stratégique	Retard dans l'institutionnalisation du Programme et de la mobilisation effective des volontaires P=2 I=4	Engagement formel à établir à travers une convention à signer avec le gouvernement pour la mise en ouvre du Projet. Inscription dans le budget national d'une ligne budgétaire affectée au Projet Rappeler au gouvernement ses obligations contenues dans le protocole d'entente pour la mise en œuvre du Projet	Gvt
2	Les autres sources de financement des activités du Projet identifiées ne se concrétisent pas dans les délais		Stratégique	Retard dans la mise en œuvre des activités du Projet P =2 I = 4	Mettre en place Une stratégie de mobilisation de ressources et de partenariat	PNUD
3	Faible intérêt des acteurs de développement dans le pays pour le projet		Stratégique	P =3 I = 4	Impliquer les acteurs dans le processus de mise en œuvre du Projet Communiquer suffisamment sur le Projet	PNUD
4	Les acteurs ont une vision			P=2	Impliquer les acteurs dans le	

	négative des volontaires en terme de capacités pour apporter du changement.		Stratégique	I=4	processus de mobilisation et de préparation des candidats aux missions de volontariat.	Gvt
5	Difficultés pour le Projet de pourvoir en volontaires les structures et Organisationsles sollicitant		Opérationnel	P =1 I = 4	Déployer une stratégie de communication sur l'engagement volontaire	Gvt
