DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Intitulé du projet: Programme d'Electrification Rurale des Zones Isolées (PERZI)

Numéro du projet:

Partenaire de réalisation[1]**:**

Date de démarrage: Avril 2022 **Date d'achèvement:** Avril 2025

Date de réunion du CAP: Avril 2023

Description succincte
L'accès durable à l'électricité est une condition sine-qua-none à tout effort de développement socio-économique. Reconnaissant l'importance de l'énergie comme un prérequis pour le développement humain, la Mauritanie a identifié l'accès à une énergie durable pour le monde rural comme une priorité. En effet la problématique de l'accès à l'énergie constitue un défi majeur pour le pays avec un taux d'électrification très bas en milieu rural (10% en zone rurale) bien que le gouvernement a fait des avancés pour le milieu urbain (72% en milieu urbain). Dans ce cadre, le Gouvernement a mis en place le Programme d'Electrification Rurale des Zones Isolées qui vise à réduire les disparités énormes constatées dans l'accès des populations rurales à l'électricité ; à promouvoir la croissance économique, ainsi que l'utilisation productive de l'électricité et d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. L'objectif du PERZI est de créer les conditions pour un développement communautaire intégré à travers l'Accès à l'Énergie Durable, particulièrement les solutions innovantes d'électrification hors-réseau. Le Programme est articulé autour de trois résultats stratégiques qui visent à mettre en place les préconditions pour que d'ici à 2025 : • Le déficit énergétique est comblé dans 200 localités rurales, à travers l'accès à une source d'énergie propre, durable et à des coûts abordables pour les populations les plus pauvres ; • Un cadre national de gouvernance des énergies renouvelables intégrant une perspective de transition énergétique durable est opérationnalisé, • Les conditions sont mises en place pour la vitalisation socio-économique des localités isolées, permettant la création de revenues durables et le déploiement d'au moins _ catégories de services sociaux de base dont le numérique, pour plus de 300,000 habitants des communes rurales isolées, dont 60% de femmes. Utilisant comme point d'entrée l'accès à l'énergie pour des usages productifs, le programme est conçu comme un portefeuille intégrée de services de désenclavement local, reposant sur la stratégie de localisation des Objectifs de Développement Durables (ODD) sur le territoire des 200 localités isolées identifiées à titre pilote pour l'expérimentation de cette approche d'accélération du développement. Il est aligné aux stratégies de la Mauritanie pour la réduction de la pauvreté par le développement socio-économique dans les zones rurales notamment, la SCAPP, le ProPEP, la contribution déterminée au niveau national (CDN), et l'Agenda Numérique national 2022-2025. Le programme contribue à l'Agenda 2030, notamment l'avancement des ODD 7, 8, 9 et 5 en particulier visant l'accès à une source durable d'énergie pour toutes les populations ; Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l'être humain, en mettant l'accent sur un accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d'équité ; et l'élimination des disparités d'égalité du genre, avec le Plan Stratégique 2022-2027 du PNUD, et sa stratégie d'accès durable à l'énergie.

DS OD

DS F

[1] Note : Le terme « *Partenaire de réalisation* » peut être compris également comme « *Partenaire de mise en œuvre* » ou « *Partenaire d'exécution* ».

Le PERZI s'étend sur cinq années, 2022-2026 avec un phasage progressif qui lui permettra d'engager à titre pilote le déploiement du dispositif sur 200 villages objet du présent document, avec une perspective de mise à l'échelle nationale. La première phase du projet a été sous la forme d'un plan conjoint d'investissement Gouvernement-PNUD pour 10 localités qui sont en phase d'électrification. La seconde phase capitalise sur les acquis de la phase 1 pour amplifier les impacts et les partenariats avec le secteur privé.

Le Programme est mis en œuvre par la Direction de l'Electricité et de la Maitrise de l'Energie (DEME), avec les appuis conseils techniques du PNUD, et de l'ensemble des acteurs et partenaires du secteur de l'énergie en Mauritanie. Un dispositif de coordination avec l'ensemble des secteurs ciblés par la portée du Programme sera mis en place, avec des délégations de maitrise d'ouvrage :*hydraulique, équipements, agriculture, élevage, transformation numérique et Innovations, santé, formation professionnelle.*

Effet contribuant (PNUAD/DPP, DPR ou DPM) :	**Total des ressources nécessaires :**		329,490,000
	Total des ressources allouées :		
		TRAC du PNUD :	2.500.000
		Donateur :	3.000.000
Produit(s) indicatif(s) avec marqueur genre[2] :G3		**Gouvernement :**	12.000.000
		Apports en nature :	
	À financer :		311 990 000

Approuvé par (signatures)[2] :

Gouvernement	PNUD	Gouvernement
Ministre de l'Economie et du Développement Durable **M. Abdessalam Ould MOHAMED SALEH**	*Représentant Résident* ***M. Mansour NDIAYE***	Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie ***M. Monsieur Nani CHROUGHA***
Nom en capitales :	Nom en capitales :	Nom en capitales :
Date : 15 AUG 2023	Date : 15 AUG 2023	Date :

[2] Note : Modifiez le bloc des signatures selon qu'il y a lieu

[2] Le marqueur genre mesure l'investissement du projet dans l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Choisir un marqueur par produit : G3 (l'égalité des sexes est un objectif principal); G2 (l'égalité des sexes est un objectif important); G1 (contribution limitée à l'égalité des sexes); G0 (pas de contribution à l'égalité des sexes)

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

I. I. PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT (1/4 DE PAGE A 2 PAGES)

« L'énergie est le fil d'or qui relie la croissance économique, l'augmentation de l'équité sociale, et un environnement qui permet au monde de prospérer. Le développement n'est pas possible sans
l'énergie, et le développement durable n'est pas possible sans énergie durable » ; Banki Moon.

1.1 Contexte National

La Mauritanie est un pays de plus d'1 million de Km2 avec une population de 4,4 millions d'habitants majoritairement concentrée dans la capitale Nouakchott, avec une économie axée sur le secteur primaire. Couvrant le sahel de part et d'autre, le pays dispose d'une large ouverture sur l'Atlantique avec plus de 900 KM de cote, d'un potentiel pastoral estimé à environs 30 millions de têtes de bétail, et de grandes potentialités en terres arables.

Dans ce contexte, géographique a faible densité de population d'environ 4 personnes par kilomètre carre, les zones périurbaines notamment sont fortement enclavées par le désert, jouissant d'une faible desserte par les services sociaux de base, et les opportunités économiques. Cette situation laisse ainsi dans la précarité une large frange de la population des régions du pays qui connait des conditions extrêmes d'exposition aux aléas climatiques qui affectent fortement leur capacité de production locale et accentue la pauvreté et la dépendance extérieure de ces populations.

DS OD

D'où un indice de fragilité accru qui focalise les priorités des politiques publiques visant à accélérer le désenclavement physique et économique des régions de la Mauritanie pour impulser un cycle vertueux de développement. Dans cette perspective, le développement local intégré est au cœur de la politique gouvernementale d'accélération des ODD à travers le Programme Elargi du Président de la République qui vise à consolider le développement du pays en misant sur des accélérateurs de transformation. Au titre des accélérateurs de transformation identifiés par l'Etat Mauritanien, la transition numérique, la desserte énergétique des villages les plus isolés, et la modernisation de l'administration sont au centre des priorités.

DS F

Dans le cadre de la transition numérique, des avances importantes ont été réalisées depuis 2021, permettant de mettre en place des câbles à fibre optique couvrant à ce jour 40% du territoire, avec une poussée de plus en plus forte vers les zones physiquement enclavées. En perspective de l'opérationnalisation de la priorité de désenclavement énergétique, et l'accélération de la déserte numérique pour un meilleur accès des populations mauritaniennes aux services de l'Etat, et aux opportunités de développement économique, le gouvernement envisage le pilotage d'un modèle de convergence des interventions dans 200 localités isolées de quatre régions : Hodh EChargui, Hodh Egarbi, Assaba, Gorgol.

Au cours de la dernière décennie, l'économie mauritanienne a connu une forte croissance et une réduction significative de la pauvreté. La croissance a été tirée par les industries d'extraction minières, en particulier les mines d'or et de minerais - en moyenne, le secteur a contribué à 25 % du PIB, 82 % des exportations et 23 % des revenus intérieurs entre 2003 et 2013. Les gisements de gaz naturel en mer récemment découverts sont un autre développement prometteur. En 2017, le taux de croissance du PIB était de 3.6 %, et la croissance devrait atteindre 4.6 % en 2018. La dépendance de la Mauritanie à l'égard de ses ressources extractives et minières rend l'économie sensible à la volatilité des prix des produits de base. De grands investissements sont en cours visant l'accélération de la transformation structurelle de l'économie mauritanienne pour générer une croissance durable, partagée par toute la population et toutes les régions.

Dans ce cadre notamment le Programme Elargi du Président (PROPEP) consacre la priorité au désenclavement à travers des infrastructures numériques, économiques et électriques. Dans le

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

prolongement de la SCAPP et au titre de l'ODD 7, l'État mauritanien vise l'accès universel de l'électricité à l'horizon 2030, avec des objectifs d'étape en 2020 de 95% et 40% des ménages ayant accès à l'électricité en milieux urbain et rural, respectivement et à coût abordable et du PROPEP.

Le pays s'est doté en 2019 d'une stratégie en matière d'électrification visant : (i) l'atteinte d'une couverture globale en milieu urbain et le doublement du taux d'électrification en milieu rural à l'horizon 2024, l'accès universel au service d'électricité à l'horizon 2030 ; et (ii) la réduction substantielle du coût moyen de production de l'électricité en vue d'une baisse des tarifs. En outre, le Gouvernement s'est doté d'un code de l'électricité modernisé avec une composante traitant de la régulation des énergies renouvelables, et divers outils directeurs dont un plan directeur de l'électricité et un plan directeur pour l'électrification rurale.

L'ensemble de ce dispositif vise à réduire la fracture énergétique, en mettant à profit l'immense potentiel d'énergie renouvelable du pays qui est parmi les plus complets au monde. En effet classé deuxième plus grande réserve de gaz naturel au monde (4,7 milliards de pieds cubes par habitant) en 2022, avec l'une des plus grandes frontières côtières d'Afrique, abritant plus de 30 millions de têtes de bétail et la biodiversité marine la plus riche du monde, la Mauritanie a l'un des plus importants potentiels d'énergies renouvelables au monde. Le pays se positionne comme une plaque tournante mondiale pour la transition énergétique verte et un leader dans l'élevage et l'économie bleue pour favoriser une transformation économique rapide qui profite à plus de 4,4 millions de Mauritaniens.


DS OD

Le pays est en transition vers une industrialisation durable en s'appuyant sur l'exploitation durable de son vaste potentiel minier et le développement de ses ressources primaires tout en capitalisant sur une saine gouvernance macroéconomique. Sortir des énergies fossiles avec l'ambition de devenir un acteur majeur de la filière hydrogène d'ici 2043 , l'économie verte de la Mauritanie pourrait davantage tirer parti de l'agriculture et de l'élevage qui ont un énorme potentiel de transformation. Outre l'économie bleue, ces moteurs jettent les bases d'un tissu économique diversifié, qui s'appuie également sur l'Agenda national de transformation numérique en tant que catalyseur transversal pour accélérer une croissance inclusive et durable. Il convient de noter que l'expansion économique du pays au cours de la dernière décennie a été relativement favorable aux pauvres, avec une baisse du taux de pauvreté monétaire (30,9 % en 2014 à 28,2 % en 2019) et des inégalités (baisse de l'indice de Gini de 0,34 en 2014 à 0,32 en 2019).

DS F

En dépit de ces avancées, l'indice de pauvreté multidimensionnelle traduit des poches de fragilités particulièrement dans les zones rurales isolées, où vivent une part importante de la population.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

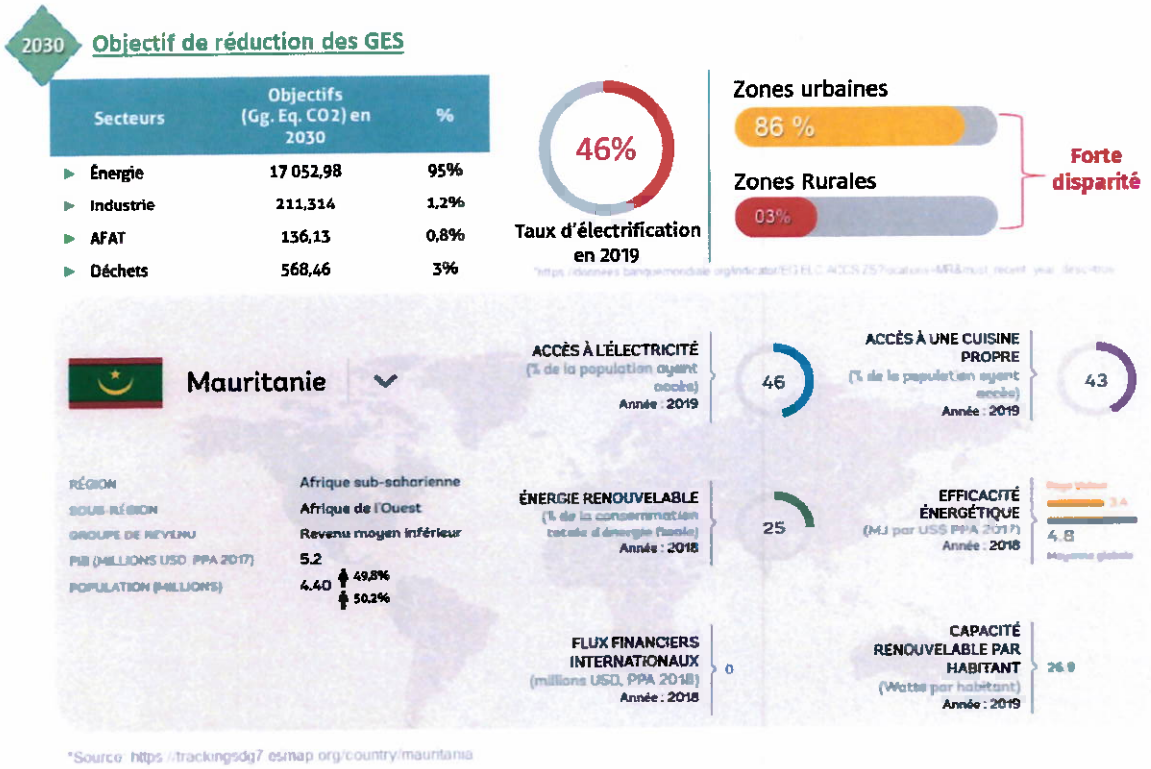

[3]*Illustration situation énergétique Mauritanie*

Tableau 1: Indicateurs Macroéconomiques et Sociaux



Population	4.4 millions
Population urbaine	60% of total
PIB	5 milliards USD
Taux de croissance du PIB	3.6%
RNB par habitant*	1,100 USD
Taux de chômage	10.2%
Taux d'électrification	46%
Taux de pauvreté	42% (2014)
Urbain	20.8%
Rurale	59.4%
Devise	Ouguiya (MRU)
Langue officielle	Français, Arabe
Ressources naturelle	Agriculture (élevage, pêche) ; hydrocarbures (pétrole) ; minerais (minerai de fer, or, cuivre)

[4]*Indicateurs Macroéconomiques et sociaux*

1.2 Contexte socio-économique, / Justification

Vulnérabilité économique et social persistante : La pauvreté, la tradition et le manque d'alternatives poussent les communautés et les individus à perpétuer des pratiques d'exploitation des ressources non durables (par exemple, abattre des arbustes qui conduisent à l'érosion des sols, brûler du fumier qui pourrait autrement être utilisé

[3] Illustration situation énergétique Mauritanie

[4] Indicateurs Macroéconomiques et sociaux

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

comme engrais). Le manque d'opportunités d'emploi et de solutions génératrices de revenus viables est à l'origine de l'exode rural. Il faudra prioriser les avantages sociaux et économiques des bénéficiaires (par exemple, la santé et les activités génératrices de revenus) et améliorer la gestion des ressources naturelles. Le programme adressera ces problèmes en fournissant des services énergétiques modernes pour promouvoir une meilleure qualité de vie et offrir des opportunités pour le développement d'activités économiques dans les zones ciblées.

Un manque d'accès à l'énergie. A ce jour, l'accès à l'électricité reste faible en Mauritanie, en dépit des ressources énergétiques dont jouit le pays, le taux d'électrification au niveau national de 43% avec une forte disparité entre les zones urbaines (72%) et rurales (10%)5. En Mauritanie, l'accès à l'énergie constitue un frein majeur au développement du pays et à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment en raison d'un certain nombres des défis dont : (i) le faible tissu économique local et l'inexistence de dynamiques économiques productives fortes, (ii) la qualité des services éducatifs, (iii) la fragilité des infrastructures sanitaires, (iv) l'isolement des localités non-électrifiées (manque d'accès internet) ; la rareté des ressources en eau, etc.

DS OD

Dans les Wilayas cibles (Hodh Elchargui, Hodh Elgarbi, Gorgo, Assaba), près de 91% des localités n'ont pas d'accès à l'électricité6. L'un des principaux obstacles au développement socio-économique de la Mauritanie demeure la situation énergétique du pays. Comme démontré plus haut, la Mauritanie a l'un des taux d'accès à l'électricité les plus bas au monde avec une disparité importante entre les zones urbaines avec 65% de la population urbaine ayant accès, contre seulement 10% dans les zones rurales. L'accès à l'électricité est un levier important pour la réduction de la pauvreté, en particulier pour les femmes et les jeunes ruraux qui sont principalement actifs dans les chaînes de valeur agricole. Par conséquent, l'amélioration de l'accès à l'électricité dans le pays est importante pour réduire la pauvreté, lutter contre les inégalités entre les sexes et de nombreuses autres formes d'exclusion (financière, etc.).

DS F

Vulnérabilité profonde face aux changements climatiques : La Mauritanie est l'un des pays les plus vulnérable aux effets des changements climatiques. Le pays connaît un déficit majeur en eaux de pluies, des cycles récurrents de sécheresse et une dégradation croissante des ressources naturelles. L'ensemble de ces facteurs réunis a affecté profondément les activités productives des populations qui s'adonnent pour la plupart à l'agriculture de subsistance. Par ailleurs cette situation milite pour une limitation de l'empreinte carbone, et une réelle adaptation des modes de planification, production et consommation dans une perspective de durabilité environnementale, de préservation des ressources naturelles et de transition énergétique écologique.

COVID-19 : Le pays comme le reste du monde a été fortement impacté par la pandémie de la COVID-19 sur le plan sanitaire et socio-économique engendrant une augmentation de la pauvreté avec une augmentation des taux de pauvreté de 5,4% à 6,3% entre 2019 et 2020 avant d'atteindre 6,4% en 2021[7]. Ainsi, ces impacts négatifs de COVID-19 sur l'économie ont eus des répercussions sur le marché du travail et sur les conditions de vie et le bien-être des populations. La vulnérabilité de la population rurale, qui est disproportionnellement plus pauvre que celle des zones urbaines, est encore aggravée par la pandémie car elle dépend principalement de l'agriculture de subsistance pour gagner sa vie.

[5] Source : Rapport de Mise en Œuvre de la SCAPP

[6] Source : Rapport Intermédiaire RIMDIR- Composante Energie- 201

[7] https://www.worldbank.org/en/country/mauritania/overview#1

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Manque de promotion et d'adoption des solutions d'énergies renouvelables: En l'absence d'expériences avec les solutions énergétiques renouvelables modernes, il est clair que de nombreuses parties prenantes sont peu conscientes des avantages que ces technologies peuvent apporter pour améliorer les conditions de vie en milieu rural. De plus, cette absence d'expérience signifie qu'il y a un manque total d'informations sur les meilleures pratiques et les leçons apprises dans d'autres pays, que ce soit au niveau local ou national.

Écarts entre les sexes dans l'accès à l'énergie : Certains projets d'infrastructure, tels que les projets d'électrification rurale, ne supposent pas que les filles et les femmes, les garçons et les hommes, ont des expériences différentes de manque d'énergie puisqu'ils bénéficieront apparemment également de l'intervention. Cependant, les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont des besoins et des exigences différents en matière d'infrastructures énergétiques. Par exemple, les femmes sont disproportionnellement responsables des tâches domestiques non rémunérées par rapport aux hommes, y compris l'approvisionnement en eau, en combustible et en bois de chauffage. Ils peuvent voyager en utilisant des moyens différents et à des moments différents. Ces différences peuvent conduire au harcèlement et à la violence basée sur le genre (VBG) contre les femmes et les filles si les considérations de genre ne sont pas intégrées dans la planification et la conception des infrastructures d'éclairage. Afin de mitiger ce risque, nous mettrons en exergue dans les propositions, démonstration et formations aux bénéficiaires, des usages ciblés pouvant être bénéfiques aux femmes dans leurs tâches et activités quotidiennes afin d'en faciliter l'adoption. Les femmes seront également impliquées et formées dans la maintenance du matériel afin de garantir leur autonomie et permettre ainsi de réduire les obstacles à l'origine des inégalités.

Par ailleurs, le déploiement de solutions énergétiques viables reste limité, en raison des risques inhérents au marché de l'électricité qui reste principalement basé sur des financements publics subsidiant le fonctionnement des quelques entreprises privées présentes dans le secteur de l'électrification rurale. Dans les zones hors réseau plus spécifiquement, les principaux obstacles et risques qui empêchent actuellement le déploiement efficace de solutions décentralisées d'énergie renouvelable telles que les mini-réseaux solaires par photovoltaïque avec stockage sont détaillés dans le tableau 1.

Table 1: Obstacles à l'augmentation des investissements du secteur privé dans les mini réseaux solaires photovoltaïques

Catégorie du risque	Description
Obstacles au marché de l'énergie	• la règlementation est défavorable au développement des minigrids, le modèle/cadre légal et institutionnel existant favorise l'investissement publique et la propriété gouvernementale est restrictif et entrave l'investissement du secteur privé dans les mini-réseaux. La plupart des mini-réseaux exploités par « les fermiers » n'ont pas réussi à exploiter suffisamment les utilisations productives. • Le statut juridique du secteur privé sur le marché de l'électrification rurale n'a pas été suffisamment clarifié, ce qui nuit à la bancabilité. Beaucoup de points d'ombre existent, en ce qui concerne la tarification, la gestion des licences, la mise à l'échelle, la coexistence avec le réseau, etc. • L'absence d'une stratégie spécifique d'électrification rurale désavantage les miniréseaux renouvelables, l'extension du réseau étant privilégiée. Le

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

	rôle des miniréseaux d'énergie propre n'est pas clair dans la structure du marché. • Les développeurs locaux ont une capacité et une expérience limitée en matière de technologique, de développement de plans d'affaires et de financement.
Risques pour les développeurs	• La disponibilité des données SIG publiques pour faciliter la prise de décision en matière d'investissement, de consommation ou de politique est limitée. • Des associations industrielles du secteur des mini-réseaux existent mais n'ont qu'une influence limitée pour faire du lobbying ou de la pression en faveur du changement. De plus elles sont peu outillées à jouer leur rôle pour le développement du marché.
Barrières Financières	• Il n'y a pas d'incitations fiscales pour les miniréseaux. • Les développeurs de miniréseaux solaires photovoltaïques n'ont pas accès au financement car les institutions financières locales ne comprennent pas les modèles d'affaires de miniréseaux, qu'elles considèrent risqués. Cette perception du risque freine les financements en faveur du secteur.
Risques liés à la main d'oeuvre	• Les acteurs du secteur public et privé manquent de capacités techniques lorsqu'il s'agit d'innovations technologiques et de modèles économiques dans le domaine des miniréseaux.
Barrières digitales/technologiques	• En matière de normes de qualité, le marché est caractérisé par des composants de qualité relativement médiocre. Ce manque d'assurance qualité au sein du marché nuit à la perception de tous les produits solaires. • Risque de paiement: Les fintechs et solutions de paiement digitales manquent sur le marché ce qui est obstacle d'accessibilité et de sécurisation de paiement surtout quand il s'agit de servir les populations rurales pauvres. • Faible pénétration et utilisation des outils numériques par les parties prenantes (DEME, SOMELEC, régulateur, développeurs de miniréseaux), etc..
Risque de non-paiement de l'utilisateur final	• Le cadre politique/réglementaire existant n'est pas propice à l'engagement des femmes et des jeunes entrepreneurs dans le secteur des énergies renouvelables et des mini-réseaux, et n'est pas orienté vers une meilleure utilisation du potentiel inexploité d'emplois verts et d'usages productifs. • Les associations de consommateurs existantes, en particulier les groupes de femmes les plus importants, ne connaissent pas bien ou ne sont pas familières avec les miniréseaux solaires comme solutions d'accès à l'électricité, ce qui crée un risque d'acceptation sociale pour les développeurs. • En raison d'événements climatiques extrêmes, la plupart des petits exploitants agricoles perdent leurs revenus et vendent parfois leurs biens. Cette vulnérabilité économique ne milite pas en faveur d'investissement dans le secteur surtout que lea probabilité du défaut de paiement est élevé.
Risque lié au matériel / hardware	• Des installations de mauvaise qualité peuvent saper la confiance du marché dans les minigrids solaires. L'absence de normes et

DS OD

DS F

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

	d'infrastructures de contrôle qualité nuit à la promotion des minigrids solaires.

- Face à l'ensemble de ces défis, la réalisation des objectifs énergétiques notamment pour la Mauritanie, suppose un modèle d'accélération qui favorisera le déploiement de solutions énergétiques adaptées au contexte national de faible densité de population et de type d'habitats clairsemés ; combiné avec un renforcement d'un cadre national de gouvernance énergétique favorable à une décentralisation de l'autorité de gestion électrique, et à la compétitivité à travers le secteur privé ; tout en encourageant la création d'un tissu économique local pour garantir la viabilité du modèle, dans une perspective de développement économique local.
- Dans ce cadre, le gouvernement a sollicité l'appui du PNUD pour la mise en place d'un dispositif favorable à l'exécution de cette vision dans un cadre intégré, concerté avec l'ensemble des acteurs et partenaires intervenant dans les secteurs de l'électrification rurale, de la modernisation numérique et la création d'opportunités économiques locales. Ainsi la présente proposition vise à l'établissement d'un Programme intégré d'Electrification des Zones Isolées (PERZI) . Ce programme consolide les acquis du Programme de promotion des Mini réseaux (Minigrids) conjointement conduit par le gouvernement, le Fonds pour l'Environnement Mondial (GEF) et le Fonds d'Abudabi, en étroite synergie avec les grands programmes d'électrification en cours à travers le RIMDIR.

1.3 Solutions et activités proposées

I. STRATEGIE (1/2 PAGE A 3 PAGES)

Une solution énergétique durable, visant les usages productifs pour le développement

Le PERZI vise à accélérer le développement économique local des communautés les plus isolées de la Mauritanie en favorisant leur accès à l'électricité et aux services productifs issus de l'énergie, notamment les technologies numériques, les services de santé, et les emplois productifs autour de l'agriculture et de l'élevage.

DS OD

Bâtissant sur la volonté nationale affichée à travers l'adoption en 2021 d'une stratégie nationale du numérique au service du développement, et la stratégie présidentielle de désenclavement et de desserte en électricité, le projet est construit autour de la théorie de changement suivant laquelle si les populations des zones isolées ont un accès à l'électricité et aux services numériques, alors elles disposeront d'opportunités accrues de développement économique, à travers un cadre favorable pour la production, la transformation grâce à l'énergie et l'écoulement de leur production locale, permettant l'essor du tissu économique local. Le modèle vise 200 localités isolées du pays, permettant d'initier une stratégie de désenclavement socio-économique pour près de 300,000 populations pauvres (60% de femmes).

DS F

Ainsi ces populations tireront profit de leur rapprochement virtuel (par internet) aves les communautés riveraines et urbaines, et pourront structurer des activités productives pérennes, tout en ayant un accès favorisé aux services de santé, d'éducation à distance, d'aide juridique notamment.

Spécifiquement le projet permettra la réalisation des résultats stratégiques ci-après :

- Le déficit énergétique est comblé dans 200 localités rurales, à travers l'accès à une source d'énergie propre, durable et à des coûts abordables pour les populations les plus pauvres ;
- Un cadre national de gouvernance des énergies renouvelables intégrant une perspective de transition énergétique durable est opérationnalisé,

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

- Les conditions sont mises en place pour la vitalisation socio-économique des localités isolées, permettant la création de revenus durables et le déploiement d'au moins _ catégories de services sociaux de base dont le numérique, pour plus de 300,000 habitants des communes rurales isolées, dont 60% de femmes.

De façon spécifique les interventions serviront à expérimenter un prototype de solutions intégrées alliant l'accès à une source d'énergie renouvelable, avec un bouquet de services numériques pour le développement de 200 localités isolées du pays. Le programme mettra en avant l'approche de portefeuille intégré de développement au service du désenclavement communautaire. Dans ce cadre un paquet de services connexes du programme pays seront déployés dans les localités pilotes du programme permettant ainsi d'élargir l'accès de ces populations aux services de justices, aux mécanismes de gouvernance participative, et aux infrastructures socio-productives telles que les points d'eau, les pistes, les parcs à bétail, les maraichages publics, etc.

DS OD

2.1 Théorie du Changement

DS F

La TdC, décrits sur la Figure 1 est basé sur un contexte de référence où le taux d'accès à l'énergie dans le pays est faible avec une inégalité flagrante entre le milieu urbain et rural, respectivement 72% et 10%. En dépit des efforts du gouvernement mauritanien avec des progrès notables en termes d'augmentation de l'accès à l'électricité, des obstacles et risques systémiques, tels que les lacunes en matière de capacités financières, sociales, politiques et réglementaires et techniques, entravent toujours la mise à l'échelle des minigrids solaires PV avec batteries dans le pays. Dans un souci d'efficacité et de durabilité, la TdC de ce Programme est alignée avec le Programme Africain de Minigrid (AMP), ainsi que le Programme « Desert to Power » respectivement porté par le PNUD et la BAD, sur financements du FEM.



Figure 2 : Théorie du changement

Aujourd'hui, les solutions énergétiques décentralisées sont essentielles pour consolider les efforts visant à combler les lacunes en matière d'accès à l'énergie. Les solutions innovantes hors-réseau - à savoir les mini-réseaux solaires d'énergie renouvelable offrent une alternative solide pour l'accès à l'électricité, la réduction de la pauvreté et la réduction des émissions de GES. Cependant, les risques

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

persistants entravent l'adoption massive des mini-réseaux d'énergie propre, notamment, des coûts de financement élevés ; des coûts matériels/logiciels élevés, reflétant les barrières du marché et une mauvaise conception du système ; et un manque d'innovation dans les modèles d'affaires, freinant la croissance des revenus pour les promoteurs. Lorsque ces risques d'investissement seront atténués grâce aux leviers de réduction des coûts et aux modèles d'affaires innovants du programme, il en résultera une compétitivité et une viabilité financière des minigrids d'énergie renouvelable.

Lorsque les minigrids solaires avec stockage deviendront plus compétitifs par rapport aux alternatives à base de diesel, ils attireront les investissements privés, ce qui entraînera divers avantages en termes de développement, tels que : l'augmentation des investissements, la réduction des émissions de GES, l'électrification rurale accrue pour les communautés rurales pauvres, la baisse des tarifs pour les utilisateurs finaux, etc. Il existe un potentiel important pour le déploiement de mini-réseaux en Mauritanie.

DS
OD

Par conséquent, ce projet s'attaquera au manque d'accès à l'énergie par une série d'interventions intégrées à travers trois (3) composantes clés:

DS
F

Composante 1: Introduction de solutions innovantes de production d'énergie propre à travers les centrales solaires isolées (mini-grids). Cette composante permettra deux résultats spécifiques :

a. Déployer et expérimenter une nouvelle génération d'équipements adaptés au contexte de l'habitat rural en Mauritanie, couvrant ainsi le risque lié à l'innovation par l'introduction d'une nouvelle gamme de produit sur le marché ;
b. Identifier des modèles de gestion optimaux garantissant une place au secteur privé comme partenaire financier pour le cofinancement de la distribution d'électricité, et la création des petites et moyennes entreprises.
c. .

Composante 2: Renforcement des capacités institutionnelles, opérationnelles et techniques des institutions publiques portant sur le cadre règlementaire et de l'investissement privé dans l'électrification rurale Dans ce cadre notamment le code de l'électricité, le code des investissements, la législation Partenariat Public Privé, ainsi que les capacités de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de production et de distribution de l'électricité.

Composante 3: Accélération du développement d'une économie locale basée sur la transformation des produits agropastoraux notamment, dans une logique de filières vertes, permettant d'améliorer les revenus des populations locales, tout en facilitant l'accès aux services sociaux de base notamment la santé et l'accès à l'eau pour les populations. Cette composante spécifique fera l'objet d'une étude de faisabilité visant l'identification des besoins des localités ciblées par le programme, issue d'un croisement entre les plans directeurs en place dans l'administration, et la réalité des besoins sur le terrain. Cette analyse fera ainsi ressortir le gap d'investissements clés dans les domaines ci après : infrastructure numérique, santé, routes et voies d'accès, hydraulique, élevage, agriculture, formation professionnelle et environnement. Cette analyse sera complétée par un plan d'exécution et un budget détaillé permettant le déploiement des infrastructures socio-économiques de développement local dans suivant une feuille de route établit.

Les résultats spécifiques du programme sous chacune de ces trois composantes sont conçus pour cibler systématiquement les risques actuels d'investissement pour la mise à l'échelle des mini-réseaux d'énergie renouvelable en Mauritanie. Cette stratégie est appropriée au contexte de la Mauritanie où plusieurs risques d'investissement des miniréseaux d'énergie renouvelable empêchent l'augmentation

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

des investissements privés, la réduction des émissions de GES, les progrès vers l'ODD7 et l'amélioration des moyens de subsistance.

Le programme PERZI puisera sur le Projet Régional African Minigrids du PNUD en cours de mise en œuvre dans 27 pays pour favoriser le partage des connaissances, l'apprentissage et la synthèse des expériences de manière multidirectionnelle. Le projet AMP qui est en cours d'élaboration pour une mise en œuvre en Mauritanie en 2023 pourra s'appuyer sur les acquis du présent programme.

2.3 Stratégie de mise en oeuvre

Le Programme déploie une approche systémique pour augmenter l'accès à l'électricité dans les communautés hors-réseau en utilisant des minigrids solaires Photo-Voltaïques (PV) avec stockage. Le projet soutiendra le déploiement de modèles d'affaires innovants en mettant l'accent sur la réduction des coûts des minigrids solaires photovoltaïques notamment l'agrégation de la demande à travers un focus sur l'usage productif. L'objectif global est d'augmenter la compétitivité commerciale et la viabilité financière des minigrids solaires PV avec stockage grâce à leur intégration dans les chaines de valeur productives (agriculture, pêche, élevage, PME, PMI, etc.) ; d'augmenter l'accessibilité financière de l'électricité renouvelable pour les utilisateurs finaux. Le Programme mettra l'accent - et cherchera à développer des avantages comparatifs - dans trois domaines clés qui représentent des opportunités à exploiter, notamment, (dialogue national sur les modèles d'affaire, la prise en compte de l'usage productif et l'intégration de l'innovation numérique).

DS OD

Sur la base du contexte ci-dessus et des discussions menées lors de la formulation, le programme permettra:

DS F

- D'opérationnaliser les différentes solutions d'énergies renouvelables (mini- et micro-réseaux conteneurisés, systèmes solaires domestiques, etc.).
- Soutenir la stratégie du Gouvernement mauritanien à travers le MPME pour un nouveau paradigme de développement communautaire plus robuste et d'un cadre de collaboration plus favorable à l'accélération de la croissance économique rurale tout avec plus d'implication / d'investissement du secteur privé.
- Développer des activités génératrices de revenus dans les communautés cibles, soutenues par des solutions d'énergie renouvelable à des fins productives qui constitueront de nouvelles sources de revenus pour les populations locales (en particulier les femmes et les jeunes) et contribueront à leur résilience et à leur développement socio-économique.
- D'introduire la digitalisation à travers l'internet et la technologie de paiement à tempérament, Pay-as-you-go (PAYG).

Le choix technologique est porté sur des solutions énergétiques innovantes tels que les mini-réseaux photovoltaïques conteneurisés. Néanmoins, dans certaines localités à faible densité de population, des kits solaires pourraient être privilégiés. Le secteur privé national sera un acteur clé dès le début du projet et tout au long de sa mise en œuvre. Le privé local sera mis à contribution pour assurer la pérennité des infrastructures et aussi introduire un nouveau modèle d'affaire en termes de viabilité commerciale des minigrids.

Modèle de déploiement des minigrids en Mauritanie Le PERZI introduira une évolution de paradigme en matière de transition énergétique durable, particulièrement lié à la gestion des mini centrales isolées en terme de maintenance et de facturation, permettant de transitionner progressivement d'un modèle de gestion basé sur les subventions et la location vente (affermage), à un modèle où les

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

opérateurs privés pourront prendre en charge l'achat, l'installation et la gestion des centrales dans un cadre régulé par l'Etat

Comme le marché des minigrids en Mauritanie n'est pas encore très développé, les aspects clés des modèles de déploiement et d'affaire ne sont pas bien définis. Le Tableau 3 ci-dessous fournit un résumé de l'état actuel des aspects clés des modèles de livraison des mini-réseaux en Mauritanie et des possibles interventions/altérations pendant le programme.

DS
OD

DS
F

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Table 3 : Comparaison des modèles de déploiement de minigrids solaires avec stockage

Eléments d'électrification rural	Situation actuelle	PERZI	Standards	Commentaires
Model de gestion	100% financé par l'Etat	100% financé par l'Etat et ses partenaires (fonds public dans un premier temps)	Cofinancement, mix d'investissements publics et privés (80-20)	Actuellement, tous les miniréseaux existants sont financés par les fonds publiques du Gouvernement ou de bailleurs. Le GoM subventionne à 100% les opérateurs en ce moment pour leur permettre de maintenir leurs services. Dans le cadre du PERZI une incitation sera explorée à travers les usages productifs
Modele de propriété	Propriété de l'Etat	Propriété de l'Etat dans un premier temps	Propriété du secteur privé	Actuellement, tous les miniréseaux existants sont propriétés du Gouvernement. La mise en œuvre GoBF est cependant prêt à explorer des modèles alternatifs impliquant le secteur privé comme propriétaire et/ou opérateur des mini-réseaux.
Exploitations	Communautaire	Secteur Privé	Secteur Privé	Actuellement, tous les miniréseaux existants sont exploités par des « fermiers » qui, dans la pratique, comprennent des membres de la communauté ayant une expertise technique et financière limitée.
Opex	Gouvernement	Secteur Privé	Secteur Privé	100% subvention du gouvernement
Capex	Gouvernement	Secteur Privé	Secteur Privé	100% subvention du gouvernement
Business Model	Centré sur les ménages	Centré sur PUE	Centré sur PUE	Le GoM subventionne à 100% les opérateurs en ce moment pour leur permettre de maintenir leurs services. Dans le cadre du PERZIune autre incitation sera explorée à travers les usages productifs

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Tariffs	Subventions suivant la règlementation	Suivant la règlementation, Identification d'un modèle optima	Exploration de nouveaux tariffs	At the moment, the minigrid tariffs are capped and too low to be cost-reflective, which deters private sector investments in the sector. The GoM has not expressed its willingness to revise its current tariff model. However, with the pilot focusing on productive end-users, it can provide the evidence to consider a change to the current tariff system .
Technology	1ere generation de mini centrales	4eme[h] generation de mni centrales et dernière génération de dispositif hors réseaux (solutions conteneurisées)	4eme[h] generation de mni centrales et dernière génération de dispositif hors réseaux (solutions conteneurisées)	

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Le processus de décision autour de l'identification d'un modèle de déploiement de minigrids (cadre règlementaire) est complexe et doit idéalement se faire à travers un dialogue inclusif et participatif impliquant toutes les parties prenantes concernées à des degrés divers afin d'établir un consensus national sur la base duquel le déploiement à grande échelle des mini-réseaux peut être accéléré. En considèrent cet état de cause, le PERZIpermettra l'identification d'un cadre optimal de promotion des mini-centrales solaires

Promotion du numérique /du digital : La numérisation représente une opportunité clé pour la promotion de l'électrification hors-réseau en Mauritanie et sera mise à profit dans ce programme. Les technologies et solutions numériques sont fondamentales pour permettre l'électrification hors réseau. Cependant, peu de données sont disponibles sur l'utilisation de la numérisation dans le secteur de l'électricité hors réseau en Mauritanie, ce qui souligne la nécessité de démontrer des approches innovantes dans ce domaine qui pourraient être reproduites par d'autres projets de mini-réseaux existants ou prévus dans le pays. Le numérique est un thème transversal dans ce projet, s'appliquant à toutes ses composantes.

2.4 Description du Projet

DS OD

Le projet consiste à mettre l'accès à l'électricité durable et abordable au cœur de l'approche du Gouvernement Mauritanien pour améliorer les conditions de vie des populations en zone rurale. Véritables vecteurs de développement, les solutions énergétiques renouvelables ont connu des évolutions technologiques considérables ces dernières années, grâce entre autres aux nombreuses initiatives nées des ODD fixées par l'ONU et principalement l'objectif 7 : « Energie Propre à un coût abordable » qui a permis le développement de produits et solutions diverses, abordables et adaptées aux besoins des populations, et principalement des populations pauvres vivant en milieu rural.

DS F

Le Programme permettra d'opérationnaliser une approche de planification basée sur l'interdépendance des solutions de développement aux populations d'un emême localité, favorisant la localisation des ODD, et l'accélération du désenclavement de ces zones. Le PERZI est en phase avec plusieurs autres ODDs tels que : (i) ODD13 : Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts; (ii) ODD5 : Assurer l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles; (iii) Et les ODD 1, OD2, SDG3, ODD4, ODD6, ODD8, ODD9, OD10, ODD11, et ODD12.

Ainsi, leprogramme s'appuie sur diverses innovations technologiques et techniques (modèles d'affaires) des solutions énergétiques solaires hors réseau, pour créer des conditions propices au développement des activités productives (agriculture, élevage, pêche) et de l'entreprenariat, des besoins communautaires, etc.

Les cibles et acteurs principaux du programmeseront les petits agriculteurs (principalement les femmes et les jeunes), les micros et petites entreprises qui bénéficieront directement de l'électricité fournie par les mini-réseaux solaires conteneurisés innovants. L'activité principale dans les villages cibles est l'agriculture et l'élevage. Le manque d'accès à une énergie durable et abordable est une raison majeure de leur vulnérabilité économique. Par exemple, cela se traduit par des pertes après récolte élevées dans les chaînes de valeur telles que l'agriculture l'élévage, etc. En se concentrant sur le segment des usages productifs, il est plus probable que toute la capacité de production des mini-réseaux sera utilisée dès le premier jour de fonctionnement, ce qui va prouver un nouveau modèle commercial pour le secteur privé local. La technologie choisie pour le PERZI sera l'énergie solaire photovoltaïque avec stockage, avec la démonstration de systèmes **clés en main innovants tels que les systèmes conteneurisés**, ainsi que **divers modèles commerciaux innovants**, qui ont été utilisés avec succès dans d'autres pays.

Précisément, il s'agit d'introduire un système solaire hors-réseau dernière génération de 20kWp dans 200Deux cent localités cibles des Willaya de Hodh el Chragui, Hod El Gharbi, Gorgol, Assaba pour constituer

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

une véritable plateforme/hub d'affaires pour toute la communauté. Car, au-delà de promouvoir l'innovation technologique, le PERZI va essentiellement encourager les usages productifs possibles pour améliorer les moyens de subsistance.

In fine, le pilote jouera un rôle avant-gardiste en introduisant en Mauritanie non-seulement des solutions technologiques innovantes mais aussi des modèles d'affaires viables basés sur une meilleure implication du secteur privé. A cet effet, le projet pilote comprend 4 composantes majeures, notamment :

- **Composante 1 : Innovation technologique et modèles d'affaires**
- Considérée comme l'élément principal du projet pilote, cette composante vise à démontrer les innovations en matière de solutions hors-réseaux et de modèles d'affaires en mettant l'accent sur les usages productives et l'implication du secteur privé local. Ainsi, elle consistera à la fourniture et l'installation des solutions d'électrification hors-réseau innovantes i.e. systèmes conteneurisés et autres solutions hors-réseau pour les usages productifs et communautaires. Chaque système fournira l'électricité et sera doté d'éléments d'usages productifs.

DS OD

- Le besoin d'électrification des ménages sera traité au cas par cas et seulement après la prise en compte complète des usages productifs et communautaires. Par contre les kits solaires communément appelé solar home systèmes (SHS) seront mis à disposition des ménages à travers un système de location ou d'achat communautaire.

DS F

- **Composante 2 : Appui au cadre politique, institutionnel et politique**
- Le projet pilote devra permettre à travers cette composante de tester différents instruments qui pourront servir de base pour un dialogue national inclusif autour du modèle de gestion et de déploiement des mini-réseaux en Mauritanie. Il sera surtout un élément important suite à l'étude de faisabilité en cours qui identifie certaines barrières en termes de cadre politique et règlementaire et avancent des conditions et recommandations afin de permettre à la Mauritanie d'aller vers une mise à l'échelle des mini-réseaux verts dans sa volonté d'atteindre l'accès universel en 2030. Cette composante comprend la formation et l'encadrement de différentes parties prenantes surtout les bénéficiaires et décideurs politiques. Ainsi, dès l'entame du projet une visite d'étude peut se tenir en Tanzanie ou au Rwanda pour permettre à différentes parties prenantes de la Mauritanie de mieux cerner les contours des innovations technologiques et techniques. Elle capitalisera sur les expériences du programme AMP en cours dans 27 pays sur les défis et les solutions idoines.

- **Composante 3 : Le développement du tissu économique local**

Ainsi, ce projet pilote promouvra ces technologies innovantes pour la production d'énergie couplée à des équipements de production tels que des broyeurs, des moulins, des presses à huile, des séchoirs, des pompes à eau, une chaîne du froid pour les ménages, les microentreprises, les coopératives rurales (agriculture et eau), les installations sanitaires rurales. Cela permettra donc de développer des activités productives autour des mini-réseaux conteneurisés, d'accroître la résilience et compétitivité économique des populations rurales, de renforcer l'efficacité de la transformation agroalimentaire et de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en promouvant l'équité entre les sexes.

II. RESULTATS ET PARTENARIATS (1 PAGE ½ A 5 PAGES)

Résultats escomptés

Le PERZI contribuera au développement socio-économique et à la résilience des communautés cibles à travers un accès fiable et durable aux solutions innovantes d'électrification hors-réseau en Mauritanie. Trois composantes/résultats ont été développés afin de mettre à l'échelle les mini-réseaux solaires photovoltaïques sur la base de leviers de réduction des coûts, tout en intégrant simultanément les mini-réseaux renouvelables dans la chaîne de valeur agricole pour des utilisations énergétiques productives et l'ajout de valeur des produits locaux à travers l'accès à l'électricité renouvelable. Les activités proposées dans le cadre des quatre résultats du projet viseront à: (1) proposer des approches de modèles commerciaux

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

innovants couplés à des leviers de réduction des coûts pour renforcer la participation du secteur privé dans le développement des mini-réseaux solaires photovoltaïques afin de maximiser les impacts sur les ODD (2)renforcer les capacités de divers acteurs étatiques et non-étatiques afin de rendre les investissements plus pérennes et assoir une économie rurale émergente et prospère tout en adressant les obstacles politiques, réglementaires et institutionnels pour promouvoir les investissements du secteur privé dans les mini-réseaux solaires à l'échelle ; (3) ; (3) Accompagner l'amélioration de l'accès aux infrastructures et équipements socio-économiques de base (pistes rurales, internet, santé, espaces agropastoral et eau); aux équipements de production et de transformation ; la réduction des disparités de bien-être socio-économique entre les communautés rurales et urbaines ; la réduction de la charge de travail des femmes et des filles.

.

Impacts et résultats attendus du Projet

L'implémentation de ce projet aura plusieurs impacts qualitatifs et quantitatifs positifs :

DS OD

1. Augmentation les moyens de subsistance des populations, contribuant ainsi à leur résilience aux effets du changement climatique par le développement d'activités productives soutenues par les infrastructures énergétiques, en ciblant en particulier les femmes et les jeunes en tant que parties prenantes clés.
2. Fourniture l'accès à l'eau potable.

DS F

3. La réduction de la pauvreté et amélioration de la qualité de vie : cet impact est attendu à travers la création d'emplois directement et indirectement liés à la fourniture d'électricité et à travers l'augmentation des cycles économiques locaux.
   La création d'emplois et le développement d'opportunités économiques pour les communautés dans les zones ciblées : la création de conditions favorables au développement d'opportunités d'emploi pour les jeunes sera une alternative à l'exode rural et à la migration irrégulière, basée sur la transformation de la production locale par des moyens / techniques de transformation utilisant les énergies renouvelables.
4. La réduction des émissions de CO2 : cet impact est attendu grâce à l'application de technologies d'énergie propre (solaire PV) remplaçant l'utilisation de générateurs carburant/diesel.
5. L'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes : les femmes qui bénéficient de l'accès à l'électricité devraient être impactées sous forme d'amélioration de la sécurité (grâce à l'éclairage public), des télécommunications et de l'information (chargement des téléphones portables et utilisation de la télévision/radio à la maison), une charge physique réduite (par exemple grâce à des pompes électriques solaires pour un meilleur accès à l'eau potable) et de nouvelles et meilleures opportunités économiques.
6. L'amélioration des conditions sanitaires : l'amélioration des conditions sanitaires des populations rurales est attendue à travers l'utilisation de l'éclairage électrique et de la réfrigération des vaccins et autres produits pharmaceutiques et sanitaires nécessitant une chaîne du froid dans les centres de santé ruraux ou les postes vétérinaires ruraux, ainsi que des informations sur la santé (télévision/radio).
7. L'amélioration des conditions d'éducation et d'apprentissage : l'amélioration des conditions d'éducation est attendue grâce à l'utilisation de l'éclairage électrique et du matériel didactique électrique dans les écoles, et l'allongement du temps d'étude des écoliers, ainsi que l'accès à l'information (Internet, TV, radio).

Ressources nécessaires pour obtenir les résultats escomptés

- *Décrivez les ressources nécessaires pour obtenir les résultats escomptés. Compte tenu de la voie de changement retenue dans votre ToC, indiquez les principaux intrants (ressources humaines, achats, partenariats, etc.) requis pour assurer l'obtention des produits. Doit figurer parmi ces intrants le temps du personnel du PNUD (au niveau du pays, de la région ou du siège), qu'il faut estimer, chiffrer et inclure dans le budget du projet.*

Partenariats

Le PERZI de par la transversalité dans ses interventions, repose non-seulement sur les acquis de projets et initiatives antérieures, notamment les interventions menées dans le cadre du plan d'investissement

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

prioritaire dans l'électrification rurale, qui est un modèle pilote exécuté sur 30 villages dans le cadre du partenariat Gouvernement-PNUD. Le programme reposera également sur les partenariats stratégiques afin d'assurer une mise en œuvre réussie et sa durabilité. Ainsi, plusieurs parties prenantes de l'écosystème du secteur de l'énergie et au-delà ont été identifiées comme partenaires, en phase avec l'intention du projet de travailler de manière coordonnée avec les acteurs du gouvernement, du secteur privé et de la société civile, y compris les autres PTF. Notamment, les partenaires les plus en vue ou qui ont déjà des interventions susceptibles d'intégrer la philosophie du projet pilote sont :

- Les membres du gouvernement, à travers l'ensemble des ministères, particulièrement ceux-ci après : Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie, Ministère en charge de l'Economie, **Ministère en charge de l'Emploi et de la formation professionnelle, *Ministère de la Transformation Numérique, de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation, Ministère en charge de l'Agriculture, Ministère en charge de l'élevage, Ministère en genre de l'égalité du genre, Ministère en charge des routes, ministère en charge de l'hydraulique, Ministère en charge de la santé, Ministère en charge de l'Environnement, etc***
- Gouverneur de région
- L'Association des maires,
- Les partenaires techniques et financiers notamment, l'Union Européenne, la Coopération Espagnole, la Coopération Française, Banque Mondiale
- L'Ambassade Américaine
- JICA
- Coopération allemande
- L'USAID
- LA GIZ
- LA BAD
- LA BID
- CWP
- LE FIDA
- Les fondations

Risques et hypothèses

Il n'y a pas projet sans risques. De nombreux éléments, tant internes qu'externes au projet, peuvent avoir un impact sur la réalisation de ses objectifs. Il est donc essentiel de pouvoir les analyser et de développer au préalable une approche pour gérer tous les risques potentiels.

L'un des risques majeurs, reste la pandémie de la COVID-19, qui affecte tous les aspects de la mise en œuvre. L'évolution de la pandémie peut constituer un risque majeur au niveau opérationnel (impact sur la logistique nationale et mondiale, augmentation des prix, etc. Au niveau du projet pilote, les risques pourraient être liés à des retards ou à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à une disponibilité limitée des équipes de mise en œuvre pour cause de maladie ou de restrictions, à des impacts plus larges en termes de temps et de coût de la mise en conformité avec la norme COVID-19 pour le projet, et à une capacité de paiement réduite des consommateurs du minigrid en raison des impacts économiques négatifs de la pandémie. Ces risques seront réévalués au stade de la mise en œuvre et des plans d'urgence seront élaborés si nécessaire, par exemple pour programmer les achats de manière à minimiser les perturbations et identifier des alternatives lorsque le projet est confronté à des goulots d'étranglement. Le devoir de diligence des membres de l'équipe du projet, des travailleurs et des communautés cibles sera également assuré.

Par ailleurs, COVID-19, représente également une opportunité pour le projet, car il permettra de renforcer la résilience des infrastructures de santé et de la population rurale par un accès accru à une électricité propre, abordable et fiable. La stratégie de ce projet soutiendra la riposte et la relance de COVID-19 du gouvernement Mauritanien en renforçant la résilience des populations vulnérables et des installations de santé par la fourniture d'énergie durable et d'activités génératrices de revenus dans le cadre du résultat 2.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Plus précisément, les projets pilotes cibleront les secteurs de l'eau, de l'agriculture, des petites et moyennes entreprises, des structures communautaires (centres de santé, écoles, etc.).

Dans le cadre de la gestion des risques du PNUD, une stratégie de gestion des risques est élaborée au début de chaque projet afin de s'assurer que des procédures sont appliquées pour identifier, évaluer et hiérarchiser les risques, planifier et mettre en œuvre des réponses appropriées et communiquer en temps opportun. L'équipe de projet travaillera avec les principales parties prenantes dans le cadre de la stratégie de gestion des risques.

Le succès du projet repose sur les hypothèses clés suivantes :

DS OD

- Les parties prenantes s'approprient le projet et restent impliquées aux niveaux national, local et international.
- La situation sécuritaire et sanitaire en Mauritanie ne se détériorera pas davantage au point de rendre impossible la mise en œuvre des activités du projet.
- La DEME reste engagée dans le projet et soutient toutes les activités telles que l'identification des sites pour les projets pilotes, l'obtention des permis et l'approbation, la disponibilité du personnel, le cofinancement, etc.

DS F

- Il y a suffisamment d'entreprises du secteur privé qui peuvent participer aux appels d'offres pour les projets pilotes.
- Les autres partenaires potentiels acceptent de mettre les ressources à disposition pour compléter les fonds catalytiques du PNUD.
- Les communautés cibles acceptent de faire partie du projet.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Tableau de mitigation des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Disponibilité des fonds	Bas	Élevé	Le PNUD a confirmé la disponibilité de fonds pour ce pilote. Et le ministère a aussi montré sa volonté à contribuer, si nécessaire.
Financement Limité	Bas	Bas	Ce projet pilote est la meilleure approche comme réponse à ce risque car il promeut des technologies abordables et de qualité.
Retard dans la livraison des équipements	Élevé	Élevé	Suivi régulier et contact direct avec le fournisseur qui sera retenu suite à l'appel d'offre
Manque de soutien de la part des communautés locales	Bas	Élevé	La mobilisation communautaire et l'implication de la population tout au long du processus.
Manque d'intérêt du secteur privé	Bas	Élevé	Consultation avec le secteur privé local dès la phase de conception du projet ; Plaidoyer pour une plus grande implication du secteur privé dans la préparation de la deuxième phase du projet.
Variation importante du coût des matériaux au cours du projet	Bas	Moyen	Inclusion des imprévus dans le budget prévisionnel.
Durée des procédures de dédouanement	Moyen	Moyen	Envoi des documents nécessaires en temps voulu ; Soutien des partenaires gouvernementaux locaux.
Manque de revenus pour couvrir l'O&M	Bas	Moyen	Double source de revenus : activités d'utilisation productive et PAYG pour les ménages
Problèmes technologiques et de maintenance	Bas	Élevé	Deux opérateurs formés par système, un monitoring à distance installé, et l'équipe de techniciens présents en dans les localités familiarisées avec la technologie
Manque de compétences commerciales	Moyen	Moyen	Le partage des revenus mis en place garantit l'adhésion du prestataire retenu pour aider au développement de l'activité.
Problèmes politiques	Bas	Élevé	L'implication du PNUD et des autorités du district peut aider à atténuer.
Vandalisme ou vol	Bas	Bas	Conteneur métallique robuste avec cadenas, deux gestionnaires présents pendant la journée, gardien la nuit
COVID-19	Bas	Moyen	L'implication du PNUD et du MPME assurera que les directives nationales sont suivies

Implication des parties prenantes

La stratégie de mise en œuvre du projet prévoit une participation inclusive des parties prenantes à tous les niveaux. Un plan d'engagement des parties prenantes sera élaboré au démarrage du projet. À un niveau général, la participation et la représentation des parties prenantes seront assurées par la structure de gouvernance et les mécanismes de coordination (comité de gestion, cadre de concertation, etc.) qui seront mis en place par le projet, et par les structures existantes aux niveaux national, municipal et villageois/communautaire. Les parties prenantes seront consultées et impliquées dans le projet, du début jusqu'à l'évaluation finale du projet, afin de garantir leur adhésion, appropriation et apprentissage dans un souci de d'efficacité et de durabilité. Plusieurs méthodes d'engagement seront utilisées, notamment des réunions au niveau national et communautaire, la radio, les messages télévisés et les réseaux sociaux. Pour garantir l'inclusion, les messages seront traduits et diffusés dans les langues locales appropriées. Les parties prenantes participeront à l'atelier national de lancement ainsi qu'aux réunions au niveau communautaire, notamment dans le cadre de l'installation des infrastructures sous la composante 2 où des activités de mobilisation communautaire seront nécessaires avant le début des travaux. Plusieurs types d'acteurs seront particulièrement impliqués afin de garantir la pleine participation des bénéficiaires au projet, notamment ceux représentant les groupes vulnérables et marginalisés.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Bénéficiaires

Il y a trois catégories de bénéficiaires qui vont profiter de ce projet.

☞ **Micro et petites entreprises et usagers productifs**

Chacun des systèmes installés va bénéficier à plusieurs usagers productifs qui embaucheront des hommes, femmes et jeunes. En plus chaque système sera géré par 3 personnes dont au moins une femme et un homme seront embauchés qui recevront une formation de deux jours afin d'acquérir les compétences techniques, comptables et commerciales nécessaires.

Avec chaque système, au moins deux activités d'usage productive seront mises en œuvre, impliquant au moins deux micros ou petite entreprise locale qui impliquera trois personnes.

Les activités économiques comme l'exhaure de l'eau et l'irrigation des espaces agricoles, les enclos de bétails, la conservation du lait, etc. en plus des petites entreprises (menuisiers, coiffeurs, internet ou vidéoclubs, etc.).

☞ **Usagers Communautaires (centre de santé, écoles, mosquées et structures administratives)**

Parmi les bénéficiaires de l'électricité et de l'eau potable issues des systèmes hors-réseaux sont les infrastructures communautaires qui seront utilisés par la population. Il appartient au ministère de décider si les institutions doivent payer pour ces services ou les obtenir gratuitement.

DS OD

☞ **Ménages**

Chaque système fournira un accès à l'eau potable et à l'énergie renouvelable par le biais de packs de batteries aux ménages de la zone cible dans une configuration pay-as-you-go (PAYG).

DS F

Coopération Sud-Sud et triangulaire

Le projet s'appuiera sur l'expérience et les enseignements tirés des pays africains dont le marché des mini-grid est plus mature. Par exemple, dans le cadre des composantes 1, 2, 3 et 4, les expériences du Mali, du Sénégal, du Nigeria et des pays d'Afrique de l'Est tels que le Rwanda et la Tanzanie, seront mis à profit. Des transferts de connaissances, des voyages d'étude et des formations seront organisés. Le projet offrira en outre des possibilités de coopération régionale avec les pays qui mettent en œuvre des initiatives sur les mini-grids et de développement communautaire dans des contextes géopolitiques, sociaux et environnementaux pertinents ou similaires.

Connaissance

En Mauritanie, l'évaluation finale du Mini-grid financé sur ressources conjointes du FEM et du PNUD a montré qu'en apportant des investissements innovants dans le secteur des énergies renouvelables, dirigés par les communautés dans le développement économique local, la production alimentaire, le renforcement du capital humain, l'accès à l'eau potable et les infrastructures de base, il leur est facile de sortir de l'extrême pauvreté. Une fois que ces communautés ont bien pris pied sur l'échelon du développement, elles peuvent se propulser elles-mêmes et de façon autonome sur le chemin de la croissance économique. Sur cette base, l'évaluation a conclu à la nécessité de mettre à l'échelle le Projet initial.

L'évaluation des projets et programmes appuyés par le PNUD par le passé a montré la capacité des communautés locales à apprendre, co-innover et même transformer les connaissances reçues pour créer la richesse. Les différentes interventions du Projet permettront de renforcer les capacités techniques, matérielles, organisationnelles et managériales des acteurs du métier du secteur, leur permettant de développer leur capacitation d'action. L'appropriation et l'internalisation des connaissances et acquis du Projet permettront aux bénéficiaires de renforcer leur compétitivité et résilience économique.

Durabilité et amplification

Le PERZI présente un potentiel de transposition à plus grande échelle, car en priorité Le projet s'inscrit dans une dynamique de pérennisation, de mise à échelle et aussi de réplicabilité.

→ L'accès à l'électricité et le développement d'activités productives limiteront la vulnérabilité socio-économique des communautés locales et constitueront une véritable alternative. Grâce aux

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

différentes activités de ce projet, de nouvelles opportunités économiques se présenteront aux populations locales. Les résultats de ce projet contribueront à augmenter les moyens de subsistance de ces communautés, contribuant ainsi à leur résilience face aux effets du changement climatique.

→ Le Programme est en phase avec les priorités du Gouvernement Mauritanien en termes de développement socio-économique et de promotion de l'accès à l'énergie, tel que la SCAPP et Programme Prioritaire Élargi du Président de la République (ProPEP).

→ L'appui technique et institutionnel aux structures nationales en charge de l'électrification rurale et de la promotion des énergies renouvelables ;

→ Renforcement des capacités locales pour la maintenance des infrastructures et des équipements livrés.

DS OD

→ Le PNUD met à disposition du projet pilote une équipe interne et de consultants dédiée avec des expertises diverses pour l'assurance qualité.

→ Ce Programme est en phase avec le Programme Africain de Min-igrid (AMP) coordonner par le PNUD. Il contribue aussi aux engagements du pays en matière de réduction des émissions de la CDN.

DS F

→ Les résultats/produits du projet concourent toutes vers la durabilité avec le renforcement de capacité et aussi un modèle d'affaire basé sur le marché qui augmente les moyens de subsistances des populations dans les zones cibles en particulier parce que les projets pilotes feront la démonstration de technologies et de modèles commerciaux nouveaux et innovants. Cela permettra d'assurer que l'écosystème du marché des mini-réseaux soit suffisamment amélioré pour accroître les investissements du secteur privé. Ce qui va faciliter sa durabilité et mise à l'échelle.

→ Cette approche, associée à une bonne gestion des connaissances et une solide théorie du changement, devrait catalyser le marché des mini-grid. Ce projet a donc un fort potentiel de mise à l'échelle et de réplication.

→ Tous les produits de connaissance issus du projet tels que les outils d'information, les guides, les plans, etc. seront numérisés et partagés avec les parties prenantes appropriées, le ministère, les donateurs, le secteur privé, etc.

→ Finalement, le fait que le programme AMP est envisagé en Mauritanie, ceci serait idéalpour continuer et mettre à l'échelle le projet pilote.

III. GESTION DU PROJET (1/2 PAGE A 2 PAGES)

5.1 : Zones d'intervention du Projet

Le Programme cible 200 localités isolées sises dans 7 régions (Hodh Echargui, Hodh El Gharby, Assaba, Taggant, Inchiri, Adrar, Brakna)conformément. Les études de faisabilité sont achevées pour 30 villages (dans le cadre du plan d'investissement prioritaire signé en 2022 entre le PNUD et le Ministère en charge de l'Energie), et se poursuivent pour 170 villages.

Wilaya	Moughataa	Commune	Nom de la localité	XdegDec	YdegDeci
Hodh Charghy	Amourj	Adel Bagrou	Zraviyatt	-6.923069	15.981548
Hodh Charghy	Amourj	Adel Bagrou	Moileh Echorva	-6.672825	15.858992
Hodh Charghy	Amourj	Adel Bagrou	Mghaidiya 1	-6.676809	15.484232
Hodh Charghy	Amourj	Adel Bagrou	Mghaidiya 2	-6.674714	15.490795
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Oum Eacheiche	-7.679196	15.78556
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Boutib 1	-7.676719	15.859957
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Elguetae 1	-7.625444	15.791621

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Aine Elveteh	-7.485543	15.640313
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Bir Echerika	-7.51051	15.615829
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Debay Demba	-7.369291	15.72998
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Dieigui1	-7.255866	15.629582
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Drougal Eteichtaya	-7.327087	15.607888
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Laewej	-7.34486	15.485325
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Mahmouda1	-7.316917	15.583229
Hodh Charghy	Amourj	Bougadoum	Vraikika	-7.623315	15.479832
Hodh Charghy	Basseknou	Dhar	Gneibett Khairi	-6.609526	16.027656
Hodh Charghy	Basseknou	Dhar	Kork	-6.638414	16.123782
Hodh Charghy	Basseknou	El Megve	Aghor	-5.697084	16.036356
Hodh Charghy	Basseknou	El Megve	Tenouagoutim	-5.438	15.996402
Hodh Charghy	Basseknou	El Megve	Elhassi Twil	-5.468224	16.123658
Hodh Charghy	Basseknou	Vessale	Kousana	-5.742475	15.625111
Hodh Charghy	Basseknou	Vessale	Kendierla	-5.638774	15.549859
Hodh Charghy	Djiguenni	Aoueinat Ez Bel	Devaa	-8.657332	16.398328
Hodh Charghy	Djiguenni	Aoueinat Ez Bel	Hassi Essalek	-8.833547	16.359816
Hodh Charghy	Djiguenni	Aoueinat Ez Bel	Elghoughri	-8.873867	16.163207
Hodh Charghy	Djiguenni	Benneamane	Aine Elhawli	-8.871144	15.929923
Hodh Charghy	Djiguenni	Feirenni	Elagla	-8.773355	15.549339
Hodh Charghy	Djiguenni	Gasr El Berke	Gadel	-8.842005	15.822337
Hodh Charghy	Djiguenni	GhligEhlBeye	Bouleklal	-8.738497	15.956101
Hodh Charghy	Djiguenni	Mabrouk	Elmabrouk 2	-8.411121	15.636974
Hodh Charghy	Djiguenni	Mabrouk	Djimi	-8.500279	15.553127
Hodh Charghy	NBeikett Lehouach	TNC Nbeikett Lehwache	Zriba	-5.955341	16.309958
Hodh Charghy	Néma	Bangou	Ketawane 1	-6.764908	16.072583
Hodh Charghy	Néma	Bangou	Katawane 2	-6.768601	16.082942
Hodh Charghy	Néma	Oum Avnadech	Vani	-7.732732	15.950102
Hodh Charghy	Néma	Oum Avnadech	Loueid 1	-7.674074	15.9589
Hodh Charghy	Néma	Oum Avnadech	Eladala	-7.610213	16.127641
Hodh Charghy	Oualata	TNC	Berbara	-7.302207	16.920707
Hodh Charghy	Oualata	TNC	Rini	-6.96997	16.961536
Hodh Charghy	Timbédra	Bousteile	Deida Ghili	-8.082758	15.523814
Hodh Charghy	Timbédra	Bousteile	Nbeya Essavra 2	-7.800907	15.651828
Hodh Charghy	Timbédra	Bousteile	Hassi Etila	-7.824584	15.544185
Hodh Charghy	Timbédra	Hassi M'Hadi	Oum laedham	-8.583605	16.27487
Hodh Charghy	Timbédra	Hassi M'Hadi	Hseyatt Ehel Abeidi	-8.323849	15.925079
Hodh Charghy	Timbédra	Hassi M'Hadi	Nisr Ehel Hmeida	-8.469951	16.152488
Hodh Charghy	Timbédra	Hassi M'Hadi	Talhayitt Ehel Behah	-8.523689	16.212511
Hodh Charghy	Timbédra	Koumbi Saleh	Yengui Ezemal	-8.023867	15.754958
Hodh Charghy	Timbédra	Koumbi Saleh	Sedra	-7.949873	15.761573
Hodh Charghy	Timbédra	Touil	Oum Sboua	-8.231507	16.422686
Hodh Charghy	Timbédra	Touil	Magham Elhila	-8.339115	16.547457
Hodh El Gharbi	Aioun El Atrouss	Doueirare	Edemouche Laedeila	-9.997098	16.609523
Hodh El Gharbi	Aioun El Atrouss	Doueirare	Boumaiza	-10.082103	16.717316
Hodh El Gharbi	Kobeni	Gougui Zemmal	Boiziyitt Laetariss	-9.183032	15.478735
Hodh El Gharbi	Kobeni	Gougui Zemmal	Tweimirett Lekwaz	-9.300196	15.510698
Hodh El Gharbi	Kobeni	GouguiZemmal	Araghane Ould Meyoud	-9.17968	15.869096

DS OD

DS F

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Hodh El Gharbi	Kobeni	GouguiZemmal	Boujdour Awlad Lehsene	-9.277963	15.617769
Hodh El Gharbi	Kobeni	GouguiZemmal	Lekhzine Elguebliya	-9.106583	15.492477
Hodh El Gharbi	Kobeni	GouguiZemmal	Lekhzine Teliya	-9.079875	15.491671
Hodh El Gharbi	Kobeni	Hassi Ehel Ahmed Bechne	Elkhatt	-9.806572	15.929513
Hodh El Gharbi	Kobeni	Hassi Ehel Ahmed Bechne	Tweimratt	-9.712186	15.985392
Hodh El Gharbi	Kobeni	Hassi Ehel Ahmed Bechne	Elmegsem	-9.674792	16.127332
Hodh El Gharbi	Kobeni	Hassi Ehel Ahmed Bechne	Terteiga	-9.59076	16.024794
Hodh El Gharbi	Kobeni	Hassi Ehel Ahmed Bechne	Elghotoub	-9.640653	16.159012
Hodh El Gharbi	Kobeni	Koubenni	Oum Elakrich	-9.321922	15.832762
Hodh El Gharbi	Kobeni	Leghlig	Hneidi	-9.04205	15.830903
Hodh El Gharbi	Kobeni	Leghlig	Lemkhaichba	-9.063259	15.759719
Hodh El Gharbi	Kobeni	Leghlig	Lembeihra	-9.077482	15.858201
Hodh El Gharbi	Kobeni	Modibougou	Borela 1	-9.536522	15.443338
Hodh El Gharbi	Kobeni	Modibougou	Borela 2	-9.562218	15.431847
Hodh El Gharbi	Kobeni	Modibougou	Oum Sveya	-9.522854	15.550182
Hodh El Gharbi	Kobeni	Timzine	Bou Talhaya	-8.972719	16.339088
Hodh El Gharbi	Kobeni	Timzine	Neametou Allahi 1	-9.305691	15.953329
Hodh El Gharbi	Kobeni	Voullaniya	Ehel Elhadi	-9.642071	15.513051
Hodh El Gharbi	Kobeni	Voullaniya	Kerkeira Elbeidha	-9.642648	15.516691
Hodh El Gharbi	Kobeni	Voullaniya	Kerkeira Ehel Elatigh	-9.642302	15.473511
Hodh El Gharbi	Kobeni	Voullaniya	Kerkeira Ehel Mohamed Sghayer	-9.60054	15.48405
Hodh El Gharbi	Kobeni	Voullaniya	Dar Naim	-9.886695	15.631821
Hodh El Gharbi	Tamchekett	Guetae-Teidoume	Legreiva	-10.946218	16.671811
Hodh El Gharbi	Tamchekett	Guetae-Teidoume	Oum Lemhar	-10.748394	16.57563
Hodh El Gharbi	Tamchekett	Guetae-Teidoume	Gaett Eteidouma	-10.687501	16.727895
Hodh El Gharbi	Tamchekett	Radhi	Neichane	-10.479459	16.629695
Hodh El Gharbi	Tamchekett	Sava	Guelab	-10.579987	16.883703
Hodh El Gharbi	Tamchekett	Sava	Goub Nouamer	-10.646011	16.962902
Hodh El Gharbi	Tintane	Ain Varbe	Lenwar	-10.410411	16.018183
Hodh El Gharbi	Tintane	Aweinat Thalle	Bawiya	-10.046371	15.774624
Hodh El Gharbi	Tintane	Aweinat Thalle	Lembeihra	-9.993893	16.197998
Hodh El Gharbi	Tintane	Aweinat Thalle	Laeweinatt	-9.948164	16.154588
Hodh El Gharbi	Tintane	Aweinat Thalle	Bouhedra	-10.26212	16.066777
Hodh El Gharbi	Tintane	Aweinat Thalle	Rwahel	-10.206488	15.908829
Hodh El Gharbi	Tintane	Devaa	Bambeira	-10.711608	16.234053
Hodh El Gharbi	Tintane	Egharghar	Oum Erwayeh 1	-10.602335	15.980825
Hodh El Gharbi	Tintane	Hassi Abdallah	Zmeita	-9.915637	16.360692
Hodh El Gharbi	Tintane	Lehreijat	Mkhaicheba	-10.524851	15.451794
Hodh El Gharbi	Tintane	Lehreijat	Messyel Essalihine	-10.568673	15.469591
Hodh El Gharbi	Tintane	Lehreijat	Messyel Guervav	-10.605701	15.528542
Hodh El Gharbi	Tintane	Lehreijat	Tegowditt	-10.650976	15.602395
Hodh El Gharbi	Tintane	Lehreijat	Teidouma	-10.620587	15.487335
Hodh El Gharbi	Tintane	Tintane	Egueni Ehel Taleb Abdallahi	-10.23316	16.36068
Hodh El Gharbi	Tintane	Tintane	Echematt	-10.106889	16.413471

DS OD

DS F

Hodh El Gharbi	Tintane	Touil	Elbeyidh	-10.03595	15.658668
Hodh El Gharbi	Tintane	Touil	Ketwel	-9.892136	15.396483
Assaba	Barkeiwel	Barkeiwel	Debay Barkéwol Lakhdhar	-12.43598	16.599992
Assaba	Barkeiwel	Barkeiwel	Rag	-12.425858	16.598955
Assaba	Barkeiwel	Barkeiwel	Tweichitt 1	-12.324793	16.695168
Assaba	Barkeiwel	Bou Lahrath	Tembal	-12.645941	16.779536
Assaba	Barkeiwel	Daghveg	Mbay	-12.379382	16.546303
Assaba	Barkeiwel	Daghveg	Ould Moilid Taleb Maham	-12.583071	16.519103
Assaba	Barkeiwel	El Ghabra	Oudey Eness	-12.601555	16.645858
Assaba	Barkeiwel	El Ghabra	Boubaghja Edechra	-12.719297	16.595204
Assaba	Barkeiwel	El Ghabra	Boubaghja 2	-12.704423	16.572745
Assaba	Barkeiwel	El Ghabra	Bou Edemyane	-12.737043	16.647775
Assaba	Barkeiwel	El Ghabra	Kidane 1	-12.652196	16.485902
Assaba	Barkeiwel	El Ghabra	Galb Eneaj	-12.699602	16.669999
Assaba	Barkeiwel	Gueller	Gueleir	-12.159139	16.724751
Assaba	Barkeiwel	Gueller	Bagha	-12.211889	16.864188
Assaba	Barkeiwel	Laweissi	Gdemballa	-12.039682	16.160834
Assaba	Barkeiwel	Laweissi	Vorae Laechoucha	-12.399705	16.325618
Assaba	Barkeiwel	Laweissi	Akwatil Enamouss	-12.400149	16.250609
Assaba	Barkeiwel	Laweissi	Bariss	-12.398211	16.303344
Assaba	Barkeiwel	Laweissi	Zegueha	-12.159013	16.190927
Assaba	Barkeiwel	Laweissi	Ejerek	-12.144968	16.129971
Assaba	Barkeiwel	Lebheir	Hassi Sidahmed	-12.170009	16.511369
Assaba	Barkeiwel	R'Dheidhie	Lehneikatt	-12.741325	16.784059
Assaba	Boumdeid	Boumdeid	Tesselah	-11.412194	17.468914
Brakna	Aleg	Aleg	Ehel Snaiba Dar Naim	-13.893854	17.10571
Brakna	Aleg	Djellewar	Elghouni	-13.231385	16.522611
Brakna	Aleg	Male	Sada Elmasrav	-13.154178	16.736878
Brakna	Aleg	Male	Lembeidi	-13.023178	16.605588
Brakna	Aleg	Male	Abeira	-13.04726	16.606446
Brakna	Aleg	Male	Debay Ezaghoura	-13.207159	16.950323
Brakna	Boghé	Boghé	Ganki Diéri	-14.205139	16.57376
Brakna	Boghé	Boghé	Rachide	-14.150922	16.707169
Brakna	Boghé	Boghé	Mourtogal	-14.137299	16.520518
Brakna	Boghé	Dar El Barke	Rabya 3	-14.763627	16.753461
Brakna	Boghé	Dar El Barke	Dar Naim	-14.696091	16.759205
Brakna	Boghé	Dar El Barke	Oulad Mansour	-14.852222	16.674426
Brakna	Boghé	Dar El Barke	Diama	-14.718231	16.697954
Brakna	Boghé	Dar El Barke	Féthie	-14.805132	16.651233
Brakna	Boghé	OuldBiram	Thiéfol Edi	-14.501517	16.625667
Brakna	Magtalahjar	Magtalahjar	Tichoutene	-13.000056	17.718513
Brakna	Magtalahjar	Magtalahjar	Eljezira	-13.266483	17.456487
Brakna	Magtalahjar	Sangrave	Leaweija Elghadima	-12.809303	17.39814
Brakna	Magtalahjar	Sangrave	Ouad Erkaiz	-12.898744	17.420775
Brakna	Magtalahjar	Sangrave	Gweiwa 1	-12.816426	17.451888
Brakna	Aleg	Male	Abeira	-13.04726	16.606446
Brakna	Magtalahjar	Magtalahjar	Eljezira	-13.266483	17.456487
Brakna	Boghé	Boghé	Mourtogal	-14.137299	16.520518

DS OD

DS F


DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Brakna	Aleg	Male	Debay Ezaghoura	-13.207159	16.950323
Adrar	Aoujeft	Aoujeft	Eljedida	-13.121462	20.055508
Adrar	Aoujeft	El Medah	El Medah	-13.348579	19.988781
Adrar	Aoujeft	Maeden	Elmaedene	-13.020927	19.864197
Adrar	Aoujeft	Maeden	Mhaireth	-13.003952	20.275426
Adrar	Aoujeft	N'Teirguent	Nteirguent	-12.965204	19.614326
Inchiri	Akjoujt	Bennechab	Dewass	-15.478722	20.631002
Inchiri	Akjoujt	Bennechab	Elasma	-15.192427	19.016604
Tagant	Moudjeria	N'Beike	Voum kouz 1	-12.173377	17.977102
Tagant	Moudjeria	N'Beike	Doualegh	-12.350814	18.177262
Tagant	Moudjeria	N'Beike	Akneikir	-12.169166	17.734013
Tagant	Moudjeria	N'Beike	Biliniar	-12.112756	18.228891
Tagant	Moudjeria	N'Beike	Lekhdeima	-12.243398	17.691325
Tagant	Moudjeria	N'Beike	Voum ajar	-12.250345	17.946124
Tagant	Moudjeria	N'Beike	Nouediehene	-12.143826	18.08071
Tagant	Moudjeria	Soudoud	Diounguiya elguibliya	-12.552329	17.455772
Tagant	Moudjeria	Soudoud	Aine elkhacheba eteliya	-12.092217	17.186857
Tagant	Moudjeria	Soudoud	Ouad leghnem	-12.21166	17.370526
Tagant	Moudjeria	Soudoud	Amrichett ehel sidi reyoug	-12.529696	17.531084
Tagant	Tichit	Tichit	Aghreijitt	-9.190336	18.349994
Tagant	Tidjikdja	El Wahat	Acharim	-11.737011	18.489243
Tagant	Tidjikdja	Tensigh	Iguevan 1	-11.919994	18.146865
Tagant	Tidjikdja	Tensigh	Aglembitt	-11.90856	18.415242

DS OD

DS F

Le schéma ci-dessous illustre la méthodologie de gestion du projet

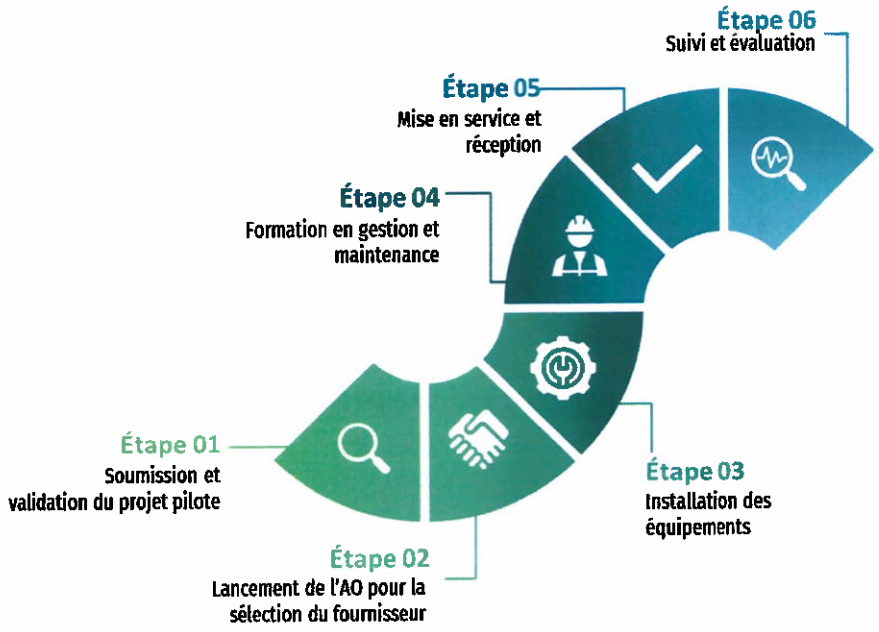

[8]*Figure : Schéma de gestion de projet*

5.2 Coût efficacité et productivité

[8] Schéma de gestion de projet

En partant de l'hypothèse où le produit est mis en œuvre conformément aux éléments ci-dessus, l'efficacité de l'intervention du PNUD peut être assise sur plusieurs facteurs propices à l'atteinte des résultats escomptés :

- Le niveau d'influence du PNUD en termes de leadership : en effet, l'évaluation des précédents cycles a montré que « globalement, le PNUD a su profiter de ses avantages comparatifs – sa neutralité, sa capacité de plaidoyer et le capital technique issu de son réseau global – en vue d'atteindre les résultats escomptés »9.
- La prise en compte de l'alignement du produit avec d'autres produits ou d'autres priorités nationales : il s'agit d'une opportunité dont l'absence ou la faible prise en compte a été soulignée dans les précédents cycles. La précaution méthodologique d'un alignement des produits sur les priorités nationales constitue un atout favorable à l'atteinte des résultats.
- L'existence d'un cadre conceptuel cohérent et documenté de la SCAPP, assis sur un diagnostic pertinent : les priorités nationales étant définies, les besoins étant clairement identifiés, le suivi et la coordination de la mise en œuvre deviennent plus efficaces.
- La plupart des résultats et des actions du produit impliquent une participation du Gouvernement mauritanien : qu'il s'agisse d'une participation financière ou d'une participation non financière..

DS OD

DS F

Ainsi, en termes de rapport cout, efficacité et productivité, le projet étant en phase avec les stratégies nationales (SCAPP et ProPEP) et internationales, en plus de la nouvelle offre de services du PNUD qui vise à fournir l'accès à l'énergie à 500 millions de personnes. Ceci assure une mise en synergie des ressources à l'interne (intra-PNUD) et externes avec les autres partenaires techniques et financiers.

Toutes composantes/produits du projet pilote seront financés par le PNUD et/ou les autres partenaires tels que le gouvernement Mauritanien et PTFs.

Les systèmes conteneurisés et autres technologies hors-réseau préconisés dans le cadre du pilote ont un bon rapport qualité-prix. En plus, elles sont modulables donc ces solutions pourront être utilisées même quand les besoins augmentent, il suffira juste d'ajouter d'autres systèmes. Aussi, à l'arrivée du réseau, les systèmes peuvent être redéployés

5.3: Audit des comptes

L'audit est une partie intégrante de la gestion financière et administrative du Projet et fait partie du cadre de responsabilité du PNUD. Il est donc placé sous la responsabilité directe du Bureau Pays du PNUD. L'objectif principal de l'audit est de fournir à l'Administrateur du PNUD et aux parties prenantes, une garantie en ce qui concerne l'utilisation correcte des ressources mises à disposition. Il sera réalisé par un cabinet d'audit qualifié recruté qui va produire un rapport d'audit et certifier les états financiers.

Les comptes du projet feront l'objet d'audit chaque année. De même le système de gestion des partenaires de mise en œuvre sera évalué chaque année sur la base des risques, des recommandations issues de la micro évaluation et des actions de renforcement de capacités planifiées pour le renforcement de l'appropriation nationale: c'est l'audit HACT. Les résultats de chaque audit NIM/HACT seront transmis au partenaire d'exécution et au PNUD. De plus, chacun des partenaires de réalisation recevra et analysera le rapport d'audit émis par les auditeurs. Le(s) partenaire(s) de réalisation présentera (ont) au PNUD dans les meilleurs délais une déclaration d'acceptation ou de rejet de toutes les recommandations d'audit. Il(s) entreprendra (ont) des démarches dans les meilleurs délais afin de réagir aux recommandations de l'audit. Il(s) rendra (ont) compte des démarches entreprises afin de mettre en œuvre les recommandations de l'audit.

Une séance de restitution d'audit sera organisée en présence des différentes parties prenantes du Projet.

[9]Programme des Nations Unies pour le Développement, Bureau indépendant d'évaluation : « Évaluation des Résultats des Activités de Développement : Mauritanie, janvier 2016», page 79.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

5.4: Droits d'auteur

Le PNUD détient les droits d'auteur et de reproduction de toutes les publications et autres matériaux qu'il commande dans le cadre de ses projets, que le texte soit écrit par un membre du personnel ou par un consultant rémunéré. La permission de reproduction peut être donnée aux médias, ONG, institutions académiques et autres, à condition que le PNUD soit dûment cité.

L'Accord de base entre le Gouvernement de la Mauritanie et le PNUD établit que : « le PNUD restera propriétaire du matériel technique et autre, ainsi que des approvisionnements, fournitures et autres biens financés ou fournis par lui, à moins qu'ils ne soient cédés au Gouvernement ou à une entité désignée par celui-ci, selon les modalités et à des conditions fixées d'un commun accord par le Gouvernement et le PNUD.

DS OD

Le PNUD restera propriétaire des brevets, droits d'auteur, droits de reproduction et autres droits de même nature sur les découvertes ou travaux résultant de l'assistance qu'il fournira au titre du présent accord. A moins que les parties n'en décident autrement dans chaque cas, le Gouvernement pourra toutefois utiliser ces découvertes ou ces travaux dans le pays sans avoir à payer de redevances ou autres droits analogues. »

DS F

La partie nationale et le PNUD sont coauteurs des publications et des découvertes sur le Projet.

4.1. **Utilisation du logo**

Le logo du PNUD doit être utilisé dans le respect des normes graphiques du PNUD et à des fins non commerciales. Avant impression de toute publication financée par le PNUD, il est recommandé de se référer au PNUD notamment au Chargé de Communication pour vérification du branding du PNUD.

Tout projet exécuté sur le terrain avec l'appui du PNUD doit avoir pour seul logo le nouveau logo du PNUD. Si nécessaire, le nom du projet sera indiqué en toutes lettres à côté du logo (pas en dessous). Il ne doit pas y avoir de logos séparés ou autonomes. Il n'y a pas d'exceptions à cette règle. Lorsque le projet est administré avec un partenaire, dont la participation doit être signalée par un élément visuel, le nouveau logo du PNUD doit être utilisé avec le logo du/des partenaire(s) seulement.

En cas de publication conjointe avec un ou plusieurs partenaires, tous les logos devraient figurer sur une seule ligne, en bas ou en haut de la première couverture de la publication. Il faut veiller à assurer l'égalité visuelle de tous les logos, c'est-à-dire de ne pas faire ressortir un logo par rapport aux logos des institutions spécialisées ou organismes partenaires.

5.4: Respect de l'avis de non-responsabilité

Les publications du PNUD qui citent un auteur ou contiennent des opinions ou avis devraient contenir la déclaration suivante : « Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de leur(s) auteur(s) et ne représentent pas nécessairement celles des Nations Unies, y compris le PNUD, ni des Etats Membres ». Le nom des auteurs ne devrait jamais apparaître sur la couverture d'une publication.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

IV. CADRE DE RESULTATS[10]

DS
OD

DS
F

[10] Le PNUD publie des informations sur ses projets (indicateurs, situations de référence, cibles et résultats) pour respecter les normes de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA). On veillera à employer des indicateurs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps), à fournir des situations de référence précises et des cibles reposant sur des données fiables et sur des preuves credibles. On évitera aussi les acronymes de manière à ce que le public externe comprenne clairement les résultats du projet.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-8777-744CC46D48F1

Priorité ou Objectif national : Renforcement des capacités nationales pour une adaptation des systèmes de production et l'intégration du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophes dans une perspective de développement durable

Effet dans le PNUAD (ou tout outil équivalent) concernant le PNUD EFFET N° 3 : Les institutions et les communautés contribuent à la gestion durable des ressources naturelles, afin d'anticiper les crises et les effets du changement climatique et d'y apporter des réponses. : **ODD : ODD 1, ODD 6, ODD 7, ODD 11, ODD 13, ODD 14, ODD 15**

Indicator 3.1. Pourcentage des populations, désagrégés par sexe utilisant des techniques et méthodes adaptées de gestion de l'environnement, de résilience et d'adaptions et de gestion des risques et catastrophes.

Indicator 3.2. Taux de couverture du territoire national en électrification rurale basé sur les énergies renouvelables en appui du PNUD

Indicator : *Taux de réduction du nombre de maladie d'origine hydrique*

Effet connexe du Plan Stratégique : Effet 1.

Intitulé et numéro Atlas du projet :

PRODUITS ESCOMPTÉS	INDICATEURS DE PRODUIT[11]	SOURCE DES DONNÉES	SITUATION DE RÉFÉRENCE		CIBLES (par fréquence de recueil des données)					MÉTHODES DE RECUEIL DES DONNÉES ET RISQUES Y RELATIFS
			Valeur	Année	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	FINAL	
Produit 1 : Le déficit énergétique est comblé dans 200 localités rurales, à travers l'accès à des mini centrales solaires isolées à des coûts abordables pour les	**1.1** ***Nombre de*** mini centrales solaires déployées et fonctionnelles		0	2022	*0*	10	190	0	*200*	*Contrats d'emplis/Rapport*
	1.2 *Nombre de ménages connectés à une source solaire dans les 200 localités (dont 60% de femmes cheffes de ménage)*		*0*	*2022*	*0*	*2000*	*38000*	*0*	*40000*	*Contrats d'abonnements, Contrats d'Affaires Gérés*
	1.3 Disponibilité d'un modèle de gestion des mini centrales électriques		*0*	*2022*	*0*	*1*	*0*	*0*	*1*	*Rapports annuel MPEM*

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

populations les plus pauvres	*1.4* Nombre de plateformes de paiement numérique mises en place avec les mini-réseaux (pay -as you go)		0	2022	*0*	*10*	*190*	*0*	*200*	
	1.5 Quantité d'énergie produite par Système et par jour (en KWh/j)		0	2022	*0*	*A déter miner*	*A déter miner*	*A déter miner*	*A déterm iner*	*MPEM*
	1.6 : *Puissance crête installée grâce aux mini-réseaux mis en œuvre par l'action*		0	2022	*0*	*A déter miner*	*A déter miner*	*A déter miner*	*A déterm iner*	*MPEM*
	1.7. Quantité d'émission de CO2 réduite par an (en tonne)		0	2022	*A déter mine*	*A déter mine*	*A déter mine*	*A déter mine*	*A déterm ine*	*Rapport ARE*
	1.8 : nombre d'accords de gestion (50% d'opérateurs femmes)		0	2022	*0*	*0*	*10*	*0*	*10*	*Rapports ARE/MPEM*
Produit 2 : Les capacités techniques, organisationnel les des acteurs du secteur de l'énergie sont renforcées	***2.1 Nombre de*** techniciens issus des villages formés en énergie solaire pour la maintenance des systèmes		*0*	*2022*	*0*	50	950	0	*1000*	*Rapports du MPEM*
	2.2 Existence d'un cadre Partenariat Public-privé opérationnel, favorable à l'investissement dans le domaine de l'énergie Renouvelable		*0*	*2022*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*Rapport ARE*
	2.3 : Nombre de législations/textes/règlements favorables aux énergies renouvelables et à la transition énergétique revus ou développés avec l'appui de l'action		*0*	*2022*	*0*	*3*	*0*	*0*	*3*	*Rapport du MPEM*

DS OD

DS F

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

	2.4. Visite d'étude des parties prenantes (MPME, SOMELEC, DEME, ARE et PNUD) au Rwanda ou en Tanzanie		*0*	*2022*	*0*	*2*	*1*	*0*	*3*	*Rapport de missions*
	2.5 : existence d'un dispositif institutionnel pour la promotion des énergies renouvelables et l'électrification rurale (cellule pour la promotion des ER, cadre de coordination des interventions, etc.)		*0*	*2022*	*0*	*2*	*0*	*0*	*2*	*Arrêté ministériel* *Note de service*
Produit 3 : Les conditions sont mises en place pour la vitalisation socio-économique des localités isolées, permettant la création de revenues durables et le déploiement d'au moins 9 catégories de	3.1 : Nombre d'infrastructures communautaires construites/réhabilitées et électrifiées (écoles, centres des santé, mosquées ; maison des jeunes, etc.).		*0*	*2022*	*0*	*0*	*100*	*100*	*200*	*Rapports ministères sectoriels*
	3.2 : Nombre d'Activités économiques installées/accompagnées par le programme autour des mini centrales installées (dont au moins 80% de femmes bénéficiaires)		*0*	*2022*	*0*	*10*	*190*	*0*	*200*	*Rapports MEFP/APIM*
	3.3 : Taux d'accès à l'internet dans les zones où la couverture 3G est suffisante		*0*	*2022*	*0*	*10*	*190*	*0*	*200*	*Rapports ARE*

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

DS OD DS F	services sociaux de base dont le numérique, pour plus de 300,000 habitants des communes rurales isolées, dont 60% de femmes.	3.4 nombre de points d'eau potable installés ou réhabilités		*0*	*2022*	*0*	*10*	*190*	*0*	*200*	*Rapports ministères sectoriels*

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

V. SUIVI ET EVALUATION

Conformément aux politiques et procédures de programmation du PNUD, le projet fera l'objet d'un suivi selon les plans de suivi et d'évaluation ci-dessous : *[NB : les plans de suivi et d'évaluation doivent être adaptés au contexte du projet, ainsi qu'il conviendra].*

Plan de suivi

Activité de suivi	Objet	Fréquence	Action prévue	partenaires éventuels	Coût éventuel
Suivre les progrès vers les résultats	Recueillir et analyser les données sur les progrès par rapport aux indicateurs de résultats du RRF afin de déterminer les progrès du projets vers l'obtention des produits convenus.	Trimestrielle ou à la fréquence requise pour chaque indicateur.	Intervention de la direction du projet en cas de progrès plus lents que prévus.	Acteurs du secteur hors-réseaux	?
Suivre et gérer les risques	Identifier les risques spécifiques susceptibles de menacer l'atteinte des résultats prévus. Identifier et suivre les mesures de gestion des risques au moyen d'un registre des risques. Ceci comprend les mesures et les plans de suivi qui ont pu être requis selon les normes sociales et environnementales du PNUD. Des audits seront réalisés conformément à la politique d'audit du PNUD pour gérer les risques financiers.	Trimestrielle	La direction du projet identifie les risques et prend des mesures de gestion de ces risques. Elle veille à la tenue et à l'actualisation du registre des risques pour assurer le suivi des risques repérés et des mesures prises.		
Apprendre	Les connaissances, les bonnes pratiques et les enseignements seront dégagés périodiquement des activités du projet ainsi que recherchés activement auprès d'autres projets et de partenaires puis réintégrés dans le projet.	Au moins annuelle	L'agencee du projet dégage les leçons appropriées et en tient compte pour éclairer les décisions de gestion.		
Assurance qualité du projet	La qualité du projet sera évaluée par rapport aux normes de qualité du PNUD pour repérer les forces et les faiblesses du projet et pour éclairer la prise de décisions de gestion afin d'améliorer le projet.	Trimestriel	La direction du projet examine les forces et les faiblesses du projet et en tient compte pour éclairer ses décisions et améliorer les performances du projet.	PNUD	

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Revoir et Prendre des mesures correctives	Revue interne des données et des preuves issues de toutes les actions de suivi afin d'éclairer la prise de décisions.	trimestriel	Les données sur les performances, les risques, les leçons et la qualité font l'objet d'un examen du comité de pilotage et sont utilisées pour prendre des mesures correctives.		
Rapport du projet	Il sera présenté au comité de pilotage du projet et aux parties prenantes clés un rapport d'avancement qui comprendra les données sur les résultats obtenus au regard des cibles annuelles prédéfinies au niveau des produits, le résumé d'évaluation annuel de la qualité du projet, un registre des risques actualisé avec indication des mesures d'atténuation et tous les rapports d'évaluation et de revue établis au cours de la période considérée.	Annuelle et à la fin du projet (rapport final)			
Revue du projet (comité de pilotage)	Le mécanisme de gouvernance du projet (comité de pilotage) effectuera des revues périodiques du projet pour en évaluer la performance et examiner le Plan de travail pluriannuel afin de garantir le réalisme des budgets pour la durée du projet. La dernière année du projet, le comité de pilotage effectue une revue du projet pour dégager les leçons à retenir, examiner les possibilités d'amplification d'échelle et diffuser les résultats et les enseignements à retenir du projet auprès des publics concernés.	Semestriel	Il convient que le comité de pilotage examine toutes les préoccupations relatives à la qualité et à la lenteur de l'avancement du projet et que des mesures de gestion soient prises pour traiter les problématiques mises en évidence.		

DS OD

DS F

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Plan d'évaluation[12]

Titre de l'évaluation	partenaires (éventuels)	Produit associé du plan stratégique	Effet du PNUAD/DPP	Date d'achèvement prévue	Parties prenantes clés de l'évaluation	Coût et source du financement
Ex. : Évaluation à mi-parcours				En juin 2025	Acteurs clés du domaine	30,000$

DS OD

DS F

[12] Facultatif; selon les besoins

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

VI. PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL[13] [14]

Tous les coûts programmatiques et opérationnels prévus pour l'appui du projet, notamment ceux de l'appui à l'efficacité du développement et des dispositions de mise en œuvre, doivent être identifiés, estimés, chiffrés intégralement dans le budget du projet pour chacun des produits correspondants. Sont concernées ici les activités qui appuient directement le projet, telles que celles relevant des communications, des ressources humaines, des achats, du financement, des conseils de politique, de l'assurance qualité, des rapports, de la gestion, etc. Tous les services directement liés au projet doivent être indiqués de manière transparente dans le Document de projet. Pour plus d'informations, voir le document POPP PPM Formuler des programmes et des projets 3.0 Procédures > Étape 3.2 > Préparer des budgets entièrement chiffrés pour les projets.

PRODUITS ESCOMPTÉS	ACTIVITÉS PRÉVUES	Budget prévu par année				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
		A1	A2	A3	A4		Source de financement	Poste budgétaire	Montant (USD)
Composante 1 : Installation de mini centrales solaires **Produit 1 : Le déficit énergétique est comblé dans 200 localités rurales, à travers l'accès à des mini centrales solaires isolées à des coûts abordables pour les populations les plus pauvres**	Activité 1.1 : conduire les études de faisabilités pour les 200 localités du PERZI					PNUD	PNUD		700 000
	Activité 1.2 : Identifier un modèle innovant d'électrification rurale					PNUD	PNUD		50 000
	Activité 1.3 : élaborer un cahier de charge pour les 30 localités prioritaires					DEME/ PNUD	PNUD		50 000

[13] Les définitions et classifications des coûts pour que les coûts relatifs au programme et à l'efficacité du développement soient imputés au projet sont énoncées dans la décision DP/2010/32 du Conseil d'administration.

[14] Les modifications apportées au budget d'un projet qui affectent la portée (produits), la date d'achèvement ou les coûts estimatifs totaux du projet nécessitent une révision budgétaire formelle qui doit être signée par le comité de pilotage du projet. Dans les autres cas, le directeur de programme du PNUD peut signer seul la modification, à condition que les autres signataires n'y opposent aucune objection. Cette procédure est applicable, par exemple, lorsque le but de la modification n'est que de rééchelonner les activités entre les années.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Marqueur genre : 2	Activité 1.4 : Acquérir, installer et gérer les centrales électriques pour 10 localités					DEME/ PNUD	Gvt/Partenaires		7 600 000
	Activité 1.5 : organiser un dialogue national pour l'identification de modèles de gestion durables des mini centrales					DEME/ PNUD	PNUD		100 000
	Activité 1.6 : Acquérir, installer et gérer les centrales électriques pour 170 localités restantes					DEME/ PNUD	Gvt/partenaires		205 000 000
	Activité 1.7 : identifier des gestionnaires et signer des contrats de gestion					DEME/ARE/PNUD			00
	Total partiel pour le produit 1								213 500 000
Composantes 2 : Renforcement des capacités Produit 2 : Les capacités techniques, organisationnelles des acteurs du secteur de l'énergie sont renforcées *Marqueur genre : 2*	Activité 2.1. : organiser des sessions de formation sur la gestion des mini centrales au profit des jeunes des localités bénéficiaires					DEME/PNUD	PNUD/Partenaires		150 000
	Activité 2.2. : mettre en œuvre les recommandations des journées de dialogue nationales sur la gestion durable des mini centrales					DEME/PNUD	PNUD/Partenaires		50 000
	Activité 2.3 : Elaborer un plan d'action pour la transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables en matière d'électrification rurale					DEME/ARE/PNUD	PNUD/Partenaires		200 000

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

	Activité 2.4. : organiser des missions de partage d'expériences avec les pays pilotes dans la transition énergétique					DEME/PNUD	PNUD/Partenaires		50 000
	Activité 2.5 : opérationnaliser la cellule de promotion des énergies renouvelables et l'organe de pilotage du PERZI					DEME/PNUD	PNUD/partenaires		00
	Total partiel pour le produit 2								**450 000**
Composantes 3 : Développement communautaire Produit 3 : Les conditions sont mises en place pour la vitalisation socio-économique des localités isolées, permettant la création de revenues durables et le déploiement d'au moins 9 catégories de services sociaux de base dont le numérique, pour plus de 300,000 habitants des communes rurales isolées, dont 60% de femmes. *Marqueur genre : 2*	Activité 3.1 : Conduire une étude de faisabilité et fomuler un programme de désenclavement des communautés rurales isolées (PADC)					DEME/PNUD	PNUD/partenaires		160 000
	Activité 3.2 : identifier et développer des activités génératrices de revenus dans les localités bénéficiaires					DEME/PNUD	PNUD/partenaires		8 490 000
	Activité 3.3 : installer des antennes de télécommunication pour l'accès à l'internet décentralisé					DEME/PNUD	PNUD/partenaires		200 000
	Activité 3.4 : réhabiliter et construire des points d'eau, des centres de santé et des pistes					DEME/PNUD	Gvt/PNUD/Partenaires		80 840 000
	Total partiel pour le produit 3								**89 690 000**
	Total produits								303 640 000
Évaluation *(le cas échéant)*	Conduire une ÉVALUATION à mi-parcoutrs et l'evaluation finale					DEME/PNUD	PNUD		50 000

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Unité de Gestion et de coordination du programme									1 578 520
Appui général à la gestion (8%)	304 540 000*8%								24 221 480
TOTAL									**329 490 000**

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

VII. MODALITES DE GOUVERNANCE ET DE GESTION

Le Système des Nations Unies en Mauritanie a adopté l'approche Unis dans l'action. Le CPDD est, à ce titre, le cadre de référence des interventions des agences de développement et humanitaire en Mauritanie. L'opérationnalisation du CPDD est assurée à travers des PTA annuels consolidés. Des **comités des résultats** (organes inter-agences) sont mis en place pour diriger et guider la mise en œuvre du CPDD. Chaque groupe de résultats est établi par rapport à un groupe d'effets du CPDD 2018-2022. Afin d'alléger le fardeau sur les unités du Programme PNUD et afin de garantir la cohérence, l'intégration et l'alignement du CPD sur le CPDD, les mécanismes de gouvernance et de gestion des projets du CPD sont arrimés aux mécanismes de gouvernance et de gestion du CPDD. Ainsi, les traditionnels comités de pilotage de projet sont supprimés et le PNUD s'appuie sur les Comités des résultats du CPDD. Les comités de résultats du CPDD ne traitent pas des questions spécifiques des projets. Ils ne s'intéressent qu'aux questions stratégiques de la contribution des interventions et les progrès vers l'atteinte des effets du programme. Les questions spécifiques relevant de la vie des projets sont traitées à un niveau inférieur, c'est-à-dire les **Comités de suivi** des projets. Une structure très légère dont l'objectif est de formaliser le mécanisme existant de concertation et de prise de décision concernant les projets individuels entre le PNUD et la Direction nationale du projet. Ceci permettra de garder traces formelles des décisions prises (prolongation des projets, révisions substantielles, budgétaires, etc.) pour les exigences des audits et des PQA.

DS OD

DS F

Un Comité de suivi sera mis en place pour fournir au Directeur National du projet assistance et orientation et pour la prise de décision sur le projet.
Le projet sera mis en œuvre suivant la modalité de mise en œuvre nationale (NIM), le partenaire national de mise en œuvre est le Ministère en charge de l'énergie à travers la Cellule pour la Promotion des Énergies Renouvelables et de l'Électrification Rurale (CPERER), structure institutionnalisée conjointement par le MPME et le PNUD pour pérenniser les acquis du Projet MINIGRIDS et ancrée à la Direction de l'Électricité et de la Maitrise de l'Energie (DEME). Le PNUD fournira l'assurance qualité selon les politiques et procédures du Programme et des opérations (POPP)

Le partenaire national de mise en œuvre mettra à disposition de la CPERER des terrains suffisants pour abriter les locaux nécessaires à son fonctionnement.


La structure et les modalités de mise en œuvre auront les principaux éléments suivants :

- Un **Comité des résultats du CPDD** assurant le rôle de comité de pilotage et qui s'assure la pertinence du projet aux objectifs nationaux de développement et son alignement et sa contribution aux résultats de développement ;
- Un **Comité technique de Suivi** qui donne orientation et guide la mise en œuvre du projet ;
- Un **Directeur national** désigné par le partenaire national de mise en œuvre ;
- Une *unité de coordination* du projet qui n'est autre que la CPERER.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Le dispositif de coordination et de gestion est présenté comme suit :

Structure organisationnelle du projet

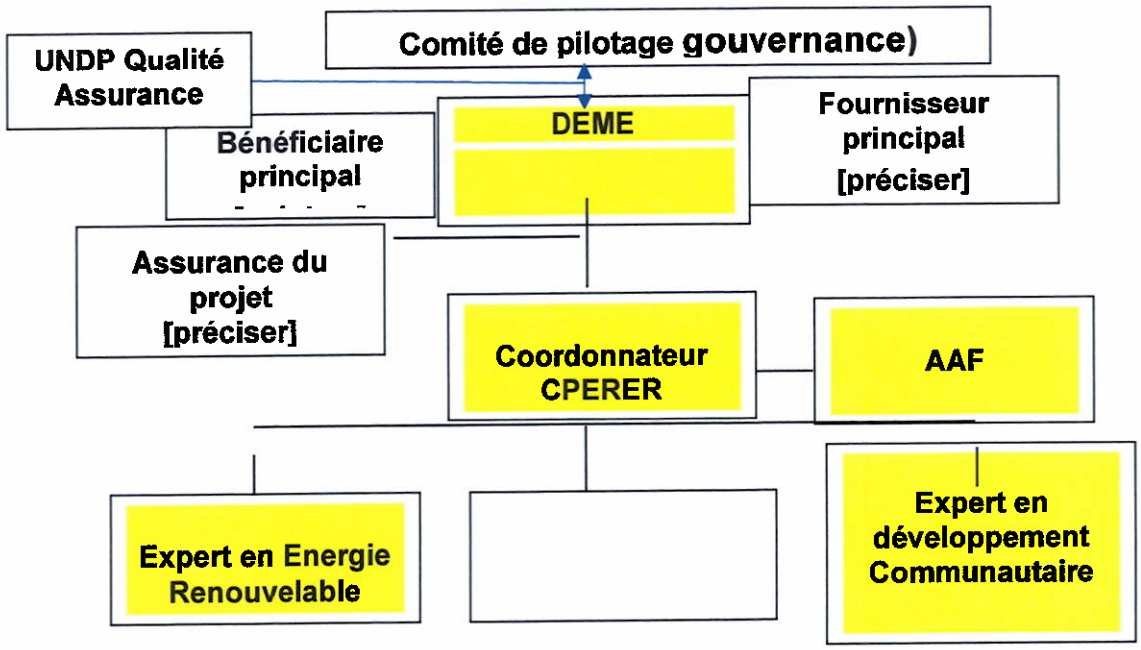

Le Comité des résultats du CPDD

Le pilotage général du projet sera assuré par le Comité des résultats du CPDD.

La composition du Comité des résultats, le mode de fonctionnement et les fréquences de réunion de ce comité sont arrêtés dans le cadre des mécanismes de gouvernance et de gestion du CPDD. La représentation des bénéficiaires sera assurée au niveau du Comité des résultats.

Le Comité d'Orientation

Le Comité d'Orientation Stratégique est co-présidé par le Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie et le Représentant du PNUD. Il veille à la définition des orientations stratégiques du programme. Ce comité est composé des représentants des principales entités nationales impliquées dans le projet et des représentants du PNUD et des partenaires intervenant dans le secteur. Les institutions membres du comité seront désignés par un arrêté, qui veillera notamment à une représentation des ministères impliqués dans la composante de développement local (transformation numérique, élevage, agriculture, environnement, emploi, santé, formation professionnelle, hydraulique, équipements) ; une représentation du ministère en genre de l'égalité du genre ; une représentation du ministère des finances ; une représentation du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ; le président de l'Association des maires ; les présidents des conseils régionaux concernés ; les Waly des régions concernés ; la fédération des Banques ; le Patronat ; les représentants des Unions des femmes des régions concernées. Il se réunit en session ordinaire tous les semestres sur convocation de l'un de ses co-présidents ou en session extraordinaire sur demande du président ou de deux de ses membres au moins.
Le Secrétariat de ce comité est assuré par le Directeur de l'Electricité et de la Maitrise de l'Energie (DEME) avec l'appui de la CPERER.
Le Comité examine, d'une manière générale, toutes les questions utiles pour l'orientation, le contrôle et le suivi des activités et de la gestion de la CPERER, notamment :

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

• Assurer le suivi général de l'avancement du Programme d'Electrification Rurale en Zones Isolées (PERZI) et les différents programmes/projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables et de l'électrification rurale aux fins de la réalisation de ses objectifs et résultats et veiller à ce qu'ils demeurent conformes aux politiques et objectifs de développement du sous-secteur de l'électrification rurale ;
• Assurer le rôle de leadership stratégique et faire office de mécanisme de coordination pour l'ensemble des partenaires concernés ;
• Faciliter la coordination entre les différentes entités du Gouvernement et des Partenaires Techniques et Financiers de la Mauritanie dont les contributions sont nécessaires à la mise en œuvre du Programme,
• Appuyer l'élaboration, l'examen et l'adoption des changements institutionnels, légaux et réglementaires nécessaires pour concourir aux objectifs du Programme et surmonter les obstacles connexes, tels que les problèmes fonciers liés à l'implantation des infrastructures ;
• Faciliter et promouvoir d'autres mesures visant à minimiser les risques identifiés susceptibles de compromettre le succès du Programme (prise en charge des aspects sécuritaires à travers l'implication des structures concernées),
• Surmonter les situations de blocage;
• Approuver les plans de travail, les rapports d'avancement et les procédures de mise en œuvre des activités de la CPERER.

DS
OD

Le PNUD assure la qualité assurance du programme.

Le Comité de suivi a pour principales tâches :

DS
F

- Donner des orientations pour l'élaboration des Plans de Travail Annuel (PTA);
- Approuver les PTA qui seront soumis au comité de pilotage pour validation ;
- Fournir des directives et des recommandations pour s'assurer que les résultats attendus sont réalisés de façon satisfaisante et tel que planifiés ;
- Donne les orientations pour la synergie des interventions des partenaires au sein du secteur.

Le Comité Technique :

Il est coprésidé par le Directeur national et le Représentant Adjoint du PNUD, il est l'organe opérationnel du projet.

- Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de travail annuel (PTA)
- Approuver les révisions substantives et budgétaires ;
- Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités prévues dans les départements sectoriels pour garantir l'atteinte des cibles ;
- Déterminer les actions de suivi et d'évaluation nécessitant de faire éventuellement appel à une expertise spécifique en dehors de l'équipe du projet et préparer les dossiers techniques à cette fin ;
- Faire la revue des rapports de mise en œuvre.

Il se compose des experts opérationnels des différents acteurs impliqués dans le PERZI et ses composantes. Le comité technique se subdivise lui-même en 3 Comités Techniques Sectoriels suivant les composantes du PERZI :

- Comité Technique Sectoriel : Mini centrales solaires
- Comité Technique Sectoriel : Renforcement des capacités
- Comité Technique Sectoriel : PADC (Programme Accéléré de Développement Communautaire)

Le Secrétariat du Comité Technique est assuré par le Coordonnateur de la CPERER. La présidence des sous-comités sectoriels est assurée par un représentant de l'Etat dans le domaine (ministère ou agences publique). Le collectif des Présidents de sous-comité techniques sectoriels se réunit une fois par mois avec le DEME pour apprécier les avancées sectorielles et fixer les priorités trimestrielles et mensuelles.

Le Directeur National du Projet (DNP)

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

Le DNP est le point focal en termes de responsabilités et d'obligation de rendre compte au niveau de l'agence nationale de mise en œuvre[15]. Il est désigné par l'agence de mise en œuvre parmi son personnel ayant rang de directeur ou à niveau supérieur. Il travaille à temps partiel pour le projet et, est tenu de consacrer aux activités de ce dernier un temps raisonnable. Il supervise, le cas échant le travail de la CPERER.

Son rôle et ses responsabilités sont déclinés ci-dessous :

- Superviser la bonne exécution et la mise en œuvre du projet pour obtenir les produits et résultats prévus ;
- Veiller à la bonne utilisation des ressources du projet ;
- Jouer le rôle de point focal pour la coordination du projet avec l'agence d'exécution, le PNUD, le Gouvernement et les autres partenaires ;
- Veiller à ce que le plan de travail du projet soit élaboré et mis à jour, en concertation et en accord avec le PNUD ;
- Autoriser l'engagement des crédits pour l'acquisition des ressources, notamment du personnel, des consultants, des biens et services et de la formation. A ce titre, il est la seule habilité à signer les formulaires FACE et la certification des rapports combinés de dépenses ;
- Représenter l'agence nationale de mise en œuvre aux réunions du projet et aux évaluations annuelles ;
- Animer les efforts visant la constitution de partenariats susceptibles de faciliter les réalisations prévues dans le descriptif du projet ;
- Soutenir les efforts de mobilisation des ressources, afin de permettre leur augmentation lorsque des résultats ou réalisations supplémentaires sont nécessaires.

La CPERER tient lieu de l'Unité de Coordination du Projet (UCP)

La CPERER sera mise en place, composée du (de la) Coordinateur (trice), d'un Expert en Energie Renouvelable, d'un spécialiste en développement local, d'un assistant(e) aux achats, d'un Assistant(e) administratif (ve) et financier(ère)/AAF, un attaché(e) de Coordination et un chauffeur.

Le/ la Coordinateur (trice)

Le/la Coordinateur (trice) du projet travaille sous la supervision directe du Représentant Résident du PNUD, pour appuyer le Directeur national du projet et sous l'autorité du Comité de Suivi et selon les normes établies par ce comité. Les rôles et responsabilités du coordinateur sont :

- Elaborer les plans de travail annuel du projet, conformément aux activités prévues dans le cadre de résultats et de ressources du document de projet, et en étroite collaboration avec le PNUD. Ces plans de travail annuels devront être présentés au comité de suivi et soumis à l'approbation du Comité de pilotage avant mise en œuvre ;
- Evaluer les ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités prévues dans le plan de travail, et en conformité avec les estimations budgétaires fournies par le document de projet ;
- Assurer la mise en œuvre des activités du projet et la production des résultats escomptés, selon les normes de qualité et de temps imparties et en conformité avec le document de projet ;
- Identifier toute nécessité de changement et faire part de ces nécessités au Comité de pilotage via le DNP et par le biais de recommandations en vue d'assurer une gestion efficace de ce changement ;
- Coordonner avec le Comité de Suivi et l'assurance qualité du projet désignée par le Comité, afin d'assurer la cohérence globale de la mise en œuvre du projet ;
- Gérer les agents de mise en œuvre des activités (consultants, prestataires de services) ;
- Préparer les termes de référence des consultants nationaux et internationaux et définir leurs tâches, telles que prévues par le projet ;
- Gérer, en concertation avec le DNP, tous les aspects financiers et administratifs du projet pour assurer une bonne exécution et une mise en œuvre du projet afin d'obtenir les produits et résultats attendus ;

[15]Voir TdRs du DNP en annexe 3

- Faire la revue des rapports de progrès élaborés par le conseiller technique national tels que définis par les modalités de suivi du projet dans le document de projet, pour informer le Comité de Pilotage sur l'état d'avancement du projet, selon les mécanismes et la fréquence établis dans le document de projet ;
- Appuyer le DNP dans la préparation et le suivi des réunions du comité de pilotage. Assurer le secrétariat du Comité de pilotage au cours de ses réunions ;
- Développer un réseau actif de partenaires et assurer une bonne coordination entre eux ;
- Veiller à ce que l'exécution des activités du projet ne fasse pas double emploi avec celles d'autres intervenants. A cet effet, il/elle veillera à un dialogue étroit avec les autres acteurs intervenant dans le domaine ;
- Identifier et solliciter, pour assurer une mise en œuvre de qualité, tout appui technique jugé nécessaire ou ayant une valeur ajoutée dans la mise en œuvre du projet ;
- Utiliser l'expertise locale des autres agences des Nations Unies œuvrant dans le même domaine d'intervention, des universités, de la société civile, des ONG et de tout autre acteur dont l'expertise pourrait représenter une valeur ajoutée pour le projet ;
- Identifier les expertises nationales ou internationales en vue de réaliser les activités spécifiques selon des normes de qualité.

DS OD

DS F

Le Coordonnateur de la CPERER est le Conseiller Energie PNUD.

L'Assistant(e) Administratif (ve) et Financier (ère)

L'AAF travaille sous la supervision du/ de la coordinateur (trice) (ou sous la supervision du DNP sile projet ne dispose de coordinateur national) et a rôles et responsabilités de :

- Tenir le secrétariat lors des différentes réunions du projet et préparer les procès-verbaux ;
- Accueillir et orienter les interlocuteurs et collaborateurs du projet ;
- Préparer les correspondances, courriers ou tout autre document qui lui sera soumis (saisie, impression, photocopie, reliure, etc....) ;
- Classer et archiver les documents, gérer et sauvegarder la documentation physique et informatique ;
- Veiller à la bonne exploitation des moyens et outils de fonctionnement du projet ;
- Rechercher et mettre en forme l'information produite par le projet ;
- Contribuer à la préparation des missions des partenaires du projet et plus particulièrement les partenaires directs (bailleurs, Institutions internationales chargées des formations, consultants) ;
- Tenir la comptabilité et les documents comptables et réaliser, à la clôture de chaque exercice, l'inventaire physique du mobilier et du matériel du projet ;
- Elaborer des rapports comptables conformément aux recommandations du manuel de procédures de l'exécution NEX ;
- Assurer l'exhaustivité et l'exactitude des comptes comptables ;
- Assurer l'approvisionnement et la gestion des consommables.

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

VIII. CADRE JURIDIQUE

Le présent Document de projet est l'instrument défini à l'article 1 de l'Accord de base type en matière d'assistance (« SBAA ») entre le gouvernement de [pays] et le PNUD, signé le [date]. Toutes les références faites dans le SBAA à « l'Organisation chargée de l'exécution » sont réputées faire référence au « Partenaire de réalisation ».

Le présent projet sera réalisé par [nom de l'organisme] (« Partenaire de réalisation ») conformément à ses réglementations financières, règles, pratiques et procédures, seulement dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux principes du Règlement financier et des Règles de gestion financière du PNUD. Lorsque la gouvernance financière d'un Partenaire de réalisation ne prévoit pas les mesures nécessaires pour garantir le meilleur rapport qualité/prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale effective, c'est la gouvernance financière du PNUD qui s'applique.

1. Conformément aux dispositions de l'Article III du SBAA *[ou des Dispositions supplémentaires du Document de projet]*, la responsabilité de la sécurité du Partenaire de réalisation et de son personnel et de ses biens, et de la propriété du PNUD sous la garde du Partenaire de réalisation, relève du Partenaire de réalisation. À cette fin, le Partenaire de réalisation devra :
   a) Mettre en place un plan de sécurité approprié et veille à son administration, compte tenu de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est réalisé;
   b) Assumer tous les risques et toutes les responsabilités liées à la mise en œuvre de la sécurité du Partenaire de réalisation et assure la mise en œuvre complète du plan de sécurité.

DS OD

2. Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer que des modifications y soient apportées si nécessaire. Le défaut de mise en place et de mise en œuvre d'un plan de sécurité approprié tel que requis en vertu du présent document sera réputé constituer un manquement aux obligations du Partenaire de réalisation au titre du présent Document de projet.

DS F

3. Le Partenaire de réalisation convient de déployer tous les efforts raisonnables pour faire en sorte qu'aucuns des fonds du PNUD reçus en vertu du Document de projet ne soient utilisés pour financer des personnes physiques ou morales associées au terrorisme et à ce que les bénéficiaires de toute somme remise par le PNUD dans le cadre de ces dispositions ne figurent pas sur la liste administrée par le Comité du Conseil de sécurité établie en vertu de la résolution 1267 (1999), laquelle liste peut être consultée à https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

4. La durabilité sociale et environnementale du projet sera favorisée par l'application des normes du PNUD en la matière (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilisation connexe (http://www.undp.org/secu-srm).
5. Le Partenaire de réalisation est tenu : a) de mener les activités liées au projet et au programme en accord avec les normes du PNUD en matière sociale et environnementale, b) de mettre en œuvre tout plan de gestion ou d'atténuation élaboré pour le projet ou programme en conformité avec ces normes, et c) de s'employer de manière constructive et opportune à répondre à toute préoccupation et plainte émise par le biais du mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et autres parties prenantes au projet soient informées du mécanisme de responsabilisation et y aient accès.
6. Tous les signataires du Document de projet sont tenus de coopérer de bonne foi à toute activité d'évaluation des engagements ou de respect des normes sociales et environnementales du PNUD en rapport avec le programme ou projet. Ceci inclut l'octroi de l'accès aux sites du projet au personnel correspondant et aux informations et à la documentation.
7. Le Partenaire de réalisation prendra des mesures appropriées de prévention du mésusage des fonds, de la fraude ou de la corruption du fait de ses personnels officiels, des consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires dans la réalisation du projet ou l'emploi des fonds du PNUD. Le Partenaire de réalisation veillera à ce que ses politiques de gestion financière et de lutte contre la corruption et la fraude soient en place et appliquées pour tous les financements reçus provenant du PNUD ou acheminés par l'intermédiaire de celui-ci.

8. Les exigences énoncées dans les documents suivants en vigueur à la date de la signature du Document de projet s'appliquent au Partenaire de réalisation : a) la Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et b) les Directives relatives aux enquêtes du Bureau de l'audit et des enquêtes du PNUD. Le Partenaire de réalisation accepte les exigences énoncées dans les documents ci-dessus, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à www.undp.org.

9. Au cas où il s'impose de procéder à une enquête, le PNUD a l'obligation d'enquêter sur tout aspect de ses projets et programmes. Le Partenaire de réalisation est tenu d'accorder sa pleine coopération, notamment en mettant à disposition le personnel et la documentation appropriée et en accordant l'accès aux locaux du Partenaire de réalisation (et à ceux de ses consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires) à ces fins, à des heures et dans des conditions raisonnables ainsi que peut l'exiger l'objet de l'enquête. Au cas où l'exécution de cette obligation serait sujette à une limite, le PNUD consulte le Partenaire de réalisation pour trouver une solution.

10. Les signataires du présent Document de projet s'informent promptement les uns les autres de tout cas éventuel d'emploi inapproprié de fonds ou d'allégation crédible de fraude ou de corruption en respectant dûment la confidentialité de cette information.

DS OD

Lorsque le Partenaire de réalisation a connaissance de ce qu'un projet ou une activité du PNUD fait, en tout ou en partie, l'objet d'une enquête pour donner suite à des allégations de fraude/corruption, il en informe le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui en informe promptement le Bureau de l'audit et des enquêtes (OAI) du PNUD. Le Partenaire de réalisation fournit des informations périodiques au responsable du PNUD dans le pays et à l'OAI sur le statut de ladite enquête et sur les actions y afférentes.

DS F

11. *Choisissez l'une des trois options suivantes :*
Option 1 :Le PNUD a droit à un remboursement de la part du Partenaire de réalisation de tous les fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de réalisation au titre du présent accord ou de tout autre. Le recouvrement de cette somme par le PNUD ne diminue pas ni ne limite les obligations du Partenaire de réalisation au titre du présent Document de projet.

Lorsque ces fonds n'ont pas été remboursés au PNUD, le Partenaire de réalisation convient que les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

N.B. : Le terme « Document de projet » employé dans la présente clause est à interpréter comme incluant tout accord subsidiaire pertinent au titre du présent Document de projet, et notamment les accords avec les parties responsables, sous-traitants et sous-bénéficiaires.

12. Chaque contrat émis par le Partenaire de réalisation en rapport avec le présent Document de projet doit comporter une disposition selon laquelle il ne saurait être accordé, reçu ou promis de redevances, gratifications, rabais, cadeaux, commissions ni autres paiements, si ce n'est ceux qui figurent dans la proposition, en rapport avec le processus de sélection ou de réalisation du contrat, et prévoyant que le bénéficiaire de fonds du Partenaire de réalisation est tenu de coopérer avec toute enquête et tout audit après paiement quels qu'ils soient.

13. Au cas où le PNUD s'adresserait aux autorités nationales compétentes pour entamer des actions juridiques appropriées concernant toute faute présumée en rapport avec le projet, le gouvernement veillera à ce que lesdites autorités nationales enquêtent activement sur l'affaire et prennent des mesures

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

juridiques appropriées à l'encontre de toutes les personnes dont il aura été déterminé qu'elles ont participé à la commission de la faute, recouvrent les fonds et rendent tous les fonds recouvrés au PNUD.

14. Le Partenaire de réalisation est tenu de veiller à ce que toutes ses obligations énoncées dans la présente section à la rubrique « gestion des risques » soient transférées à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire et à ce que toutes les clauses de la présente section intitulées « clauses standard de gestion des risques » soient incluses, *mutatis mutandis*, dans tous les sous-contrats ou sous-accords conclus suite au présent Document de projet.

Clauses Spéciales. En cas de financement par le gouvernement dans le cadre du projet, les clauses suivantes devraient être insérées :
Veuillez insérer l'échéancier de paiements et les coordonnées bancaires du PNUD.

1. La valeur du paiement, si celui-ci est effectué dans une devise autre que le dollar des États-Unis, est déterminée en appliquant le taux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur à la date du paiement. En cas de modification du taux de change opérationnel des Nations Unies avant l'utilisation complète des fonds par le PNUD, la valeur du solde toujours en sa possession à ce moment-là est ajustée en conséquence. Si dans un tel cas, une perte de valeur des fonds restants est enregistrée, le PNUD en informe le Gouvernement afin de déterminer s'il pourrait fournir un financement supplémentaire. En l'absence de financement supplémentaire, le PNUD peut réduire, suspendre ou mettre un terme à l'assistance devant être fournie dans le cadre du projet. Toutes pertes (y compris, sans toutefois s'y limiter, celles résultant de fluctuations de taux de change) sont imputées au projet.

DS OD

2. L'échéancier des paiements ci-dessus tient compte de l'obligation d'effectuer les paiements avant l'exécution des activités envisagées. Il peut être modifié en fonction de l'avancement du projet.

DS F

3. Les fonds sont perçus et administrés par le PNUD conformément à ses règles, règlements, politiques et procédures.

4. Tous les comptes et états financiers doivent être libellés en dollars des Etats-Unis.

5. Si des augmentations [imprévues] de dépenses ou d'engagements sont anticipées ou réalisées (qu'elles soient dues à des facteurs d'inflation, à une fluctuation de taux de change ou à d'autres impondérables), le PNUD soumet au Gouvernement en temps opportun une estimation du financement complémentaire estimé nécessaire. Le Gouvernement fait tout son possible pour obtenir les fonds supplémentaires requis.

6. Si les paiements mentionnés ci-dessus ne sont pas reçus conformément à l'échéancier des paiements, ou si le financement supplémentaire requis conformément au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être obtenu du Gouvernement ou d'autres sources, le PNUD peut réduire, suspendre ou mettre un terme à l'assistance devant être fournie dans le cadre du projet en vertu de cet Accord.

7. Conformément aux décisions et directives du Conseil d'Administration du PNUD reprises dans sa Politique de recouvrement au titre des mécanismes de financement autres que les ressources de base, les coûts indirects encourus par les entités du siège et des bureaux de pays du PNUD pour la fourniture de services généraux de gestion et d'appui sont imputés à la contribution. Pour couvrir ces coûts de gestion et d'appui, il sera imputé à la contribution une redevance équivalente à %. En outre, sous réserve qu'ils soient associés sans ambiguïté à ce projet, tous les coûts directs de mise en œuvre, y compris ceux encourus par le partenaire de réalisation, sont inscrits au budget du projet et imputables à un poste budgétaire spécifique et sont en conséquence à la charge du projet.

8. La propriété des équipements, fournitures et autres biens financés à partir de la contribution est dévolue au PNUD. Les questions relatives au transfert de propriété par le PNUD sont déterminées conformément aux politiques et procédures pertinentes du PNUD.

9. Le paiement ainsi que le projet sont exclusivement soumis aux procédures de vérification interne et externe prévues aux Règlement financier, règles de gestion financière et politiques du PNUD.

DS
OD

DS
F

DocuSign Envelope ID: 1E18343D-4CCC-4A37-9777-744CC46D48F1

IX. ANNEXES

1. **Rapport sur l'assurance qualité du projet**

2. **Modèle d'Examen préalable social et environnemental** [anglais][français][espagnol], comprenant les évaluations sociales et environnementales ou les plans de gestion additionnels selon qu'il convient. *(N.B.: L'examen préalable des NES n'est pas requis pour les projets pour lesquels le PNUD est uniquement l'agent d'administration et/ou les projets consistant exclusivement de rapports, de la coordination d'évènements, de formations, d'ateliers, de réunions, de conférences, de la préparation de matériels de communication, du renforcement des capacités des partenaires à participer aux négociations et aux conférences internationales, de la coordination de partenariats et de la gestion de réseaux, ou les projets régionaux/globaux sans activités au niveau national).*

DS OD

3. **Analyse des risques**. Utilisez le modèle de Registre des risques standard. Veuillez vous reporter aux instructions contenus dans la Description des éléments à livrer du Registre des risques.

DS F

4. **Évaluation des capacités :** Résultats des évaluations des capacités du Partenaire de réalisation (y inclus de la micro-évaluation de la HACT).

5. **Termes de référence du Comité de pilotage du projet et termes de référence des postes clés de gestion.**
