DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

6/6/2022

UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Start Year: 2022

End Year: 2024

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: Project Approval

Budget (US$) as of Last Revision on 06-June-2022

Donor	Fund	Amount
BRA-ENEL	30000 Programme Cost Sharing	1,733,569.43
Total Budget (2022 and Beyond)		1,733,569.43
Total Utilization (2021 and Prior)		0.00
Project Total		1,733,569.43
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

O propósito central do projeto é promover o fortalecimento da capacidade dos atores de São Gonçalo do Gurguéia e dos municípios do seu entorno no enfrentamento das principais questões ambientais da região, com foco especial nas áreas de desertificação e na aplicação de tecnologias sociais inovadoras para acelerar o desenvolvimento sustentável das populações afetadas. Para tanto, o projeto contempla não apenas soluções para mitigar os problemas ambientais no município – incluindo um programa educativo para o ensino público - mas também endereça um conjunto de ações destinadas a combater a desertificação e a implementação de técnicas e práticas que impulsionem a produção de alimentos a partir do fomento ao associativismo, fortaleça a estrutura de gestão do manejo sustentável do solo e apoie as cadeias produtivas regionais com maior potencial de promover desenvolvimento sustentável. Estas ações serão complementadas com a aplicação de tecnologias que contribuam para ampliar o acesso do público beneficiário à água, saneamento básico, segurança alimentar e conservação do solo e biodiversidade locais.

O projeto está estruturado para desenvolver os seguintes produtos:

1. Dados, indicadores e perfis do público beneficiário produzidos, incluindo a perspectiva de gênero, para identificar as tecnologias sociais adequadas e as demandas e potencialidades locais para acelerar o desenvolvimento sustentável do município e do entorno territorial adotando como referência os ODS;
2. Fortalecidas as capacidades dos beneficiários do projeto para promover a agricultura sustentável, com a melhoria da gestão da água, saneamento básico e respeito à conservação do solo e biodiversidade locais;
3. Tecnologias sociais implantadas, distribuição de água e programas de produção sustentável de alimentos introduzidos;
4. Gestão eficiente do projeto e comunicação social assegurada.

Agreed by: GOVPI — DocuSigned by: Maria Regina Sousa 1F3C10B06AF840A...

Agreed by: ABC — DocuSigned by: katyuscia Argueta

Agreed by: PNUD/BRASIL — Ruy Pereira, Diretor, Agência Brasileira de Cooperação - ABC — 01/07/2022

Agreed by: Data: 05-Jul-2022

DS DM

DS IL

DS MB

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
00131656 BRA/22/007 Agricultura Sustent	Activity1.1	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	72600	Grants	41,607.97
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	3,328.64
	Activity1.2	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	14,987.40
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,120.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,448.59
	Activity1.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	8,978.54
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	1,100.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie:	2,244.63
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,110.65
	Activity1.4	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	4,420.94
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	1,100.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,730.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie:	2,311.70
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	845.00
	Activity2.2	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	3,362.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	780.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie:	2,102.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	499.52
	Activity2.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	3,362.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,340.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie:	2,627.50
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	666.36
	Activity2.4	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	2,600.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie:	7,355.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	921.20

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
	Activity2.5	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,340.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	187.20
	Activity2.8	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	10,510.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,141.60
	Activity3.1	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	9,061.68
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,900.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	302,171.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	25,210.61
	Activity3.2	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	72600	Grants	62,400.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	4,992.00
	Activity3.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	8,989.60
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	719.17
	Activity4.1	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	4,186.80
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	3,813.08
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	764.79
	Activity4.2	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	2,018.69
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	462.30
	Activity4.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	35,181.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,900.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	4,530.74
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	3,488.95
	Activity4.4	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	3,300.00

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
	Activity4.4	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,120.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	3,300.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	777.60
	Activity4.6	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	124.80
TOTAL									**630,301.25**
GRAND TOTAL									**630,301.25**

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
00131656 BRA/22/007 Agricultura Sustent	Activity1.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	8,978.54
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	1,100.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	2,244.63
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,110.65
	Activity1.4	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	4,420.94
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	1,100.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,730.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	1,155.80
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	752.54
	Activity2.1	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	8,335.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	4,680.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	6,304.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,721.52
	Activity2.2	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	3,362.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	780.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	2,102.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	499.52
	Activity2.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	3,362.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,340.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	9,631.50
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,226.68
	Activity2.4	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	8,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,340.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	3,153.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,095.44

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
	Activity2.5	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	14,000.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,340.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	13,915.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	2,420.40
	Activity2.6	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	6,240.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	22,800.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	2,499.20
	Activity2.7	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	4,533.33
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	7,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,340.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	16,822.43
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	2,071.66
	Activity2.8	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	3,300.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	8,660.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,081.60
	Activity3.2	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	72600	Grants	124,880.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	9,984.00
	Activity3.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	17,979.20
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,438.34
	Activity3.4	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	16,448.60
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,120.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	8,800.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	2,269.49
	Activity3.5	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	16,613.08
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
	Activity3.5	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,120.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companies	105,246.67
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	10,174.38
	Activity3.6	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	6,041.12
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	3,744.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,340.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companies	59,813.08
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	5,755.06
	Activity4.1	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	4,186.80
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	780.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	397.34
	Activity4.2	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	2,018.69
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	1,100.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	780.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	311.90
	Activity4.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	70,362.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	7,800.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companies	9,061.68
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	6,977.89
	Activity4.4	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	6,600.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companies	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,180.80
	Activity4.5	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	5,302.50
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	5,500.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,120.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,113.80

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
	Activity4.6	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	4,242.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	600.16
	Activity4.8	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	74100	Professional Services	9,439.25
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	755.14
TOTAL									**748,946.35**
GRAND TOTAL									**748,946.35**

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
00131656 BRA/22/007 Agricultura Sustent	Activity1.5	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	10,510.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,141.60
	Activity2.7	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	2,266.67
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	1,100.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,340.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	16,822.43
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,802.33
	Activity3.2	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	72600	Grants	62,400.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	4,992.00
	Activity3.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	8,889.60
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	719.17
	Activity3.5	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	8,306.54
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,120.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	52,623.33
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	5,299.99
	Activity3.6	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	3,020.56
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,496.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	2,340.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	628.52
	Activity3.7	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	9,439.25
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,120.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,180.74
	Activity4.1	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	2,093.40

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
	Activity4.1	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	780.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	229.87
	Activity4.2	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	780.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,100.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	150.40
	Activity4.3	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	35,181.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,900.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	4,530.84
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	3,488.95
	Activity4.4	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	3,300.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	3,300.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	652.80
	Activity4.5	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	5,302.50
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	5,500.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,120.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	5,255.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	1,534.20
	Activity4.6	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	4,242.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	2,200.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	1,560.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	640.16
	Activity4.7	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	71300	Local Consultants	18,157.40
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71400	Contractual Services - Individ	6,600.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	71600	Travel	3,120.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	72100	Contractual Services-Companie	10,100.00
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	3,030.19

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS LGK

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00143571

Project Title: BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui

Report Date: 6/6/2022

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
	Activity4.8	6/6/2022	31/5/2024	UNDP	30000	BRA-ENEL	74100	Professional Services	9,439.25
				UNDP	30000	BRA-ENEL	75100	Facilities & Administration	755.14
TOTAL									**354,321.83**
GRAND TOTAL									**354,321.83**

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS
LGK

United Nations Development Programme
00143571 - BRA/22/007 - Desenvolvimento Sul do Piauí
Revisão Inicial - 06Jun2022

Main Source of Funds: DIM
Executing Agency: UNDP

OUTPUTS 131656							
Acct	**Donor**	**Fund**		**Total**	**2022**	**2023**	**2024**
51005	ENEL 14018	30000	Net Contrib.	1,605,196.88	583,612.27	693,508.84	328,075.77
		3rd PCS	GMS. %	8.00	8.00	7.99	8.00
			GMS.	128,372.55	46,688.98	55,437.51	26,246.06
			Total	1,733,569.43	630,301.25	748,946.35	354,321.83
51005	**C/S Total**		**Total Net Contrib.**	**1,605,196.88**	**583,612.27**	**693,508.84**	**328,075.77**
			Total GMS. %	**8.00**	**8.00**	**7.99**	**8.00**
			Total GMS.	**128,372.55**	**46,688.98**	**55,437.51**	**26,246.06**
			GRANT TOTAL	**1,733,569.43**	**630,301.25**	**748,946.35**	**354,321.83**

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

DS
LGK

United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: **BRA/22/007 - Desenvolvimento Sul do Piauí**

Atlas Award Number: **00143571**
Atlas Project Number: **00131656**

Main Source of Funds: **Private Sector**
Executing Agency: **UNDP**
Budget Currency: **USD**

OUTPUTS 131656						
Account	**Fund/Donor**	**Year**	**Date**	**Budgeted Amount**	**Scheduled Amount**	**Balance**
51005	**30000/14018 ENEL**					
		2022	30/06/2022		1,733,569.43	
				630,301.25	1,733,569.43	-1,103,268.18
		2023				
				748,946.35	0.00	-354,321.83
		2024				
				354,321.83	0.00	0.00
		Grand Total		**1,733,569.43**	**1,733,569.43**	**0.00**

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 5CCA1035-0C7D-4457-BA1F-88BC5584ADCA

Título do Projeto: Desenvolvimento Sustentável de Áreas de Desertificação no Sul do Piauí

Número do Projeto: BRA/22/007

Agência Executora: PNUD

Data Início: 06/06/2022 **Data Término:** 31/05/2024 **Data do PAC:** 16/09/2021

Breve Descrição
O propósito central do projeto é promover o fortalecimento da capacidade dos atores de São Gonçalo do Gurguéia e dos municípios do seu entorno no enfrentamento das principais questões ambientais da região, com foco especial nas áreas de desertificação e na aplicação de tecnologias sociais inovadoras para acelerar o desenvolvimento sustentável das populações afetadas. Para tanto, o projeto contempla não apenas soluções para mitigar os problemas ambientais no município – incluindo um programa educativo para o ensino público - mas também endereça um conjunto de ações destinadas a combater a desertificação e a implementação de técnicas e práticas que impulsionem a produção de alimentos a partir do fomento ao associativismo, fortaleça a estrutura de gestão do manejo sustentável do solo e apoie as cadeias produtivas regionais com maior potencial de promover desenvolvimento sustentável. Estas ações serão complementadas com a aplicação de tecnologias que contribuam para ampliar o acesso do público beneficiário à água, saneamento básico, segurança alimentar e conservação do solo e biodiversidade locais. O projeto está estruturado para desenvolver os seguintes produtos: 1. Dados, indicadores e perfis do público beneficiário produzidos, incluindo a perspectiva de gênero, para identificar as tecnologias sociais adequadas e as demandas e potencialidades locais para acelerar o desenvolvimento sustentável do município e do entorno territorial adotando como referência os ODS; 2. Fortalecidas as capacidades dos beneficiários do projeto para promover a agricultura sustentável, com a melhoria da gestão da água, saneamento básico e respeito à conservação do solo e biodiversidade locais; 3. Tecnologias sociais implantadas, distribuição de água e programas de produção sustentável de alimentos introduzidos; 4. Gestão eficiente do projeto e comunicação social assegurada.

Contribui para o Resultado 3 do UNDAF: Capacidades institucionais fortalecidas para promover as políticas públicas, sua coerência e implementação, para a gestão sustentável de recursos naturais e serviços ecossistêmicos e o combate às mudanças do clima e seus efeitos adversos Contribui para o Resultado 2 do CPD: Planeta: Gestão sustentável dos recursos naturais para as gerações atuais e futuras GEN 2	**Valor total do projeto**	**$ 1,750,905.17**
	Origem dos Recursos	
	Doador:	**$ 1,750,905.17**
	PNUD:	
	In-Kind:	
	Não financiado	

Agência Brasileira de Cooperação	PNUD	Governo do Estado do Piauí
Nome: Embaixador Ruy Pereira Cargo: Diretor da ABC	Nome: Katyna Argueta Cargo: Represente Residente	Nome: Maria Regina Sousa Cargo: Governadora do Estado do Piauí
Data: 01/7/2022	Data: 05-Jul-2022	Data: 15-jun-2022

Ruy Pereira
Diretor
Agência Brasileira de Cooperação - ABC

DocuSigned by: Katyna Argueta 2D25F5FCDC7421...

DocuSigned by: Maria Regina Sousa 1F3C10B06AF840A...

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

I. DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO

O Estado do Piauí localiza-se na região Nordeste do Brasil e tem uma população estimada em 3.273.227 habitantes[1], com densidade demográfica de 12,14 hab./km² e um rendimento mensal domiciliar per capita de R$ 827,00. O Estado registra um IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano de 0,697 (2017), o que o coloca na faixa de Desenvolvimento Humano Médio. O mapa do desenvolvimento humano mostra que dos 224 municípios do estado do Piauí, nenhum deles apresenta IDHM muito alto (igual ou superior a 0,800), e apenas 1 apresenta IDHM alto (a capital Teresina).

O estado é dividido em 12 territórios de desenvolvimento, todos com um Conselho Territorial formado por representantes da sociedade civil e do poder público. Estas unidades possibilitam a ação governamental mais ágil nos territórios e visam a promoção do desenvolvimento sustentável do estado por meio da democratização dos programas, das ações e da regionalização do orçamento.

O Território Chapada das Mangabeiras, onde está localizado o município de São Gonçalo do Gurguéia, é formado por 25 municípios e ocupa uma área de 65.693 km2, correspondendo a 39,7% da Macrorregião de Desenvolvimento Cerrados e a 19,8% da Bacia hidrográfica do Parnaíba, segunda maior da região nordeste abrangendo uma área de 333.952 km², dos quais 75% estão no Piauí e onde vivem cerca de 5 milhões de habitantes[2].

Este território abriga uma das áreas mais impactadas pelo processo de desertificação do planeta, justamente na região onde estão localizados São Gonçalo do Gurguéia – foco central do projeto - e os 04 municípios localizados no seu entorno: Gilbués, Corrente, Barreiras do Piauí e Riacho Frio e (SALES, 2003), que possuem as maiores áreas afetadas pelo fenômeno no estado e que também serão beneficiados com as ações deste projeto.

[1] IBGE - 2019

[2] São 277 municípios sendo 223 piauienses, 35 maranhenses e 19 cearenses. Entre os demais Territórios que formam a bacia, é o que tem a segunda maior extensão territorial e a menor densidade demográfica.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Mapa 1 – Território Chapada das Mangabeiras

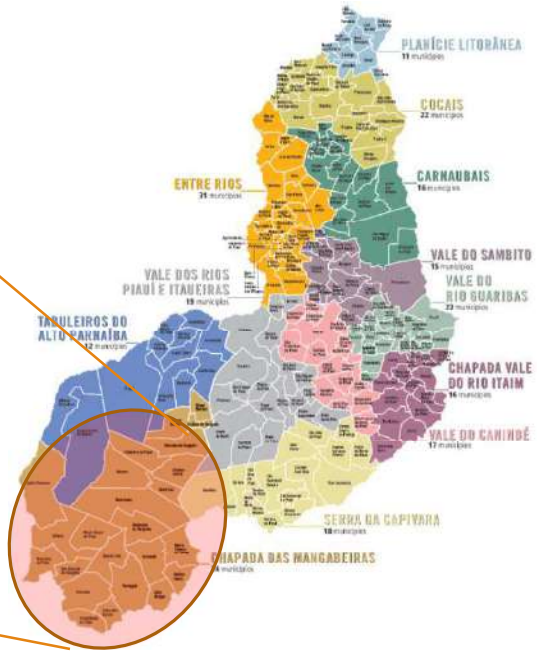

Mapa 2 – Territórios de Desenvolvimento do Estado do Piauí

Com índice médio de vulnerabilidade à pobreza acima de 71% e mais de 33% da população vivendo na extrema pobreza, o Território da Chapada das Mangabeiras apresenta diversos desafios sociais. Com IDHM médio no nível baixo, questões como educação – evidenciada pelo baixo IDEB – e saúde – mesmo com bons índices de longevidade da população – também representam obstáculos para o desenvolvimento sustentável do território e seus municípios.

No território todos os municípios superaram a meta de combate à fome, mas ainda remanesce o desafio de superação da pobreza, pois cerca de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza. Na educação, somente 38% das crianças concluíram o ensino fundamental. O enfrentamento à mortalidade na infância ainda é outro desafio a ser enfrentado pelos municípios, assim como a universalização do saneamento básico.

O acesso universal a água e saneamento é essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribui para melhorias em áreas centrais para o desenvolvimento humano sustentável, como saúde. Por isso, é também uma preocupação da Agenda 2030. No território da Chapada das Mangabeiras, a porcentagem da população atendida com abastecimento de água alcançou 60,3%, percentual ainda bastante distante da cobertura alcançada pelo Estado e da meta de acesso universal. No que tange ao esgotamento sanitário, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), registra apenas 3 dos 25 municípios do território com população atendida com esgotamento sanitário. No Piauí, esse índice é de 14,36% e no Brasil, de 51,9%.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

O Município de São Gonçalo do Gurguéia

São Gonçalo do Gurguéia é um município do Piauí localizado a 798 quilômetros da capital Teresina, com área territorial é de 1.385,311 km², no extremo Sul do Estado - Território. Possui uma população estimada em 3.057 habitantes, com uma densidade demográfica de 2,04 hab./km². (IBGE – estimativa 2020). A população rural é superior a urbana, atingindo 58% do total, com 1.752 habitantes. O IDHM atinge 0,560 (IBGE 2010), na faixa baixo e ocupando a 5.049ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros.

Em relação ao trabalho e renda no município, em 2017 o salário médio mensal situava-se em 2,2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de apenas 7.3%. Na comparação com os outros municípios do país, situa-se na posição 4.351 de 5.570. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, registrava 56.3% da população nessas condições. O PIB per capita anual do município é de R$ 4,98 mil (4.138º de 5.570).

A análise dos indicadores de educação de São Gonçalo do Gurguéia mostram que a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade atinge 97,4 %, e o IDEB – anos iniciais atinge apenas os índices de 4,0 para o ensino fundamental (Rede pública) [IBGE/2018] e 3,8 para os anos finais do ensino fundamental, ocupando a posição 5.066 de 5.570 municípios no País.

Em termos de saúde, o município apresenta uma taxa de mortalidade infantil média de 25 para 1.000 nascidos vivos e as internações devido a diarreias são de 1,2 para cada 1.000 habitantes, ocupando as posições de 649 e 2.419 em relação aos demais 5.570 municípios do país. Estes índices relacionam-se diretamente com o baixo número de domicílios com esgotamento sanitário adequado - apenas 16,5% do total, e nenhum com tratamento (SNIS). Destes, 49,59% são atendidos pelo sistema de abastecimento da distribuidora, mas concentrados na área urbana do município. (IBGE – Censo 2010).

Outros dados que revelam a pobreza e o ambiente propício à incidências de doenças em São Gonçalo do Gurguéia pode ser observado no baixo índice de domicílios com banheiro, encontrado em apenas 16,53% do total das residências e majoritariamente concentrados na zona urbana, fato que evidencia a situação crítica no contexto rural do município. Vale ressaltar ainda que apenas 22% destes domicílios são atendidos pelo serviço de coleta de lixo (IBGE, Censo Demográfico – 2010).

Ainda que o foco das ações estejam centralizados em São Gonçalo do Gurguéia, outros 4 municípios, localizados no seu entorno e já referidos nesta apresentação, serão contemplados com as atividades previstas no Projeto, notadamente aquelas desenhadas para fortalecer a capacidade dos atores públicos e da sociedade civil no planejamento e construção de políticas e planos voltados para gerar aceleração no desenvolvimento sustentável no Território Chapada das mangabeiras. Neste sentido, serão realizados cursos, oficinas e seminários, complementados com um programa

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

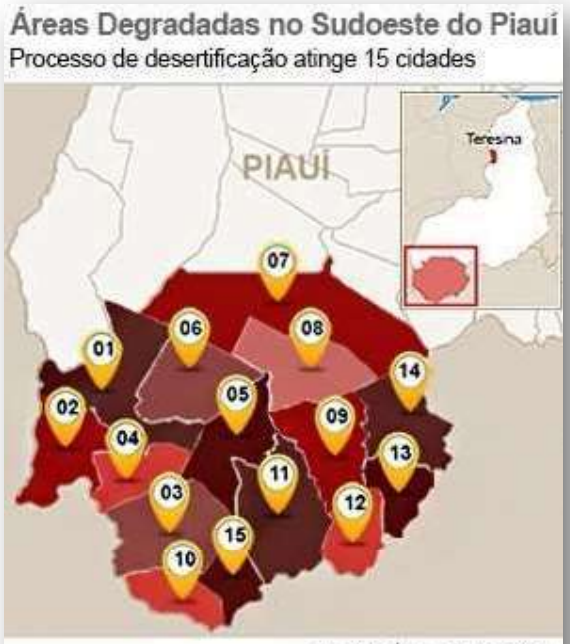

	Município	Total de Área Degradada (Km²)	Percentual de Área Degradada (%
01	Gilbués	1760,99	49,32%
02	Barreiras do Piauí	1246,46	60,15%
03	Corrente	790,53	25,33%
04	São Gonçalo do Gurguéia	697,04	49,25%
05	Riacho Frio	689,53	30,37%
06	Monte Alegre do Piauí	579,36	23,51%
07	Bom Jesus do Piauí	532,76	9,54%
08	Redenção do Gurguéia	450,41	49,97%
09	Curimatá	265,19	10,99%
10	Cristalândia	174,95	14,95%
11	Pamaguá	172,19	5,13%
12	Júlio Borges	156,85	12,70%
13	Avelino Lopes	98,57	7,47%
14	Morro Cabeça do Tempo	85,53	3,79%
15	Sebastião Barros	45,77	4,41%
	Total de áreas degradadas no Piauí	7759,56	21,64%

de educação ambiental para professores e alunos da rede pública de ensino dos 5 municípios: São Gonçalo do Gurguéia: Gilbués, Corrente, Barreiras do Piauí e Riacho frio.

Deve-se destacar que estes municípios possuem as 05 maiores áreas de desertificação do Piauí e juntos concentram 67% de toda a área do Estado (Fonte: SEMAR – PI).

Empreendimento de energia fotovoltaica no território

Nos últimos anos, o Estado do Piauí tem atraído grandes investimentos direcionados para a produção de energia eólica e fotovoltaica, a maior parte deles instalados em pequenos municípios com baixo índice de desenvolvimento humano e grande dificuldade de gerar melhorias expressivas no perfil sócio econômico da sua população.

Estes empreendimentos, pela dimensão e volume de recursos envolvidos, provocam mudanças importantes no contexto onde se instalam, com impactos expressivos na gestão pública, na população local e principalmente, na economia dos municípios onde se instalam e no seu entorno. A partir deste cenário, o governo do estado vem mantendo o diálogo com estas empresas com o propósito de estabelecer parcerias, a partir das metas nos ODS, para construir uma agenda de ações e projetos voltados para promover o desenvolvimento sustentável nos territórios onde atuam e assegurar o alinhamento destas iniciativas ao Planejamento territorial do Piauí.

Neste contexto, em 2019 foram iniciadas tratativas com a Enel Green Power, empresa que possui, no Piauí, usinas de geração de energia eólica nos municípios de Lagoa do Barro e Dom Inocêncio (em construção) e duas usinas fotovoltaica, em Ribeira do Piauí e São Gonçalo do Gurguéia.

A usina de geração de energia fotovoltaica instalada pela ENEL em janeiro de 2020 no município de São Gonçalo do Gurguéia gerou impactos ambientais sobre área rural afetada por desertificação, onde residem cerca de 120 famílias, com população que gira em torno de 600

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

pessoas. As obras de contenção construídas para o projeto da empresa romperam com a aumento das chuvas na região e causaram desvios no curso das águas que abastecem as propriedades onde moram estas famílias.

Diante deste fato, a empresa assinou em setembro de 2020 um Acordo Substitutivo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado – SEMAR, por meio do qual se comprometeu a adotar, com a aprovação do Ministério Público Estadual, medidas reparatórias e compensatórias no entorno da área impactada. Adicionalmente, solicitou o apoio do PNUD para desenhar e implementar um projeto - tomando como forte referência o projeto executado pelo PNUD em Sergipe[3], com o propósito de acelerar o desenvolvimento humano na região a partir da introdução de tecnologias sociais e ampliação das capacidades dos atores locais para potencializar a produção de alimentos com a adoção das boas práticas para proteção ambiental na agricultura na convicção que tais medidas fortaleceriam as capacidades locais de prevenção de situações similares e ofereceriam soluções de aumento de resiliência ao desafio perene de seca e desertificação que acomete a região.

A **desertificação** é um processo de degradação ambiental que ocorre nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas do globo por ação antrópica, com impactos negativos imediatos na qualidade de vida da população, tais como: aumento da escassez hídrica; perda da fertilidade do solo; redução da produção de alimentos; diminuição drástica das reservas de madeira; entre outras (www.mma.gov.br)

Considerando que este contexto abre oportunidades para promover ações capazes de promover desenvolvimento sustentável robusto, que aportem contribuição efetiva para elevar os indicadores de desenvolvimento humano onde são implementados, o PNUD, a partir do diálogo da Enel com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – SEMAR, construiu um projeto que contempla não apenas a solução referente às demandas ambientais e sociais geradas pelo empreendimento, mas inclui também um programa de fortalecimento da gestão pública local a partir da integração dos ODS no planejamento e da introdução de novas tecnologias de manejo e capacitação das famílias que habitam no entorno da bacia hidrográfica atingida, para assegurar um melhor aproveitamento da água e do solo e potencializar as vocações produtivas da região, reduzindo a insegurança alimentar no território.

O diálogo iniciado com a SEMAR, órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos e uso sustentável do meio ambiente, evidenciou também a necessidade do projeto endereçar soluções para gargalos mais relevantes mapeados no combate aos problemas ambientais do estado, incluindo os problemas decorrentes de queimadas, comuns na região e principal fonte de incêndios florestais.

Segundo dados do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (http://www.inpe.br), em 2019, o Piauí foi responsável por 24,7% das queimadas na região Nordeste, com 10.894 registros no ano. As ações no âmbito do Projeto também prevêem a introdução de soluções alternativas ao uso do fogo e disseminação de tecnologias de manejo conservacionistas nas práticas agrícolas nos municípios beneficiados pelo Projeto.

Desta forma, o projeto busca reforçar a governança ambiental de São Gonçalo e demais municípios no seu entorno e contribuir para aportar maior eficácia na abordagem do estado no

[3] Projeto projeto BRA/14/G32 “Manejo do Uso Sustentável da Terra no Semiárido do Nordeste Brasileiro” que tem como objetivo combater processos de desertificação e degradação da terra no semiárido do estado de Sergipe, por meio do fortalecimento da estrutura de governança do manejo sustentável da terra (SLM).

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

enfrentamento dos principais fatores de degradação da terra e desertificação, com a disseminação de práticas sustentáveis de gestão da terra para mitigar ou até mesmo reverter a degradação da terra e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e a renda nas áreas rurais.

O desafio de igualdade de Gênero na produção de alimentos na agricultura familiar

Estimativas da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) apontam que, se as mulheres tivessem o mesmo acesso aos recursos produtivos e oportunidades que os homens, elas poderiam aumentar o rendimento de suas propriedades em 20 a 30%, o que poderia aumentar a produção agrícola total de 2,5% a 4% e tirar de 100 a 150 milhões de pessoas da fome.

Evidências científicas coletadas pelo PNUD apontam também para uma ligação entre relações de gênero mais iguais nos níveis familiar e comunitário e melhores resultados agrícolas e de desenvolvimento. Por exemplo, um estudo sobre segurança alimentar em Bangladesh identificou que a participação ativa das mulheres na comunidade e seu maior controle dos ativos estão positivamente associados aos resultados da segurança alimentar.

Diante do exposto, o projeto identifica a transversalidade de gênero em todas as suas etapas como uma oportunidade de, ao mesmo tempo, empoderar meninas e mulheres naquele território, contribuindo para a redução das desigualdades de gênero, e de alcançar resultados mais efetivos na produção de alimentos e renda familiar.

Com esta abordagem, as iniciativas de instalação de tecnologias sociais e destinadas à produção de alimentos, devem proativamente e deliberadamente permitir a participação ativa, livre e significativa das mulheres em todas as fases de planejamento, tomada de decisão, monitoramento e avaliação. Como princípio, a participação das mulheres deve ser plenamente integrada, nos ramos executivos do governo e em iniciativas de entidades executoras, tais como organizações não governamentais e prestadores de serviços. A participação deve ter lugar em nível micro, médio e macro. Isso inclui iniciativas comunitárias, bem como iniciativas e tomadas de decisão nos níveis nacional, regional e internacional.

Ao garantir a participação das mulheres em todas as etapas de sua implementação, visando à promoção da igualdade de gênero, o projeto também tem a oportunidade de catalisar seus resultados. Além da importância da produção de alimentos para consumo próprio, o acesso adequado aos recursos pela mulher também eleva a renda familiar.

II. ESTRATÉGIA

O projeto foi construído com o objetivo central de promover o desenvolvimento humano das famílias afetadas pelo empreendimento solar no município de São Gonçalo do Gurgueia com a implementação de tecnologias sociais inovadoras, contribuindo para o fortalecimento da produção sustentável em áreas degradadas por desertificação, e ainda fortalecer a capacidade e resiliência dos atores regionais para melhorar o aproveitamento das potencialidades produtivas da região a partir da introdução de inovações tecnológicas de manejo sustentável do solo e da água, contribuindo para o combate aos danos causados pela desertificação.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Para atingir este objetivo, a estratégia de execução do projeto deverá adotar como forte referência ações implementadas pelo projeto BRA/14/G32 "Manejo do Uso Sustentável da Terra no Semiárido do Nordeste Brasileiro" que tem como objetivo combater processos de desertificação e degradação da terra no semiárido do estado de Sergipe, por meio do fortalecimento da estrutura de governança do manejo sustentável da terra (SLM do inglês "sustainable land management").

O PNUD será a agência responsável pela coordenação técnica e implementação das ações do projeto, que terá a participação de órgãos setoriais do Governo do Estado, em especial a SEMAR – Secretaria do Meio Ambiente, e envolvimento da SAF – Secretaria da Agricultura Familiar, uma vez que envolverá ações nas áreas ambiental e de apoio à agricultura familiar. A SEPLAN – Secretaria de Planejamento do Estado também será incluída nos processos devido ao seu mandato na temática de desenvolvimento territorial e trabalho desenvolvido com territorialização e implementação da Agenda 2030. Complementarmente, o engajamento da Seplan visa garantir o alinhamento das ações do projeto com a Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado, atualmente em construção no âmbito da Cooperação Técnica com o PNUD.

A participação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado deverá assegurar que o desenho do projeto esteja em sintonia com a política estadual de combate à desertificação e, ao mesmo tempo, gerar uma contribuição efetiva para qualificação da gestão ambiental, criando um ambiente favorável à inovação e adoção das boas práticas de SLM, aplicando a estratégia denominada Unidade de Recuperação de Área Degradada (URAD), a partir da geração de conhecimentos e aprendizagem - elegendo como principais públicos técnicos, extensionistas, agricultores, estudantes, professores, jovens e mulheres.

Experiências globais acumuladas pelo PNUD em iniciativas implementadas com parcerias na área de geração de energia fotovoltaica, inclusive com soluções já aprovadas na área de conservação e recuperação de áreas degradadas, também deverão aportar maior capacidade resolutiva e efetividade nos resultados das ações propostas.

Ainda que o foco do projeto esteja direcionado para a área socioambiental, esta iniciativa possui objetivos multidimensionais e requer necessariamente uma abordagem multisetorial, uma vez que sua implementação envolve intervenções e exige competências em diversas áreas do conhecimento para garantir o alcance e a sustentabilidade dos resultados. Neste sentido o projeto adotará como estratégia a participação ativa do poder público estadual e municipal para apoiar a promoção de capacidades e o acompanhamento das atividades, e parceria com instituições da sociedade civil que atuam no território para assegurar o engajamento e o aprofundamento dos diagnósticos dos beneficiários para implementação das tecnologias sociais e capacitações necessárias.

Adicionalmente, o PNUD está comprometido com a internalização e implementação dos ODS no território e, neste sentido, o projeto deverá promover diálogos envolvendo o setor público, privado, sociedade civil, fortalecendo a política de desenvolvimento territorial e de participação social.

Com esta abordagem, o PNUD pretende introduzir técnicas e treinamento da população para o enfrentamento do problema ambiental, mitigando os processos de deterioração natural a partir de intervenções físicas no ambiente, e cultural, orientando a população sobre a necessidade de conservação e convivência com as peculiaridades das regiões afetadas pelo processo de desertificação. Para tanto será fundamental atingir uma comunicação mais efetiva com os atores do município, melhorando a relação de confiança através da criação de espaços de convergência

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

com os atores locais para diminuir conflitos sociais e priorizarem ações e soluções alinhadas aos ODS que contribuam efetivamente para o seu alcance.

Espera-se que os resultados deste esforço contribuam diretamente para com os seguintes ODS:

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;
2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, e promover a agricultura sustentável;
3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;
5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;
6. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos;
8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico;
10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;
11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;
13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater mudança climática e seus impactos.
15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade.
17. Parcerias e Meios de Implementação.

A estratégia se estrutura em quatro eixos principais:

1º EIXO: Diagnóstico, Construção, Pactuação e Monitoramento. Inclui a realização de pesquisas sobre os beneficiários diretos, o potencial do desenvolvimento territorial sustentável com base nos ODS, a articulação de atores e espaços institucionalizados e informais de participação social nos territórios identificados, bem como a produção de diagnósticos e aprofundamento de dados já coletados, levando em conta a participação das mulheres no território e envolvendo os colegiados municipais e territoriais. Os principais momentos desta etapa são: leitura prévia dos diagnósticos já realizados, produção de dados, seleção das tecnologias sociais para cada famílias beneficiária, engajamento dos atores estaduais e territoriais (governo estadual, prefeitura/secretarias municipais, conselhos, associações, pequenos agricultores, movimentos sociais etc.); formulação de um pacto com os atores locais, com a participação das mulheres, elencando as prioridades para o desenvolvimento sustentável; aprovação de um plano de ação para o desenvolvimento das atividades do projeto, tendo como eixo norteador as demandas locais e metas definidas para os ODS, com destaque para a gestão ambiental, produção sustentável e desenvolvimento humano; e a implementação de um plano de ações destinado ao acompanhamento das ações para mitigar riscos que possam prejudicar os resultados esperados do projeto.

2º EIXO: Capacitação. Com foco na ampliação das capacidades dos moradores das comunidades diretamente afetadas, agentes públicos e multiplicadores nas práticas que impulsionem o associativismo, uso de técnicas para manejo sustentável do solo para a agricultura e pecuária sustentável, juntamente com as tecnologias sociais que contribuam para o acesso à água (captação

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

e armazenamento de água), saneamento básico, segurança alimentar e conservação do solo e biodiversidade locais. Este eixo busca introduzir inovações tecnológicas de manejo para garantir o uso dos recursos naturais respeitando a biodiversidade e o contexto ambiental do território; intercâmbios às práticas bem-sucedidas, networking com outros estados de acordo com dinâmicas vocacionais produtivas em áreas de desertificação e a articulação de atores estaduais e nacionais. Estes esforços de disseminação de práticas ambientais serão estendidos para a comunidade escolar, com a realização de um programa de educação ambiental para professores e alunos da rede pública de ensino de São Gonçalo do Gurguéia e municípios do entorno afetados pela desertificação (Gilbués, Corrente, Barreiras do Piauí e Riacho frio).

3º EIXO: Implementação. Introdução de estruturas físicas de tecnologias inovadoras e aplicação de práticas de manejo produtivo e ambientais para gerar desenvolvimento social e contribuir para a produção sustentável sem causar degradação da terra nas áreas suscetíveis à desertificação (ASD). Este conjunto de ações deverá também implementar tecnologias sociais sustentáveis para as famílias de agricultores e capacitá-las para garantir sua correta utilização e manutenção (i.e. construção de fogões ecológicos, cisternas de captação e armazenamento de água para consumo humano, produção e instalação de unidades sanitárias, sistema de reaproveitamento de água cinza, fossa séptica Tevap, fossa biodigestora, forno ecológico, biodigestor sertanejo, banheiro Redondo). Complementarmente, o projeto prevê a distribuição de água para todas as famílias afetadas e ainda um programa para aumentar o aproveitamento das cadeias produtivas de maior potencialidade do município e entorno, com o propósito de ampliar e aprimorar a gestão e a utilização racional do solo e da água para produção sustentável de alimentos. Importante destacar que na implementação das ações o projeto deverá transversalizar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, garantindo o fortalecimento de sua participação e inclusão na governança da iniciativa, além de indicadores que permitirão o monitoramento dessas ações.

4º EIXO: Gestão e comunicação. Este eixo destina-se a assegurar uma gestão eficiente dos recursos para garantir eficácia na operacionalidade das ações programadas e transparência e responsabilidade técnica, tanto do ponto de vista do planejamento e controle, quanto da gestão e disseminação dos conhecimentos, resultados e aprendizagens produzidos. E não menos importante, visa conformar uma comunicação social do projeto, com a geração de conteúdos e a escolha dos melhores canais de comunicação. Neste sentido, o plano de comunicação deverá alcançar os diversos públicos até os atores socioeconômicos e institucionais centrais da estratégia de crescimento econômico do município, ocorrendo em todas as escalas, da territorial / local (e seus conselhos, comitês, fóruns, associações do município etc.). Para que a disseminação se torne efetiva, será necessário acompanhar as ações desencadeadas na ponta, sistematizar as boas práticas e escolher de forma estratégica os espaços de divulgação.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Tabela 1: Teoria da Mudança e pressupostos do projeto

Se as tecnologias sociais implantadas junto às famílias impactadas pelos danos ambientais promoverem a melhoria nas condições de vida e na produção de alimentos, **então** as intervenções gerarão desenvolvimento sustentável e elevarão a segurança alimentar no território.	
Se as novas tecnologias de manejo sustentável e conservação de solos, água e da biodiversidade introduzidas ampliarem a capacidade de produção sustentável dos agricultores e técnicos da região, **então** o aproveitamento das potencialidades produtivas da região será mais elevado sem causar danos ambientais significativos	
Se um mecanismo de coordenação municipal estiver fortalecido e com ferramentas para monitorar avaliar e aprimorar o alinhamento de políticas públicas aos ODS e IDHM **então** maior será a efetividade do uso dos recursos financeiros arrecadados e relevância de impactos para evolução do município em termos de desenvolvimento humano sustentável.	
Se a estrutura de governança e gestão ambiental para o combate à desertificação e às queimadas forem fortalecidas e qualificadas, **então** o Estado e a região estarão mais preparados para enfrentar e reduzir os riscos de danos ambientais no município e em todo o território.	
Se os membros do poder público municipal, representantes da sociedade civil, setor privado e da comunidade ampliarem o entendimento sobre a importância da gestão sustentável da água e do solo para o desenvolvimento do município, **então** o processo de planejamento municipal ganhará capacidade e eficácia para responder aos problemas relacionados às questões ambientais e elevar os indicadores de desenvolvimento humano.	
Se o projeto for vinculado com os projetos de desenvolvimento territorial sustentável, **então** as práticas de desenvolvimento territorial sustentável vão ganhar visibilidade e legitimidade, podendo aumentar a possibilidade de escalar os resultados para outros territórios no estado.	
Se as ações/soluções forem planejadas com perspectiva de gênero, garantido a participação e o protagonismo das mulheres do território em toda a sua execução, **então** as mulheres e meninas de São Gonçalo do Gurguéia serão mais empoderadas e terão maiores oportunidades de se desenvolverem pessoal e profissionalmente no território.	
Se estas ações forem desencadeadas de forma articulada com a participação interinstitucional nos níveis estadual e municipal, e de representantes da sociedade civil e do setor privado, ENTÃO as famílias impactadas terão suas demandas atendidas e o estado estará mais preparado para enfrentar e mitigar os principais problemas ambientais enfrentados no Piauí para promover desenvolvimento sustentável.	

O projeto contribui para o Resultado 3 do UNDAF 2017-2021: Capacidades institucionais fortalecidas para promover as políticas públicas, sua coerência e implementação, para a gestão

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

sustentável de recursos naturais e serviços ecossistêmicos e o combate às mudanças do clima e seus efeitos adversos e para o Resultado 2 do CPD 20217-2021 do PNUD Brasil: Planeta: Gestão sustentável dos recursos naturais para as gerações atuais e futuras

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

III. RESULTADOS E PARCERIAS

Resultados Esperados

O projeto busca alcançar os resultados diretamente relacionados ao CPD do PNUD para o país, uma vez que tem como foco central o apoio e a implementação de ações que promovam desenvolvimento humano a partir de uma abordagem ancorada na gestão sustentável dos recursos naturais, utilização racional do solo e da água e da redução da degradação do solo e da biodiversiade. Para tanto, prevê:

- Promoção do desenvolvimento sustentável das famílias impactadas em território de desertificação pela implementação de tecnologias sociais (especialmente as lideradas por mulheres), acesso à agua de qualidade e recuperação de áreas degradadas;
- Fortalecimento e qualificação da estrutura de governança e gestão ambiental do Estado, a partir do contexto de São Gonçalo do Gurguéia e de municípios do entorno impactados pela desertificação com a implementação de ferramentas, capacitação técnica, interação com experiências de sucesso nas políticas de combate à desertificação e demais eventos com potencial de causar danos ambientais;
- Ampliação da capacidade dos agricultores e técnicos da região com o uso racional da terra para garantir a produção sustentável de alimentos a partir da utilização de novas tecnologias de manejo e conservação de solos, água e respeito à biodiversidade local.

Para o alcance desses resultados será implementado um conjunto de ações distribuídas em 4 principais produtos detalhados a seguir.

Produto 1: Dados, indicadores e perfis do público beneficiário do projeto produzidos, incluindo a perspectiva de gênero, para identificar as tecnologias sociais adequadas e as demandas e potencialidades locais para acelerar o desenvolvimento sustentável do município e do entorno territorial adotando como referência os ODS.

Alcançar o desenvolvimento sustentável exigirá a produção e compartilhamento de informações, além dos processos formativos que lancem as bases de uma articulação interinstitucional para implementar um conjunto de ações nas áreas afetadas por danos ambientais e desertificação, capaz de influenciar na melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano na região.

A leitura prévia do diagnóstico realizado pela Enel Green Power sobre o público diretamente impactado pelos danos ambientais causados pela implantação da usina de energia fotovoltaica apontam para a necessidade de se promover uma análise mais aprofundada e com maior nível de detalhamento das informações para endereçar os problemas e definir soluções mais eficazes para atender as demandas do município e comunidade impactada, relacionando-as com as metas da Agenda 2030.

Por meio da produção de dados quantitativos e análises qualitativas sobre os beneficiários e suas demandas, levantamento de políticas com vertente no município e entorno, mapeamento dos ativos ambientais e potencialidades econômicas e sociais, pretende-se ainda constituir uma ferramenta robusta de gestão do processo de desenvolvimento sustentável para o município. O

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

produto – que inclui um enfoque transversal de gênero – contempla ainda o fortalecimento da capacidade de participação colaborativa dos atores sociais no município, a partir de metodologias participativas voltadas para o monitoramento e aceleração dos ODS.

Todas as ações serão coordenadas considerando os resultados do Programa de Apoio à Gestão Pública Municipal realizado em julho/2021 pela Enel, Plano Plurianual do município de São Gonçalo do , Agenda 2030 do governo do Estado do Piauí (Seplan) e Mapa de Potencialidades do território elaborado do Seplan.

Os dados que serão gerados durante esta etapa possibilitarão uma atualização do diagnóstico, produzido pela Enel e objeto de análise para esta etapa, além de permitir um aprofundamento sobre informações relativas ao público alvo, contexto socioeconômico do território, ativos ambientais e potencialidades econômicas e análise de viabilidade das cadeias produtivas locais, e construção de linhas de base.

Atividades previstas:

1.1. Convalidar diagnóstico do público beneficiário do projeto e do contexto socioeconômico do município e das comunidades que serão beneficiadas para cadastrar a infraestrutura de saneamento, potencialidades para produção agrícola e identificação das tecnologias sociais mais adequadas para implantação;

1.2. Promover a mobilização e o engajamento das famílias beneficiárias do projeto, identificar e priorizar as demandas e definir as tecnologias sociais adequadas para endereçamento das soluções eficazes;

1.3. Realizar encontros com gestores municipais fortalecendo as bases colocadas pelo Programa de Apoio à Gestão Pública Municipal realizado pela Enel, definindo metas e indicadores para a Agenda 2030 do município;

1.4. Implantar arranjo para fortalecimento e a capacidade dos atores sociais e organizações representativas do município com a participação colaborativa com foco na melhoria da gestão da água e monitoramento das ações implementadas para promover o desenvolvimento sustentável no município;

1.5. Promover ações de capacitação para planejamento de São Gonçalo do Gurguéia e municípios do entorno com a integração dos ODS nos PPAs para elevar indicadores de desenvolvimento humano;

1.6. Desenvolver estudo sobre impactos potencializados pela sinergia das ações implementadas no município, com destaque para beneficiários diretos, com base nos ODS elencados como prioritários.

Produto 2: Beneficiários do projeto capacitadas a partir de cursos, treinamentos, implementação de tecnologias sociais e práticas de manejo sustentável para promover a agricultura sustentável, com a melhoria da gestão da água, saneamento básico e respeito à conservação do solo e biodiversidade locais.

Considerando que as atividades deste produto são destinadas a aportar capacidade de planejamento, gestão e acompanhamento nos beneficiários diretos e demais atores envolvidos nas

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

ações de implementação do Projeto, cuja implementação se concretizará através de eventos educativos e práticos – tanto no campo quanto em ambiente de sala de aula -, todas as ações nele previstas deverão ser cordadas previamente e envolver as secretarias e demais órgãos relacionados aos temas de meio ambiente, agricultura e educação, tanto no âmbito do estado quanto dos municípios participantes.

Espera-se também que as atividades fortaleçam a estrutura de governança e a gestão ambiental do estado e em especial dos municípios contemplados, a partir do aporte de capacidade e conhecimento pela interação com políticas de combate à desertificação, produção sustentável e enfrentamento dos demais eventos com potencial de causar danos ambientais, com foco em queimadas, em grande parte responsáveis pelos incêndios florestais na região.

Complementarmente, os professores e alunos da rede pública serão capacitados através de um programa de educação ambiental, cujo escopo deverá enfocar a conservação dos recursos naturais e o controle do meio ambiente, em especial do bioma local, incentivando novos hábitos e práticas sustentáveis.

O produto tem como principal objetivo fortalecer a capacidade do público (São Gonçalo do Gurguéia e os 04 municípios do seu entorno) no enfrentamento dos problemas ambientais mais relevantes da região com o aporte de estrutura e incorporação de melhores práticas com a participação de agentes estaduais e municipais, professores e estudantes, com foco especial na mitigação e preservação de áreas degradas por desertificação e produção sustentável. Neste sentido, o projeto prevê a implementação de cursos e a adoção de práticas de gestão sustentável (SLM) aplicando a estratégia denominada Unidade de Recuperação de Área Degradada (URAD).

Importante também será a formação de replicadores da tecnologia, com beneficiários participando do processo de aprendizagem de técnicas de manejo. Esta capacitação ocorrerá a partir da realização de oficinas e seminários promovidos nos temas relacionados à recuperação de áreas degradadas por desertificação e complementados por troca de experiências e conhecimento das boas práticas.

Atividades previstas:

2.1. Promover a capacitação dos beneficiários e atores do município de São Gonçalo do Gurguéia no uso de tecnologias sociais, incluindo o saneamento rural e tratamento sanitário[4], com o aprimoramento da governança da água e utilização racional do solo para produção de alimentos respeitando a biodiversidade e o contexto ambiental do território;

2.2. Desenhar plano de ação para a garantia da participação de mulheres entre as beneficiárias diretas do projeto, levando em conta a divisão sexual do trabalho e as múltiplas jornadas de trabalho entre outras barreiras de participação enfrentadas por esse grupo social;

2.3. Fomentar a cultura do associativismo para as famílias beneficiárias como instrumento de desenvolvimento a partir da organização e produção coletiva, com a introdução de ferramentas para fortalecimento da gestão, produção e comercialização. Esta atividade incluirá ainda um curso de educação financeira básica para os beneficiários com a finalidade de ampliar a capacidade de administrar os recursos recebidos, com foco acitar as famílias

[4] As tecnologias desenvolvidas para promover Saneamento Básico na área Rural são soluções simples, eficientes e facilmente replicáveis, e deverão ser aplicadas em sintonia com os resultados apontados pelo diagnóstico inicial das famílias beneficiadas. Estas famílias deverão receber capacitação prática para operacionalização/manutenção das estruturas implantadas, como "fossas sépticas biodigestoras", "jardins filtrantes", "clorador".

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

beneficiárias no manejo produtivo de mel e polinização de culturas comercializáveis. A introdução desta atividade está sujeita à aderência dos beneficiários em análise específica no diagnóstico inicial;

2.5. Promover programa de formação dos beneficiários, agentes públicos e multiplicadores (técnicos estaduais, municipais, extensionistas, agricultores), em práticas de produção de alimentos em áreas degradadas e de uso dos ativos ambientais para utilização racional do solo e da água, abordando os princípios da agroecologia, produção orgânica e convivência com o bioma local;

2.6. Realizar seminário regional sobre o tema da recuperação de áreas degradadas por desertificação para ampliar o debate e a relevância da temática no âmbito do estado e incentivar a implantação de práticas inovadoras, envolvendo academia, instituições ambientais, entidades públicas e da sociedade civil que atuam nesta área;

2.7. Promover ações para troca de experiências e conhecimento das boas práticas, incluindo assessoria e visitas técnicas de estudos, de acordo com dinâmicas vocacionais produtivas locais;

2.8. Realizar um programa de formação ambiental para escolas públicas nos 5 municípios do projeto com dois focos prioritários: i) conservação dos recursos naturais e o controle do meio ambiente, em especial do bioma local, incentivando novos hábitos e práticas sustentáveis; e ii) as energias renováveis, meio ambiente e sustentabilidade.

Produto 3: Tecnologias sociais implantadas, acesso à agua e programa de produção sustentável de alimentos introduzidos

O projeto garantirá o acesso a água de qualidade para as comunidades localizadas em área de desertificação e impactadas pelas obras da usina de geração de energia fotovoltaica. Complementarmente, implementará para este público, um conjunto de tecnologias sociais sustentáveis e um programa de apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas de maior potencialidade do município para ampliar a produção sustentável de alimentos a partir das tecnologias inovadoras de gestão e a utilização racional do solo e da água.

A partir do estudo de viabilidade e potencialidade das cadeias produtivas locais identificadas, este produto prevê também a implantação de experimentos de cultivo de espécies vegetais, preferencialmente polinizáveis por espécies de abelhas nativas, em área ocupada por painéis solares e a criação de espécies de abelhas nativas (meliponicultura) ou apicultura, visando promover a polinização e gerar produtos comercializáveis para elevar a renda dos beneficiários. Outra opção é reforçar a cultura do buriti, amplamente explorada pelos moradores da região.

Como mencionado no Produto 2, que detalha as ações relacionadas ao aporte de capacidade, aqui também se ressalta que a implantação de um núcleo de criação de abelhas – seja apicultura ou meliponicultura – deve envolver uma ação prévia de sensibilização para se assegurar a adesão dos beneficiários -, uma vez que esta cultura ainda é pouco difundida na região. Com esta compreensão, a estratégia de abordagem deverá ser construída em linha com as ações de fomento ao associativismo, modelagem que permite desenvolver esta atividade produtiva em contexto coletivo, com custos baixíssimos e que favorece a participação de todos. A partir destas informações e com base nos dados de projetos apícolas implantados no Piauí (FIDA, Sebrae, CODEVASF), o projeto estimou uma taxa de interesse de 50% do público – conservadora, considerando a boa

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

rentabilidade gerada e a pouca dedicação que a atividade requer do produtor, o que sempre se constitui como fator motivacional relevante.

Importante destacar que todas as ações programadas no Produto 3, desde distribuição de água, implantação das tecnologias sociais, estruturação de unidades de produção de alimentos e apicultura e polinização, implicam na instalação de estruturas físicas e deverão ser precedidas – ou executadas simultaneamente - pelas capacitações previstas no Produto 2 – alinhadas com as demandas das comunidades, a partir de ações de comunicação e engajamento já previstas.

Atividades previstas:

3.1 Instalar obras de infraestrutura que permita o acesso à agua para todas as famílias das comunidades da área de influência direta da usina solar e de comunidades adjacentes. O dimensionamento e o projeto de engenharia serão previamente desenvolvidos e disponibilizados pela ENEL, após alinhamentos com o governo do município de São Gonçalo do Gurguéia e governo do Estado do Piaui, com destaque para o Instituto das Águas (IAEPI) e Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan);

3.2 Implementar tecnologias sociais sustentáveis[5] a partir da utilização de tecnologias de conservação de solos, água e biodiversidade em áreas degradadas, de forma participativa, para as famílias afetadas por danos ambientais, incluindo: construção de barragens base zero (BBZ), implantação de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs), construção de fogões ecológicos, cisternas de captação e armazenamento de água para consumo humano, produção e instalação de unidades sanitárias (fossa séptica Tevap, fossa biodigestora, banheiro redondo), forno ecológico, biodigestor sertanejo, sistema de reaproveitamento de água cinza, entre outros;

3.3. Implementar o plano de ação desenvolvido pelo projeto para assegurar a participação de mulheres entre as beneficiárias diretas do projeto;

3.4. Implantar tecnologias para segurança na reutilização das águas residuárias para fins agrícolas, com destaque para a importância da qualidade biológica dos efluentes com a finalidade de diminuir as probabilidades de propagação de patógenos e evitar diferentes doenças para seus usuários;

3.5. Estruturar empreendimentos produtivos nas comunidades beneficiárias para potencializar o aproveitamento das cadeias produtivas com a utilização de tecnologia introduzidas pelo projeto e prestar apoio/assistência técnica continuada na implantação de pequenos projetos produção de alimentos;

3.6. Estruturar núcleo de apicultura/meliponicultura voltado para produção de mel e polinização com a implantação de unidade de produção, extração, beneficiamento;

3.7. Implementar estudo de impacto das ações implementadas pelo projeto tomando como base os indicadores dos ODS, com recorte especial na condição de vida das mulheres e na estrutura de desigualdade de gênero do município.

---

[5] As tecnologias deverão ser identificadas com base em estudo e discussão prévia com cada beneficiado. Exemplos.: construção de fogões ecológicos, cisternas de captação e armazenamento de água para consumo humano e produção e instalação de unidades sanitárias, sistema de reaproveitamento de água cinza, fossa séptica Tevap, fossa biodigestora, forno ecológico, biodigestor sertanejo, banheiro redondo, entre outros

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Produto 4: Gestão eficiente do projeto e comunicação social assegurada.

A gestão dos recursos se constitui elemento chave para o sucesso na implementação e boa gestão do projeto. A gestão eficiente se dará por meio do uso adequado dos recursos disponíveis no Projeto, com a contratação de especialista de modo a assegurar a operacionalidade das ações em campo, mas também, a transparência e responsabilidade técnica, tanto do ponto de vista do planejamento e controle, quanto da gestão e disseminação dos conhecimentos, resultados e aprendizagens produzidos.

Para garantir o engajamento do público alvo direto do projeto e o acesso ao conhecimento para a democratização dessa agenda junto aos diferentes atores das comunidades dos municípios nas ações desenvolvidas, será necessária uma comunicação eficiente, ágil e de fácil de assimilação. No âmbito das atividades previstas, o projeto tem a responsabilidade de contemplar os excluídos nos processos de disseminação por meio da adoção de metodologias adequadas (contextualizada) às realidades locais.

A geração de conteúdos e a escolha dos melhores canais de comunicação são as duas facetas mais estratégicas deste produto. Com esta preocupação, o plano de comunicação deverá ser construído por um especialista e previamente aprovado pelos parceiros do Projeto para alcançar os diversos públicos, até os atores econômicos e institucionais centrais da estratégia de crescimento econômico dos municípios e território onde estão inseridos. Ainda sob esta ótica, a disseminação deve ocorrer em todas as escalas, da estadual, territorial, local (e seus conselhos, comitês, fóruns, associações do município etc.).

Para que a disseminação se torne efetiva, será necessário acompanhar as ações desencadeadas na ponta, sistematizar as boas práticas e escolher de forma estratégica os espaços de divulgação. Estas ações deverão ter o envolvimento da área de comunicação da ENEL, parceira desta iniciativa.

Atividades previstas:

4.1 Elaborar e implementar uma identidade visual e um plano de comunicação do projeto;

4.2 Mobilizar e estabelecer uma rede de comunicação junto aos beneficiários do projeto e demais atores relevantes para o projeto;

4.3 Planejar, coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar a implementação das ações do projeto;

4.4 Estruturar e capacitar equipe de gestão e implementação do projeto;

4.5 Constituir grupos de aprendizado no território de atuação do projeto para aprimoramento da execução e aprendizado de lições e boas práticas;

4.6 Constituir grupo de monitoramento das atividades e riscos do projeto que possam eventualmente gerar algum impacto negativo, com o objetivo de corrigir rotas de ação;

4.7 Elaborar e implementar plano de gestão do conhecimento, bem como a sistematização e documentação das lições aprendidas e das boas práticas desenvolvidas;

4.8 Realizar auditoria;

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Recursos Necessários para Atingir os Resultados

Os recursos necessários para atingir os resultados se dividem entre financeiros e econômicos. Os recursos financeiros dizem respeito à subvenção de **$ 1,750,905.17 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, novecentos e cinco dólares e dezessete centavos)** proveniente da empresa parceira Enel Green Power e serão aplicados nas estruturas, atividades e alcance dos resultados elencados acima, assim como nos instrumentos de gestão, monitoramento e avaliação do projeto. Para o atingimento dos resultados serão contratados consultores habilitados e com capacidade verificada para desenvolver as metodologias, conteúdos e atividades elencadas nos Resultados Esperados (ver anexo 4).

Os termos de referência utilizados para embasar as chamadas públicas que serão efetuadas para a contratação do corpo de consultores serão elaborados pelo PNUD, podendo receber insumos do Governo do Estado do Piauí, representado pela SEMAR – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O detalhamento de como serão divididos os recursos para o atingimento de cada um dos resultados pode ser conferido no capítulo *VII Plano de Trabalho Multianual*.

Os recursos econômicos dizem respeito às contrapartidas de infraestrutura, pessoal, institucional e outros recursos dedicados pelo Governo para a execução do projeto. São recursos relacionados às horas dedicadas pelas equipes das prefeituras envolvidas na implementação das ações ou do Governo para a viabilização do projeto, insumos de escritório entre outros custeios que não se confundem com a subvenção financeira, mas viabilizam sua aplicação.

Cartas Acordo

O projeto também prevê o estabelecimento de duas parcerias por meio de Cartas Acordo (no âmbito do Produto 1 e Produto 3), ambas relacionadas ao trabalho que será desenvolvido junto às famílias impactadas pelas obras da usina de energia em São Gonçalo para implantação das tecnologias sociais.

A primeira Carta terá como objetivo central a realização do mapeamento e análise das necessidades das famílias para construção do diagnóstico do contexto local e das tecnologias sociais mais adequadas para potencializar o impacto nas condições de vida dos beneficiados. Este acordo deverá efetivar uma parceria com a **Universidade Federal do Piaui (UFPI)**, que mantém, no Campus localizado em Bom Jesus, município próximo de São Gonçalo do Gurguéia, um quadro de mestres e pesquisadores com expertise nos temas que serão desenvolvidos no âmbito do projeto. Esta medida se justifica pela maior facilidade e agilidade de atuação na área focal do projeto sem exigir grandes deslocamentos – especialmente em tempos de pandemia - e a apropriação do conhecimento acadêmico que esta proximidade seguramente propiciará para os atores da região beneficiada pela ações implementadas. Ao mesmo tempo uma parceria entre o PNUD e UFPI servirá como ferramenta de fortalecimento da própria universidade a expondo às redes de conhecimento do PNUD.

A segunda Carta Acordo será assinada com entidade selecionada por meio da avaliação de sua capacidade e experiência e terá como foco a implementação das tecnologia sociais que serão identificadas pelo diagnóstico produzido no âmbito da primeira carta acordo pela UFPI.

Estes acordos deverão selecionar instituições com atuação destacada em iniciativas de desenvolvimento sustentável e capacidade e experiência comprovada na implementação de tecnologias sociais aplicáveis ao contexto local.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

As parcerias estabelecidas por meio de Carta Acordo, entre o órgão executor e as agências implementadoras, deverão observar as condições dispostas sobre a matéria no documento "Manual de Execução Nacional de Projetos UNDP".

Parcerias

Para o PNUD[6], o cumprimento dos ODS, em 2030, exigirá uma cooperação sem precedentes e colaboração entre os governos, as organizações não governamentais, academia, parceiros de desenvolvimento, o setor privado e as comunidades. Neste processo, as empresas privadas exercem papel fundamental e devem adotar critérios nas suas operações de negócios que respeitem os direitos humanos, em conformidade com as regulamentações governamentais, maximizando contribuições positivas para a sociedade e evitando ou minimizando os impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais negativos.

Adicionalmente, as empresas podem colaborar para alavancar recursos e fazer investimentos sociais, assegurando que esses estejam alinhados com as prioridades de desenvolvimento local. Em sintonia com esta abordagem, este projeto planeja desenvolver ações no "âmbito da comunidade", ou seja, com o foco nas populações expostas a algum tipo de risco social, localizadas em áreas com proximidade geográfica e influência da empresa parceira Enel Green Power ("foco local e microrregional").

Esta iniciativa terá como foco principal o município de São Gonçalo do Gurguéia, mas as ações destinadas à aumento de capacidade de planejamento e gestão municipal, bem como o programa de formação educativa nas temáticas ambientais serão estendidas aos municípios situados no seu entorno: Gilbués, Riacho Frio, Corrente e Barreiras do Piauí, todos localizados no Território da Chapada das Mangabeiras. A implantação de tecnologias sociais e a estruturação de produção de alimentos, incluindo a introdução de núcleo de criação de abelhas para produção de mel e e polinização, fazem parte de compromisso assumido pela Enel Green Power com a SEMAR e compõem um conjunto de ações que serão desenvolvidas no município de São Gonçalo do Gurguéia.

Esta formatação territorial atendeu ao interesse da empresa doadora, que desenvolve negócios de geração de energia fotovoltaica no município e aportará os recursos financeiros para implementar as ações do projeto. Este projeto possibilitará a EGP responder as demandas das populações impactadas pelo empreendimento da empresa e, ao mesmo tempo, aportará contribuições robustas para o fortalecimento da estrutura de proteção e fortalecimento ambiental do estado, além de promover o desenvolvimento humano sustentável para a região. Neste sentido, a efetividade dos resultados esperados com a implementação desta iniciativa contará com o engajamento e a colaboração das seguintes organizações:

PARCEIRO/ BENEFICIÁRIO	ESCOPO DA COLABORAÇÃO	RESULTADO ESPERADO
SEMAR – Secretaria DE	A SEMAR é a principal articuladora e parceira do projeto. Como gestor da política ambiental	Assegurar que o escopo do projeto contemple as demandas do

[6] UNDP, WEF, CSI e SDSN. Mapping Mining to the sustainable development goals. An Atlas. 2016. Disponível em: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mapping-mining-to-the-sdgs--an-atlas.html

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	do Estado, terá função de interlocução com outros setoriais do Governo municipal na construção do projeto, apoiando na identificação de demandas e na mobilização dos atores no âmbito do estado, especialmente junto aos técnicos e especialistas que atuam nas políticas de proteção ambiental do estado	governo estadual e municipal e que as ações implementadas fortaleçam de forma efetiva a capacidade do Estado para combater eventos com potencial de gerar danos ambientais
ENEL GREEN POWER	Empresa privada com investimentos em plantas de geração de energia eólica no município de São Gonçalo do Gurguéia. A EGP será responsável pela doação dos recursos financeiros para viabilizar as ações programadas neste projeto e participará do Comitê Gestor do Projeto	Garantir os recursos necessários para implementação do projeto e promover desenvolvimento sustentável para famílias impactadas pela obra da empresa e para o município de São Gonçalo do Gurguéia.
Famílias impactas pelas obras da Usina Fotovoltaica	Paticipação nos diálogos e nas definições das ações a serem programadas e na representação nos conselhos territoriais, municipais e estaduais. Serão principais beneficiários dos projetos produtivos implantados pelo projetoo	Os representantes da sociedade civil organizada, movimentos sociais, sindicatos e associações serão engajados por meio dos conselhos municipais e territoriais. A estratégia busca fortalecer as instâncias participativas e ao mesmo tempo busca ganhar legitimidade, representatividade e capilaridade com a sociedade civil organizada.
SEPLAN - Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí	A Secretaria é responsável pela coordenação do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Piauí e pelo planejamento territorial do Estado. Sua participação será fundamental na constituição dos arranjos institucionais e na mobilização dos atores territoriais, especialmente junto aos representantes da sociedade civil e conselhos Territorial e local.	Por meio do engajamento dos espaços institucionais de participação social na territorialização da Agenda ODS, o Projeto contribuirá para o fortalecimento do Plano de Desenvolvimento Territorial do Estado. Adicionalmente, a participação da Seplan assegura o alinhamento das ações com os planos de desenvolvimento do Estado
SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Piauí	A SEDUC será responsável pela mobilização de profissionais para apoiar a organização e a participação do público dos municípios nos programas educativos que serão realizados voltados para temas da preservação ambiental e sustentabilidade.	Articulação dos agentes estaduais e locais para reforçar o engajamento nas ações educacionais implementadas prelo projeto.
SAF – Secretaria de Estado de Agricultura Familiar	A SAF/EMATER deverá apoiar as ações voltadas para o aproveitamento das potencialidades produtivas regionais e articular a participação dos atores que desenvolvem atividades produtivas nos eventos de capacitação.	Fortalecimento de capacidades da SAF e EMATER para multiplicar conhecimento vinculado às tecnologias de produção sustentável, de base agroecológicas e de uso

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

		alternativos ao fogo para prevenção e combate às queimadas.
Conselhos Territorial, outros agentes de atuação local	Os diversos arranjos institucionais de desenvolvimento territorial são parceiros estratégicos na capilarizarão da Agenda ODS no nível local e regional. Estes espaços serão os principais alvos das ações de fortalecimento, mobilização social e disseminação da Agenda ODS. Os colegiados serão ainda os espaços privilegiados para planejar, avaliar e monitorar os projetos de desenvolvimento em prol do alcance dos ODS.	▪ Fortalecimento de capacidades institucionais de planejamento e gestão; ▪ Fortalecimento de capacidades de gestão compartilhada ▪ Planos de desenvolvimento territorial alinhados com ODS. ▪ Visibilidade para ações inovadoras em prol dos ODS. ▪ Controle social e capacidade de monitoramento e avaliação dos resultados dos Planos de desenvolvimento territorial
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia	O município deverá mobilizar atores do setor de educação, agricultura, saúde, assistência social, e demais técnicos municipais para participar das capacitações e possibilitar a transversalização dos ODS na gestão municipal	Participação efetiva nas instâncias institucionais de desenvolvimento territorial Alinhamento dos planos municipais à Agenda 2030 e ODS Liderança na implementação da Agenda ODS no nível local
Associações e organizações representativas do Município	As associações e demais organizações coletivas deverão exercer papel de representação da sociedade civil nas discussões das ações implementadas e prover insumos importantes para refinar informações sobre as demandas e necessidades dos beneficiários e potencialidades produtivas.	A maioria das associações realizam ações que se alinham aos ODS, assim como trabalham com abordagens locais territorializadas que servem para priorizar a elaboração, implementação e monitoramento de projetos setoriais em prol dos ODS.
Câmara legislativa MUNICIPAL	Parceiro estratégico na disseminação e fortalecimento político da Agenda ODS no âmbito municipal.	Disseminação da agenda ODS e elaboração de marcos legais e legislativos que visam viabilizar a implementação de ações em prol dos ODSs.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gonçalo do Gurguéia	As secretarias municipais deverão ter importante participação na mobilização do público e no fortalecimento de capacidades de gestão, planejamento e acompanhamento das ações implementadas.	▪ Fortalecimento de capacidades administrativas, planejamento e gestão nos temas relacionados a gestão ambiental, combate a queimadas e desertificação; ▪ Melhoria na elaboração de projetos de desenvolvimento sustentável; ▪ Troca de experiências e boas práticas
Prefeituras dos Municípios de	As prefeituras dos municípios serão responsáveis pela mobilização do público para	▪ Fortalecimento da capacidade de planejar com a referência

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Corrente, Gilbués, Barreiras do Piauí e Riacho Frio	participação dos programas educacionais e nos seminários realizados para fortalecer a capacidade de planejamento e integração dos ODS nas gestões municiáis.	dos ODS para gerar desenvolvimento sustentável nos municípios ▪ Disseminação da cultura de preservação ambiental e práticas de produção sustentável,
Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres	O organismo de política para mulheres deverá articular instâncias e atores sociais que apoiem a geração de impactos positivos para a mulheres do território.	▪ Implementação efetiva da transversalidade de gênero no projeto; ▪ Impacto positivo do projeto na redução das desigualdades de gênero e no empoderamento de mulheres e meninas no território.

Riscos

Considerando a natureza do projeto de implementação de ações de campo, sua vinculação com setoriais nos níveis estadual e municipal e dependência de recursos privados, o projeto prevê a possibilidade dos seguintes riscos e estratégias de mitigação:

RISCO	ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO
Dificuldade de implementação das ações de campo e realização de eventos de formação pelas condições epidemiológicas	O Projeto prevê a realização de diversos eventos e oficinas para formação de capacidades e a estruturação de núcleos de produção para geração de renda e conservação ambiental. Adicionalmente, prevê a formação e capacitação de arranjos institucionais para acelerar o desenvolvimento sustentável da região. É esperado que o contexto da pandemia melhore a partir do segundo semestre, mas algumas ações com menor risco de contato, sem a necessidade de formar aglomerações, devem ser priorizadas neste período. A depender do público e do tipo da capacitação, pode-se realizar eventos online, encontros com distanciamentos ou mesmo ajustar o cronograma, adiando os encontros presenciais.
Turbulências associadas a deterioração de situações econômicas.	Projetos com financiamento privado estão sujeitos à instabilidade econômica que poderá afetar a contribuição inicial dos recursos previstos. O presente projeto recepcionará recursos para implementação de ações previstas no âmbito de compromissos assumidos pela doadora em Termos de Ajuste de Conduta com o Estado. O prazo para conclusão do projeto foi definido tomando em consideração o atendimento do compromisso no acordo assinado, o que reforça a importância da doadora manter o fluxo de recursos do projeto e reduz o risco econômico.
Conflitos interinstitucionais e/ou de natureza político-partidária impedem a implementação das ações em determinadas regiões e/ou municípios.	Para evitar que este risco trave a implementação do projeto a maioria das ações está prevista para ser executada na escala municipal e territorial, onde atores institucionais de diversas vertentes partidárias estarão engajados em processos de concertação, negociação e pactuação. Neste caso a estratégia de mitigação envolve a articulação frequente com diferentes níveis das gestões municipais e com os órgãos setoriais do governo estadual, que possui agentes territoriais com canais de interlocução definidos nos municípios.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Grande rotatividade dos partidos políticos à frente das administrações municipais, provocando instabilidade e descontinuidade o que impede o desenvolvimento institucional local.	A estratégia de mitigação deste risco consiste em duas frentes de ação. A primeira reside na contínua atenção para a gestão do conhecimento e manutenção da memória do projeto. A segunda frente de ação da estratégia de mitigação refere-se à abordagem metodológica dos processos de capacitação reforçando o engajamento do servidor público, especialmente aqueles de carreira, nos processos de fortalecimento institucional.
Inabilidade de consultores na entrega dos produtos especificados	O PNUD contratará um assessor técnico especialista para assegurar que os indicadores de cumprimento das metas de cada produto especificadas no termo de referência serão obedecidos. Também serão estipulados nos termos de referência cláusula de conformidade, que implicará rescisão de contrato com os consultores em caso de inabilitação no desenvolvimento dos conteúdos, no não cumprimento de cronograma contratado e na não observância dos procedimentos de accountabillity e report.
Atrasos relacionados ao cronograma de desembolsos	O PNUD disponibilizará uma assistente para assegurar o cumprimento das metas orçamentárias e dos procedimentos contábeis necessários à execução e prestação de contas do orçamento do projeto.
Mudança de quadros gerenciais responsáveis pelo projeto dentro das organizações parceiras do PNUD.	Em que pese a execução e administração do projeto ser de responsabilidade do PNUD, o Governo do Estado Piauí, assim como prefeituras situadas no território de atuação do projeto, na qualidade de beneficiários e parceiros, deverão delegar o acompanhamento do projeto a representantes para apoiar na articulação e realização das ações nos municípios. Para mitigar qualquer mudança nesses quadros que acarretam descontinuidade das ações, o PNUD contratará analistas e ou consultores que servirão de pontos de contato entre o PNUD e o Estado e municípios.

Conhecimento

O projeto prevê a elaboração e implementação de um plano de gestão do conhecimento, para sistematizar e documentar as lições aprendidas e das boas práticas desenvolvidas no processo de implementação das ações implementadas.

Diversos materiais serão produzidos por especialistas contratados e deverão ser disponibilizados ao estado e municípios - incluindo agentes públicos, multiplicadores, academias, escolas e sociedade civil - abordando os princípios da agroecologia, produção orgânica e convivência com o bioma local, incluindo práticas rurais alternativas ao uso do fogo. Complementarmente, o Projeto realizará um seminário regional sobre a temática da recuperação de áreas degradadas por desertificação para ampliar o debate e a relevância da temática no âmbito do estado e incentivar a implantação de práticas inovadoras, envolvendo academia, instituições ambientais, entidades públicas e da sociedade civil que atuam nesta área. Os debates e apresentações deverão ser registrados em documento para disseminação do PNUD e demais parceiros do Projeto.

Está prevista ainda a documentação e a devida publicação, em materiais gráficos e audiovisuais específicos, de todo o trabalho desenvolvido, bem como os resultados alcançados, referentes às tecnologias sociais implantadas, programas formativos e educacionais, as iniciativas

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

de produção de alimentos instaladas e a estruturação do núcleo de produção apícola e polinização junto às famílias beneficiárias.

Sustentabilidade e Escala

A abordagem inovadora do projeto relaciona a implementação das ações do projeto em duas escalas federativas (estadual e municipal) e apesar de direcionar o foco das ações no entorno do município de São Gonçalo do Gurguéia, contribuição relevante para a promoção do fortalecimento da gestão ambiental e social das políticas públicas no Estado do Piauí. Neste sentido, o desenho do projeto foi pensado de forma conjunta e está totalmente integrado com a Política Estadual de Ambiental do estado, uma vez suas ações foram discutidas e acordadas previamente com a SEMAR. A complementaridade do projeto com as políticas estruturantes do Estado garante não só maior visibilidade para o mesmo, mas também e, principalmente, garantem maior capacidade de influir a médio e longo prazo a agenda de desenvolvimento sustentável desencadeada pelos investimentos e pelos programas do Estado do Piauí.

Os impactos do projeto são considerados altamente sustentáveis, de diversas formas, nomeadamente através de medidas tomadas pelo projeto e também através do apoio das condições externas. Em grande parcela, as ações são focadas no desenvolvimento de capacidades tanto para beneficiários diretos quanto para agentes institucionais, e esta abordagem vai garantir que os resultados do projeto ganhem seu próprio ciclo de vida, independentemente do prazo do projeto. Adicionalmente, o projeto vai contribuir, em termos gerais, para incrementar a consciência coletiva sobre o (s) modelos de desenvolvimento bem como identificar possíveis rotas alternativas, fundamentadas em informações e indicadores relacionados com as dinâmicas locais. Todos estes resultados relacionam o esforço com o desenvolvimento territorial sustentável, reforçando assim o alcance mais amplo dos ODS.

O projeto irá documentar todas as lições aprendidas, boas práticas desenvolvidas e os resultados alcançados junto aos beneficiários como parte de seu componente de gestão do conhecimento, e estas serão divulgadas através das publicações do Relatório de Acompanhamento para apoiar a replicação eficaz de suas intervenções.

IV. GESTÃO DO PROJETO

O Projeto será implementado pelo PNUD, na modalidade de execução direta, e seus arranjos de gestão e coordenação baseiam-se nas orientações contidas no Guia de Gerenciamento por Resultados e Regras e Procedimentos do PNUD. [7]

Eficiência e Efetividade

Os resultados esperados serão atingidos por meio de serviços técnicos de consultoria de pessoas físicas e jurídicas com conhecimento e experiência comprovadas nas áreas de desenvolvimento social, aplicação de técnicas agrícolas e preservação ambiental, e, ao mesmo tempo, demonstrem destacada capacidade de executar as atividades necessárias ao alcance dos

[7] Programme and Operations Policies and Procedures.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

resultados esperados. A supervisão e monitoramento do trabalho do corpo de consultores será realizado pelo PNUD que estruturará equipe própria, devendo ser respaldado em relatórios de acompanhamento das metas previstas nos contratos firmados. Caberá ao PNUD a observância da adesão do trabalho administrativo tais como os procedimentos de seleção e contratação de consultores com o cumprimento das metas estipuladas para os produtos do projeto. O PNUD não apenas autorizará desembolsos para o pagamento referente a serviços de consultoria mediante o cumprimento das metas estabelecidas no projeto e nos seus planos anuais de ação como também coordenará as ações do Projeto para que os conhecimentos gerados estejam de acordo com o planejado.

Com relação às ações relacionadas a recuperação de áreas degradadas, notadamente aquelas programadas com o propósito de assegurar a produção de alimentos baseada em tecnologias que protejam os impactos no contexto ambiental da região, o projeto adotará como referência a abordagem desenvolvida pelo Projeto BRA/14/G32 "Manejo do Uso Sustentável da Terra no Semiárido do Nordeste Brasileiro", implementado em Sergipe pelo PNUD.

A coordenação do Projeto estabelecerá pontos de controle periódicos, que serão realizados com a participação da equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) do Piauí, de técnico designado pela empresa Enel Green Power ~~e~~ consultores, sob a coordenação do PNUD, para avaliação do andamento dos resultados. Os pontos de controle serão instâncias de avaliação, adequação e correção de rumos para a realização das atividades, observadas as orientações estratégicas do Comitê de Acompanhamento do Projeto. O critério de verificação de cumprimento de metas será definido no plano de ação, instrumento que servirá para confrontar o cronograma com as etapas executadas pelos consultores na elaboração e desenvolvimento dos produtos.

Gestão do Projeto

O projeto será operacionalizado a partir do escritório do PNUD em Teresina (PI) no prédio da Secretaria de Planejamento, localizado na Av. Miguel Rosa, 3190, Centro Sul, Teresina, PI, CEP 64001-490.

O arranjo operacional do projeto será estruturado a partir do Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP) formado pela SEMAR, o PNUD, a empresa Enel Green Power e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), com funções estratégicas de:

i) garantia de qualidade do projeto,

ii) direção estratégica do projeto e

iii) apoio ao projeto.

A ENEL GREEN POWER, parceira do setor privado e doadora dos recursos financeiros do projeto, integrará o Comitê de Acompanhamento do Projeto e caso seja analisado como necessário, representantes da sociedade civil, academia e outros atores relevantes poderão ser convidados para as reuniões do CAP com o aval dos seus integrantes permanentes.

Abaixo do CAP, se formará o Comitê Gestor do Projeto (CGP) formado pelo PNUD e SEMAR, com função executiva para implementação das orientações estratégicas do CAP. O CGP e o CAP deverão ser acionados para deliberação, quando necessário, pelo Gerente do Projeto, indicado pelo

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Representante Residente do PNUD e responsável pela coordenação das atividades e seu gerenciamento.

O projeto deverá contar com uma auditoria externa independente, a ser contratada com recursos do próprio projeto, para analisar a conformidade na execução do projeto de acordo com os procedimentos de auditoria do PNUD. As auditorias serão conduzidas conforme a política de auditoria do PNUD para gestão de risco financeiro, aplicáveis a projetos de execução direta. O escritório do PNUD Brasil é responsável pela aplicação integral das regras e procedimentos do PNUD na implementação, monitoramento e avaliação do projeto, bem como deve garantir que os custos da execução direta do mesmo sejam recuperados no âmbito do presente projeto. Mais detalhes sobre a governança e a gestão do projeto estarão no capítulo *VIII Arranjos de Governança e de Gerenciamento.*

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

V. MATRIZ DE RESULTADOS

Resultado do UNDAF: 3 - Capacidades institucionais fortalecidas para promover as políticas públicas, sua coerência e implementação, para a gestão sustentável de recursos naturais e serviços ecossistêmicos e o combate às mudanças do clima e seus efeitos adversos							
Resultado do Documento de Programa do País CPD para o qual este projeto contribuirá: 2 - Planeta: Gestão sustentável dos recursos naturais para as gerações							
Output do Plano Estratégico do PNUD: 3: Apoio à implementação do marco regulatório ambiental e políticas relacionadas que promovam a gestão sustentável dos recursos naturais, serviços ecossistêmicos efetivos, utilização e mudanças no uso do solo, recuperação de áreas degradadas, bem como a gestão territorial e ambiental pelos povos indígenas, quilombolas e populações rurais.							
Título do Projeto e Número do Atlas: BRA 21/006 - Recuperação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável de Áreas de Desertificação no Estado do Piauí							
Produtos Esperados	INDICADORES DE PRODUTO	**FONTE DO DADO**	**METAS**				**Método de Coleta do dado**
			Ano	**Ano 1**	**Ano 2**	**FINAL**	
Produto 1 **Dados, indicadores e perfis do público beneficiário do projeto produzidos, incluindo a perspectiva de gênero, para identificar as demandas e potencialidades locais para acelerar o desenvolvimento sustentável do município e do entorno territorial com base nos ODS**	*Ativos ambientais, dinâmicas vocacionais e potencialidades econômicas do município mapeadas*	*PNUD SEMAR*	2022	*1*	-	*1 instrumento de pesquisa*	*Relatórios de consultoria*
	Diagnóstico de gênero do território	*PNUD*	*2022*	*1*	-	*1 relatório*	*Relatório de consultoria*
	Necessidades do público beneficiário mapeadas e tecnologias sociais adequadas definidas	*PNUD ENEL*	2022	*1*	-	*Cadastro com 100% das tecnologias definidas*	*Relatório*
	Beneficiários mobilizados nas comunidades impactadas pelos danos ambientais	*PNUD*	2022	*90%*	-	*90% de adesão dos beneficiários*	*Documento de adesão* *Relatórios*
	Diagnósticos situacionais e análise dos ODS integrados no planejamento dos municípios	*PNUD*	2022	*5*		*5 relatório*	*Relatórios*
		PNUD	2022		*1*	*1 Estudo realizado*	*Linhas de base*

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

	Estudo sobre impactos potencializados pela sinergia das ações implementadas no município com base nos ODS						
	Capacidade dos atores/organizações representativas fortalecidas em planej. para promover desenvolvimento sustentável	*PNUD*	2022	*2*	*-*	*5 eventos de capacitação / 75 pessoas*	*Relatórios* *Listas de presença*
	Seminários para apreciação e discussão dos resultados das ações	*PNUD*	2022	*-*	*2*	*2 eventos /50 pessoas*	*Relatórios* *Listas de presença*
Produto 2 **Famílias capacitadas a partir de cursos, instalação de estruturas de tecnologias sociais, treinamentos para introduzir tecnologias sociais e práticas de manejo sustentável do solo para promover a agricultura sustentável e contribuir para o acesso à água, saneamento básico, segurança alimentar e conservação do solo e biodiversidade locais.**	*Agentes públicos e multiplicadores (técnicos estaduais, municipais, extensionistas, agricultores) capacitados em práticas de recuperação de áreas degradadas por desertificação e de uso dos ativos ambientais;*	*PNUD* *SEMAR*	2022	*1*	*1*	*2 eventos / 50 participantes*	*Relatórios* *Listas de presença*
	Alunos e professores de São Gonçalo e municípios do entorno capacitados em práticas de proteção de ambiental de áreas degradadas/uso dos ativos ambientais e energia sustentável;	*PNUD*	2022	*02*	*02*	*5 eventos 250 participantes*	*Relatório* *Listas de presença*
	Famílias capacitadas em práticas de associativismo, com ferramentas de gestão, produção e comercialização	*PNUD*	2022	*35%*	*35%*	*70% famílias 84 pessoas*	*Relatórios* *Listas de presença*
	Famílias capacitadas para desenvolver atividades produtivas em apicultura/meliponicultura para produção de mel e polinização de culturas comercializáveis;	*PNUD*	2022	*25%*	*25%*	*50% famílias 60 pessoas*	*Relatórios* *Listas de presença*
	Seminário regional sobre o tema da recuperação de áreas degradadas por desertificação/ apresentação de práticas inovadoras	*PNUD* *SEMAR*	2022	*-*	*01*	*01 evento Representante municípios afetados/ 80 pessoas*	*Relatório documento publicado*
			2022	*50*	*50*	*100*	

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

	Governança do município fortalecida para utilização racional do solo e da água na produção de alimentos respeitando a biodiversidade e o contexto ambiental do território	*SEMAR PNUD*					*Relatórios, listas de presença*
	Capacitações e consultorias, visitas às práticas bem sucedidas, networking com outros estados com dinâmicas vocacionais produtivas em contexto de desertificação	*PNUD*	2022	*10 02*	*10 01*	*20 capacitações / consultorias 3 Visitas*	*Relatórios / Certificados/ Listas de presença*
	Número de agentes e beneficiários capacitados em produção orgânica, convivência com o bioma local, princípios da agroecologia e práticas rurais alternativas ao uso do fogo	*PNUD*	2022	*100*	*100*	*200 capacitados*	*Relatórios Listas de presença*
	Mulheres das famílias beneficiárias e do município habilitadas pelas oficinas de formação promovidas pelo projeto	*PNUD*	2022	*30%*	*30%*	*30% de mulheres*	*Relatórios Listas de presença*
Produto 3 **Tecnologias sociais implantadas, acesso à agua e programa de produção sustentável de alimentos introduzidos**	*Famílias beneficiárias do projeto com acesso à agua em casa*	*PNUD / ENEL*	2022	*100%*	-	*100%*	*Relatório / Fotos*
	Famílias beneficiárias e outros atores do município utilizando práticas de uso racional do solo e da água para produção sustentável de alimentos	*PNUD*	2022	*60*	*60*	*120*	*Relatórios* *Manuais*
	Governança dos 5 municípios afetados por desertificação no estado melhorada para a utilização racional do solo e da água respeitando a biodiversidade e o contexto ambiental do território	*PNUD*	2022	*40%*	*30%*	*70% dos gestores locais e beneficiárias capacitadas / 50 pessoas*	*Relatórios* *Listas de presença*
	Ações de manejo e conservação de solos, água e biodiversidade disseminadas para evitar degradação dos ativos ambientais na região	*PNUD*	2022	*1*	*1*	*2 eventos*	*Relatórios* *Listas de presença*
	Visitas às práticas bem-sucedidas em contextos similares relacionadas às dinâmicas vocacionais produtivas locais e regionais	*PNUD*	2022	*1*	*2*	*3 missões técnicas / 80 pessoas*	*Relatórios* *Listas de participantes*
	Núcleo de produção de mel e polinização para famílias beneficiárias do projeto implantado com	*PNUD*	2023	-	*1 unidade concluída*	*1 unidade concluída*	*Certificado do MAPA*

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

	unidade de extração e beneficiamento, equipamentos e indumentária						
	Tecnologias sociais sustentáveis implantadas com o foco na melhoria dos indicadores humanos do público beneficiário do projeto	*PNUD SEMAR*	2022	*40% das famílias atendidas*	*30% das famílias atendidas*	*70% das famílias beneficiárias atendidas*	*Instrumento de adesão* *Relatórios*
	Ampliação da produção de alimentos e elevação da produtividade no município pela introdução de ferramentas inovadoras e sustentáveis	*PNUD*	2022	*2 ferramentas*	*2 ferramentas*	*4 ferramentas implantadas*	*Relatórios*
	Tecnologias implantadas para reutilização segura das águas residuárias para fins agrícolas introduzidas junto às famílias beneficiárias	*PNUD*	2022	*2* *50% das famílias atendidas*	*2* *50% das famílias atendidas*	*4 Oficinas* *100% famílias atendidas*	*Relatórios* *Listas de presença*
Produto 4 **Gestão eficiente do projeto e comunicação social e assegurada**	*Plano de comunicação do projeto*	*PNUD*	2022	*1*	*-*	*Plano de comunicação*	*Relatório*
	Número de matérias produzidas e divulgadas no nível local e territorial sobre ações do projeto	*PNUD* *SITES* *JORNAIS*	2022	*12*	*12*	*24 matérias produzidas*	*Matérias*
	Número de publicações online, relacionadas as ações realizadas e resultados alcançados pelo projeto	*SITES, PORTAIS JORNAIS*	2022	*40*	*40*	*100 ações de publicização das ações do projeto*	*Sites portais e redes sociais* *Tweets / Feeds*
	Número de seminários de capacitação da equipe de gestão e colaboradores para implementação do projeto	*PNUD*	2022	*2*	*2*	*04 eventos / 80 pessoas*	*Relatórios* *Listas de presenças*
	Número de relatórios com a sistematização das lições de boas práticas e metodologias com a implementação das ações	*PNUD*	2022	*-*	*2*	*02 relatórios realizados*	*Relatórios* *Sistematização*

	Documentos produzidos com sistematização de conhecimentos gerados pelo projeto/documentação das lições aprendidas e boas práticas desenvolvidas	*PNUD*	2022	*1*	*2*	*02 relatórios de progresso e 01 documento com gestão do conhecimento*	*Relatórios Documentos*
	Auditoria realizada	*PNUD*	2022	*1*	*1*	*02 auditorias*	*Relatório*

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

De acordo com as políticas e procedimentos do PNUD, o projeto será monitorado e avaliado de acordo com o plano abaixo:

Plano de Monitoramento

Atividade de Monitoramento	Frequência	Custo	Cronograma
Progresso dos Resultados	Trimestralmente		
Monitoramento e Gestão de Riscos Usar a matriz de risco anexa e ativar no Atlas, incluir as medidas previstas pelo UNDP's Social and Environmental Standards	Trimestralmente		
Lições Aprendidas Registrar e integrar ao projeto	Anualmente		
Revisão Anual da Qualidade do Projeto Analisar a os pontos fortes e fracos do projeto de acordo com os padrões de qualidade do PNUD	Anualmente		
Relatório de Progresso Apresentado ao Comitê do projeto mostrando os resultados atingidos em comparação às metas previstas, atualização da matriz de riscos e medidas de mitigação	Anualmente e ao final do projeto		

Ano/mês	*Jan*	*Fev.*	*Mar*	*Abr.*	*Mai*	*Jun.*	*Jul.*	*Ago.*	*Set*	*Out*	*Nov.*	*Dez*
2020	*QP*		*GR*	*PR*		GR	PR		GR	*LA/PR*	*RP/TPR*	GR
2021	*QP*		GR	PR		GR	PR		GR	*LA/PR*	*RP/TPR*	GR
2022	*QP*		GR	PR		GR	PR		GR	*LA/PR*	*RP/TPR*	GR

Legenda:

PR- Progresso dos Resultados

GR- Monitoramento e Gestão de Riscos

LA- Lições Aprendidas

QP- Revisão Anual da Qualidade do Projeto

RP - Relatório de Progresso;

Reunião Tripartite do Comitê do Projeto (PNUD, ABC e Agência Executora) Análise do desempenho do projeto, execução orçamentaria, revisão do plano multianual, lições aprendidas,	Anualmente		TPR - Reunião Tripartite; Auditorias anuais poderão ainda ser realizadas no projeto, como definido pelas regras do PNUD.

Plano de Avaliação

Tipo de Avaliação	Parceiros	Resultado UNDAF/CPD	Ano de Finalização	Parceiros da Avaliação	Custo	Fonte de Recursos
Avaliação de Meio termo		Pessoas/Prosperidade	2022			Projeto
Avaliação final		Pessoas/Prosperidade	2023			Projeto

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

VII. PLANO DE TRABALHO PLURIANUAL [8] [9]

Produto	ID	Atividades	Account	Quant	Valor unitário	2022	2023	2024	Resp. pela implementação	Fonte de recursos	Total em U$
Produto 1 - Produção de dados, indicadores e perfis do público beneficiário do projeto, com identificação das potencialidades para acelerar o desenvolvimento sustentável do município e entorno territorial com base nos ODS.	1.1	1.1. Convalidar diagnóstico do público beneficiário do projeto e do contexto socioeconômico do município, promover o levantamento e cadastro detalhado de demandas das famílias beneficiárias e definir tecnologias sociais adequadas para cada uma	72600 - Carta Acordo	1	$ 41,607.97	$ 41,607.97	$ -	$ -	Entidade Selecionada / PNUD	ENEL	$ 41,607.97
	1.2	Monitoramento das atividades da carta acordo	71600 - Pass.-DAS-TE	4	$ 780.00	$ 3,120.00	$ -	$ -	PNUD	ENEL	$ 3,120.00

[8] Definição de custos e classificações para o programa e para efetividade do desenvolvimento (operações) a serem custeadas pelo projeto estão definidas na decisão da Junta Executiva do PNUD DP/2010/32

[9] Mudanças no orçamento de projeto que afetem escopo (produtos), vigência ou custos estimados totais requerem uma revisão orçamentária formal que deve ser assinada pelo Comitê de Acompanhamento do Projeto. Em outros casos, o gestor do Programa do PNUD pode assinar isoladamente a revisão, desde que os demais signatários não possuam objeção. Este procedimento pode ser aplicado por exemplo quando o propósito da revisão é apenas para reprogramar atividades ao longo dos anos de vigência.

		para garantir qualidade e eficácia	71300 - consultoria PF	1	$ 14,987.40	$ 14,987.40	$ -	$ -	PNUD	ENEL	$ 14,987.40
	1.3	Implantar arranjo institucional para fortalecer a capacidade dos atores sociais e organizações representativas dos municípios com a participação colaborativa com foco na melhoria da gestão e monitoramento das ações	71400 - service contract	2	$ 1,100.00	$ 1,100.00	$ 1,100.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 2,200.00
			72100 - consultoria PJ	2	$ 2,244.63	$ 2,244.63	$ 2,244.63	$ -	PNUD	ENEL	$ 4,489.26
			71300 - consultoria PF	1	$ 17,957.08	$ 8,978.54	$ 8,978.54	$ -	PNUD	ENEL	$ 17,957.08
			71600 - Pass.-DAS-TE	4	$ 780.00	$ 1,560.00	$ 1,560.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 3,120.00
	1.4	Elevar capacidade de planejamento de São Gonçalo do Gurguéia e municípios do entorno com a integração dos ODS no PPA para elevar indicadores de desenvolvimento humano	71400 - service contract	2	$ 1,100.00	$ 1,100.00	$ 1,100.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 2,200.00
			71300 - consultoria PF	1	$ 8,841.89	$ 4,420.94	$ 4,420.94	$ -	PNUD	ENEL	$ 8,841.89
			71600 - Pass.-DAS-TE	7	$ 780.00	$ 2,730.00	$ 2,730.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 5,460.00
			72100 - consultoria PJ	5	$ 693.48	$ 2,311.60	$ 1,155.80	$ -	PNUD	ENEL	$ 3,467.41
	1.5	Desenvolver estudo sobre impactos potencializados pela sinergia das ações implementadas no município com base nos ODS	71300 - consultoria PF	1	$ 10,510.00	$ -	$ -	$ 10,510.00	PNUD	ENEL	$ 10,510.00
			71400 - service contract	2	$ 1,100.00	$ -	$ -	$ 2,200.00	PNUD	ENEL	$ 2,200.00
			71600 - Pass.-DAS-TE	2	$ 780.00	$ -	$ -	$ 1,560.00	PNUD	ENEL	$ 1,560.00
Produto 2 - Beneficiários do projeto	2.1	Promover a capacitação dos beneficiários e atores do município de São Gonçalo do	71300 - consultoria PF	1	$ 8,335.00	$ -	$ 8,335.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 8,335.00

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

capacitadas a partir de cursos, treinamentos e práticas de manejo sustentável para promover a agricultura sustentável,com a melhoria da gestão da água, saneamento básico e respeito à conservação do solo e biodiversidade locais		Gurguéia no uso de tecnologias sociais, incluindo o saneamento rural e tratamento sanitário , com o aprimoramento da governança da água e utilização racional do solo para produção de alimentos respeitando a biodiversidade e o contexto ambiental do território	71600 - Pass.-DAS-TE	6	$ 780.00	$ -	$ 4,680.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 4,680.00
			72100 - consultoria PJ	1	$ 5,253.00	$ -	$ 5,253.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 5,253.00
			72100 - consultoria PJ	4	$ 1,051.00	$ -	$ 1,051.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 1,051.00
			71400 - service contract	2	$ 1,100.00	$ -	$ 2,200.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 2,200.00
	2.2	Desenhar plano de ação para a garantia da participação de mulheres entre as beneficiárias diretas do projeto, levando em conta a divisão sexual do trabalho e as múltiplas jornadas de trabalho entre outras barreiras de participação enfrentadas por esse grupo social	71300 - consultoria PF	1	$ 6,724.00	$ 3,362.00	$ 3,362.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 6,724.00
			71600 - Pass.-DAS-TE	2	$ 780.00	$ 780.00	$ 780.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 1,560.00
			72100 - consultoria PJ	4	$ 1,051.00	$ 2,102.00	$ 2,102.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 4,204.00
	2.3	Introduzir a cultura do associativismo e promover a capacitação das famílias beneficiárias nas práticas de produção coletiva, com a introdução de ferramentas para fortalecimento da organização, gestão, produção e comercialização	71300 - consultoria PF	1	$ 6,724.00	$ 3,362.00	$ 3,362.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 6,724.00
			71600 - Pass.-DAS-TE	6	$ 780.00	$ 2,340.00	$ 2,340.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 4,680.00
			72100 - consultoria PJ	1	$ 7,004.00	$ -	$ 7,004.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 7,004.00
			72100 - consultoria PJ	5	$ 1,051.00	$ 2,627.50	$ 2,627.50	$ -	PNUD	ENEL	$ 5,255.00

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

	2.4	Promover cursos e treinamentos de apicultura/meliponicultura para capacitar as famílias beneficiárias no manejo produtivo de mel e polinização de culturas comercializáveis	71300 - consultoria PF	1	$ 5,200.00	$ 2,600.00	$ 2,600.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 5,200.00
			71300 - consultoria PF	1	$ 5,600.00	$ -	$ 5,600.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 5,600.00
			72100 - consultoria PJ	1	$ 5,253.00	$ 5,253.00	$ -	$ -	PNUD	ENEL	$ 5,253.00
			71600 - Pass.- DAS-TE	5	$ 780.00	$ 1,560.00	$ 2,340.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 3,900.00
			72100 - consultoria PJ	5	$ 1,051.00	$ 2,102.00	$ 3,153.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 5,255.00
	2.5	Promover programa de formação dos beneficiários, agentes públicos e multiplicadores (técnicos estaduais, municipais, extensionistas, agricultores), em práticas de produção de alimentos em áreas degradadas e de uso dos ativos ambientais para utilização racional do solo e da água, abordando os princípios da agroecologia, produção orgânica e convivência com o bioma local	71300 - consultoria PF	1	$ 14,000.00	$ -	$ 14,000.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 14,000.00
			72100 - consultoria PJ	1	$ 8,660.00	$ -	$ 8,660.00				$ 8,660.00
			72100 - consultoria PJ	5	$ 1,051.00	$ -	$ 5,255.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 5,255.00
			71600 - Pass.- DAS-TE	6	$ 780.00	$ 2,340.00	$ 2,340.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 4,680.00
	2.6	Realizar seminário regional sobre o tema da recuperação de áreas degradadas por	71400 - service contract	2	$ 1,100.00	$ -	$ 2,200.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 2,200.00
			71600 - Pass.- DAS-TE	8	$ 780.00	$ -	$ 6,240.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 6,240.00

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

		desertificação e incentivar a implantação de práticas inovadoras	72100 - consultoria PJ	1	$ 22,800.00	$ -	$ 22,800.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 22,800.00
	2.7	Prover subsídios, capacitações e consultorias, visitas às práticas bem-sucedidas, networking com outros estados de acordo com dinâmicas vocacionais produtivas locais e promover a articulação de atores estaduais e nacionais	71300 - consultoria PF	1	$ 6,800.00	$ -	$ 4,533.33	$ 2,266.67	PNUD	ENEL	$ 6,800.00
			71400 - service contract	3	$ 1,100.00	$ -	$ 2,200.00	$ 1,100.00			$ 3,300.00
			72100 - consultoria PJ	4	$ 8,411.21	$ -	$ 16,822.43	$ 16,822.43	PNUD	ENEL	$ 33,644.86
			71600 - Pass.- DAS-TE	6	$ 780.00	$ -	$ 2,340.00	$ 2,340.00	PNUD	ENEL	$ 4,680.00
	2.8	Realizar um programa de formação ambiental para escolas públicas nos 5 municípios do projeto com dois focos prioritários: i) conservação dos recursos naturais e o controle do meio ambiente, em especial do bioma local, incentivando novos hábitos e práticas sustentáveis; e ii) as energias renováveis, meio ambiente e sustentabilidade	71300 - consultoria PF	1	$ 10,510.00	$ 10,510.00	$ -	$ -	PNUD	ENEL	$ 10,510.00
			72100 - consultoria PJ	1	$ 8,660.00	$ -	$ 8,660.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 8,660.00
			71600 - Pass.- DAS-TE	4	$ 780.00	$ 1,560.00	$ 1,560.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 3,120.00
			71400 - service contract	5	$ 1,100.00	$ 2,200.00	$ 3,300.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 5,500.00
Produto 3. Tecnologias sociais implantadas e programas de produção sustentável de	3.1	Promover a instalação de um ponto de acesso à agua para todas as famílias beneficiárias diretas do Projeto	71300 - consultoria PF	1	$ 9,061.68	$ 9,061.68	$ -	$ -	PNUD	ENEL	$ 9,061.68
			71600 - viagens. Diárias, aj de custos	5	$ 780.00	$ 3,900.00	$ -	$ -	PNUD	ENEL	$ 3,900.00

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

alimentos introduzidos			72600 - Carta Acordo/ PJ	1	$ 302,171.00	$ 302,171.00	$ -	$ -	PNUD	ENEL	$ 302,171.00
	3.2	Implementar tecnologias sociais sustentáveis com a utilização de tecnologias de conservação de solos, água e biodiversidade em áreas degradadas, de forma participativa, para as famílias afetadas por danos ambientais	72600 - Carta Acordo	1	$ 249,600.00	$ 62,400.00	$ 124,800.00	$ 62,400.00	Entidade(s) selecionada(s)	ENEL	$ 249,600.00
	3.3	Monitoramento das atividades relacionadas à Carta Acordo	71300 - consultoria PF	1	$ 35,958.40	$ 8,989.60	$ 17,979.20	$ 8,989.60	PNUD	ENEL	$ 35,958.40
	3.4	Implementar tecnologias para segurança na reutilização das águas residuárias para fins agrícolas, destacando a importância da qualidade biológica dos efluentes para evitar riscos de propagação de patógenos e doenças (piloto)	71300 - consultoria PF	4	$ 4,112.15	$ -	$ 16,448.60	$ -	PNUD	ENEL	$ 16,448.60
			71600 - Pass.-DAS-TE	4	$ 780.00	$ -	$ 3,120.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 3,120.00
			72100 - consultoria PJ	4	$ 2,200.00	$ -	$ 8,800.00	$ -	PNUD	ENEL	$ 8,800.00
	3.5	Estruturar núcleos agrícolas nas comunidades beneficiárias para produção de alimentos com a utilização de tecnologia introduzidas pelo projeto (inclui instalação e material e apoio/assistência técnica continuada na implantação	71300 - consultoria PF	1	$ 24,919.63	$ -	$ 16,613.08	$ 8,306.54	PNUD	ENEL	$ 24,919.63
			71400 - service contract	4	$ 1,100.00	$ -	$ 2,200.00	$ 2,200.00	PNUD	ENEL	$ 4,400.00

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

		de pequenos projetos produção de alimentos	71600 - Pass.-DAS-TE	8	$ 780.00	$ -	$ 3,120.00	$ 3,120.00	PNUD	ENEL	$ 6,240.00
			72100 - consultoria PJ	1	$ 157,870.00	$ -	$ 105,246.67	$ 52,623.33	PNUD	ENEL	$ 157,870.00
	3.6	Estruturar núcleo de apicultura/ meliponicultura para famílias beneficiárias do projeto com a implantação e certificação de unidade de extração, beneficiamento e estocagem (UEPA)	71300 - consultoria PF	1	$ 9,061.68	$ -	$ 6,041.12	$ 3,020.56	PNUD	ENEL	$ 9,061.68
			71400 - service contract	8	$ 780.00	$ -	$ 3,744.00	$ 2,496.00	PNUD	ENEL	$ 6,240.00
			71600 - Pass.-DAS-TE	6	$ 780.00	$ -	$ 2,340.00	$ 2,340.00	PNUD	ENEL	$ 4,680.00
			72100 - consultoria PJ	1	$ 59,813.08	$ -	$ 59,813.08	$ -	PNUD	ENEL	$ 59,813.08
	3.7	Realizar estudo de impacto das ações implementadas pelo projeto tomando com base os indicadores dos ODS, com recorte especial na condição de vida das mulheres e na estrutura de desigualdade de gênero do município	71300 - consultoria PF	1	$ 9,439.25	$ -	$ -	$ 9,439.25	PNUD	ENEL	$ 9,439.25
			71600 - Pass.-DAS-TE	4	$ 780.00	$ -	$ -	$ 3,120.00	PNUD	ENEL	$ 3,120.00
			71400 - service contract	2	$ 1,100.00	$ -	$ -	$ 2,200.00	PNUD	ENEL	$ 2,200.00
Produto 4 - Comunicação e Gestão do Projeto assegurados	4.1	Criar identidade visual e implementar um plano de comunicação do projeto	71300 - consultoria PF	1	$ 10,467.00	$ 4,186.80	$ 4,186.80	$ 2,093.40	PNUD	ENEL	$ 10,467.00
			71600 - Pass.-DAS-TE	4	$ 780.00	$ 1,560.00	$ 780.00	$ 780.00	PNUD	ENEL	$ 3,120.00
			72100 - consultoria PJ	1	$ 3,813.08	$ 3,813.08			PNUD	ENEL	$ 3,813.08

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

	4.2	Mobilizar e estabelecer uma rede de comunicação junto aos beneficiários do projeto e demais atores relevantes para o projeto	71300 - consultoria PF	1	$ 4,037.38	$ 2,018.69	$ 2,018.69	$ -	PNUD	ENEL	$ 4,037.38
			71600 - Pass.- DAS-TE	4	$ 780.00	$ 1,560.00	$ 780.00	$ 780.00	PNUD	ENEL	$ 3,120.00
			71400 - service contract	4	$ 1,100.00	$ 2,200.00	$ 1,100.00	$ 1,100.00	PNUD	ENEL	$ 4,400.00
	4.3	Coordenar, acompanhar, monitorar, avaliar e produzir relatórios da implementação das ações do projeto	71400 - service contract	2	$ 65,112.00	$ 32,556.00	$ 65,112.00	$ 32,556.00	PNUD	ENEL	$ 130,224.00
			71600 - Pass.- DAS-TE	20	$ 780.00	$ 3,900.00	$ 7,800.00	$ 3,900.00	PNUD	ENEL	$ 15,600.00
			72100 - consultoria PJ	4	$ 4,530.84	$ 4,530.84	$ 9,061.68	$ 4,530.84	PNUD	ENEL	$ 18,123.36
			71400 - service contract	1	$ 10,500.00	$ 2,625.00	$ 5,250.00	$ 2,625.00	PNUD	ENEL	$ 10,500.00
	4.4	Capacitar equipe de gestão e agentes de parceiros para implementação do projeto	71400 - service contract	12	$ 1,100.00	$ 3,300.00	$ 6,600.00	$ 3,300.00	PNUD	ENEL	$ 13,200.00
			72100 - consultoria PJ	12	$ 1,100.00	$ 3,300.00	$ 6,600.00	$ 3,300.00	PNUD	ENEL	$ 13,200.00
			71600 - Pass.- DAS-TE	8	$ 780.00	$ 3,120.00	$ 1,560.00	$ 1,560.00	PNUD	ENEL	$ 6,240.00
	4.5	Constituir grupos de aprendizado no território de atuação do projeto para subsidiar execução e aprendizado de lições apreendidas e boas práticas	71300 - consultoria PF	1	$ 10,605.00	$ -	$ 5,302.50	$ 5,302.50	PNUD	ENEL	$ 10,605.00
			71400 - service contract	5	$ 2,200.00	$ -	$ 5,500.00	$ 5,500.00	PNUD	ENEL	$ 11,000.00
			71600 - Pass.- DAS-TE	8	$ 780.00	$ -	$ 3,120.00	$ 3,120.00	PNUD	ENEL	$ 6,240.00
			72100 - consultoria PJ	5	$ 1,051.00	$ -	-	$ 5,255.00	PNUD	ENEL	$ 5,255.00

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

	4.6	Constituir grupo de monitoramento das atividades do projeto que podem eventualmente impactar negativamente a vida das mulheres, com o objetivo de corrigir rotas de ação	71300 - consultoria PF	1	$ 8,484.00	$ -	$ 4,242.00	$ 4,242.00	PNUD	ENEL	$ 8,484.00
			71600 - Pass.-DAS-TE	6	$ 780.00	$ 1,560.00	$ 1,560.00	$ 1,560.00	PNUD	ENEL	$ 4,680.00
			71400 - service contract	4	$ 1,100.00	$ -	$ 2,200.00	$ 2,200.00	PNUD	ENEL	$ 4,400.00
	4.7	Implementar plano de gestão do conhecimento/ sistematização e documentação das lições aprendidas e boas práticas desenvolvidas	71300 - consultoria PF	1	$ 10,506.00	$ -	$ -	$ 10,506.00	PNUD	ENEL	$ 10,506.00
			72100 - consultoria PJ	2	$ 5,050.00	$ -	$ -	$ 10,100.00	PNUD	ENEL	$ 10,100.00
			71600 - Pass.-DAS-TE	4	$ 780.00	$ -	$ -	$ 3,120.00	PNUD	ENEL	$ 3,120.00
			71400 - service contract	6	$ 1,100.00	$ -	$ -	$ 6,600.00	PNUD	ENEL	$ 6,600.00
			71300 - consultoria PF	1	$ 7,551.40	$ -	$ -	$ 7,551.40	PNUD	ENEL	$ 7,551.40
	4.8	Auditoria		2	$ 9,439.25	$ -	$ 9,439.25	$ 9,439.25	PNUD	ENEL	$ 18,878.50
						$ 583,612.28	$ 693,468.86	$ 328,075.78			$ 1,605,156.92
Total 1						**$ 583,612.28**	**$ 684,029.61**	**$ 318,636.53**			**$ 1,586,278.42**
Total c/auditoria						**$ 583,612.28**	**$ 693,468.86**	**$ 328,075.78**			**$ 1,605,156.92**
Total c/GMS (8%)						**$ 630,301.27**	**$ 748,946.37**	**$ 354,321.84**			**$ 1,733,569.48**
Total c/Levy (1%)						**$ 636,604.28**	**$ 756,435.83**	**$ 357,865.06**			**$ 1,750,905.17**

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

VIII. ARRANJOS DE GOVERNANÇA E DE GERENCIAMENTO

O Projeto será implementado pelo PNUD, na modalidade de execução direta (DIM), e seus arranjos de gestão e coordenação baseiam-se nas orientações contidas no Guia de Gerenciamento por Resultados e Regras e Procedimentos do PNUD. [10]

Comitês serão constituídos, em dois níveis, com a finalidade de supervisionar a implementação das atividades: o Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP) e o Comitê Gestor do Projeto (CGP).

O CAP, além das atribuições de supervisão, tem o papel de fornecer orientações estratégicas para o Projeto. Dele participam a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, o PNUD, a ENEL GREEN POWER e a SEMAR.

O CAP acompanhará o trabalho da coordenação operacional do Projeto (gerente de projeto e equipe de apoio) e se reunirá com periodicidade anual, podendo, no entanto, ocorrer com mais frequência a depender da necessidade de tratar de questões diretamente relacionadas à gestão e implementação do Projeto.

Por fim, o projeto contará com um Conselho Assessor, na qual tomarão parte, além do PNUD, a SEMAR, a ENEL e Prefeitura de São Gonçalo do Gurguéia. Outros membros poderão ser adicionados ao longo da implementação do projeto, se necessário. O Conselho Assessor participará de forma colaborativa ao Comitê de Acompanhamento do Projeto no planejamento das ações do projeto e do programa, assim como da apreciação de seus resultados.

Ocasionalmente, os dois Comitês poderão realizar reuniões conjuntas visando incrementar a comunicação entre as funções de supervisão e de coordenação operacional.

Responsabilidades do CAP:

a. Garantia da execução das atividades do projeto de acordo com objetivo de desenvolvimento do mesmo com alinhamento às políticas públicas brasileiras;
b. Decisões políticas serão tomadas sempre em estreita coordenação entre os membros do CAP;
c. Revisão, adoção e, se necessário, modificação dos Termos de Referência e Regras de Procedimento do CAP.
d. Aprovação do Documento do Projeto e elaboração de uma ata da respectiva reunião.
e. Aprovação de diretrizes estratégicas para a implementação do Projeto, de acordo com os marcos operacionais do PNUD.
f. Aprovação dos arranjos de gestão e coordenação.
g. Aprovação dos planos de trabalho e orçamentos anuais, realizando os ajustes necessários para o alcance dos resultados esperados.

[10] Programme and Operations Policies and Procedures.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

h. Revisão e análise do Relatório de Progresso.
i. Sugestão de ações para corrigir os rumos do Projeto, quando surgirem problemas estratégicos e de implementação.
j. Criação de sinergias e relações com projetos e programas similares apoiados por outros doadores.

A execução do Projeto fica a cargo do PNUD, que terá as seguintes atribuições:

a. Coordenação e implementação administrativa do Projeto.
b. Articulação com as agencias implementadoras selecionadas e outros parceiros chaves para consecução do projeto
c. Providências para contratação da equipe do projeto para o acompanhamento cotidiano da implementação do Projeto e suporte operacional à implementação do Projeto.
d. Gestão dos recursos para o alcance dos resultados e produtos definidos no documento de Projeto.
e. Alinhamento das atividades do Programa com as prioridades estratégicas aprovadas no UNDAF e CPD.
f. Estabelecimento das linhas básicas do Programa, para possibilitar processos confiáveis de monitoramento e avaliação.
g. Definição de procedimentos para elaboração dos relatórios do Projeto.
h. Integração entre planos de trabalho, orçamentos, relatórios e outros documentos do Projeto, assegurando que lacunas ou superposições de recursos orçamentários sejam corrigidas.
i. Recomendação ao CAP de realocação de recursos e revisões do orçamento, quando necessário.
j. Identificação de lições aprendidas.
k. Elaboração de planos de comunicação e informação para o público externo.
l. Liderança técnica e substantiva na implementação das atividades previstas no Plano de Trabalho Anual.
m. Resolução dos problemas de gestão e implementação.
n. Elaboração do Relatório de Progresso e Financeiro para reuniões do CAP.
o. Elaboração de Relatórios de Progresso e Financeiros Anuais para os parceiros.
p. Elaboração de revisão geral a cada novo acordo de custos compartilhados assinado (third-party cost-sharing agrément).

Atribuições da SEMAR-PI:

A SEMAR-PI é parceira e beneficiária direta desse projeto e, como tal, trabalhará de forma articulada com o PNUD no estabelecimento das definições técnicas e estratégicas do projeto. Será responsável ainda pela mobilização de técnicos no âmbito do governo e deverá participar das articulações junto a atores relevantes na área ambiental para fortalecer as ações previstas no projeto. Como gestor da política ambiental do Estado, a SEMAR terá função de interlocução com as demais secretarias envolvidas e com o

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Governo municipal na construção do projeto, apoiando na identificação de demandas e na mobilização dos atores no âmbito do estado, especialmente junto aos técnicos e especialistas que atuam nas políticas de proteção ambiental do estado.

Caberá a Enel Green Power doar os recursos financeiros para viabilizar as ações programadas neste projeto e como parceiro deverá participar do Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP) para monitorar a implementação das atividades, avaliar os resultados alcançados e propor eventuais correções e ajustes.

Caberá à ABC/MRE, em conformidade com suas diretrizes, normas e regulamentos, acompanhar o desenvolvimento do projeto sob os aspectos técnicos, mediante análise dos relatórios anuais recebidos e reuniões periódicas com seus responsáveis e com o PNUD, para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados.

Estrutura Organizacional do Projeto

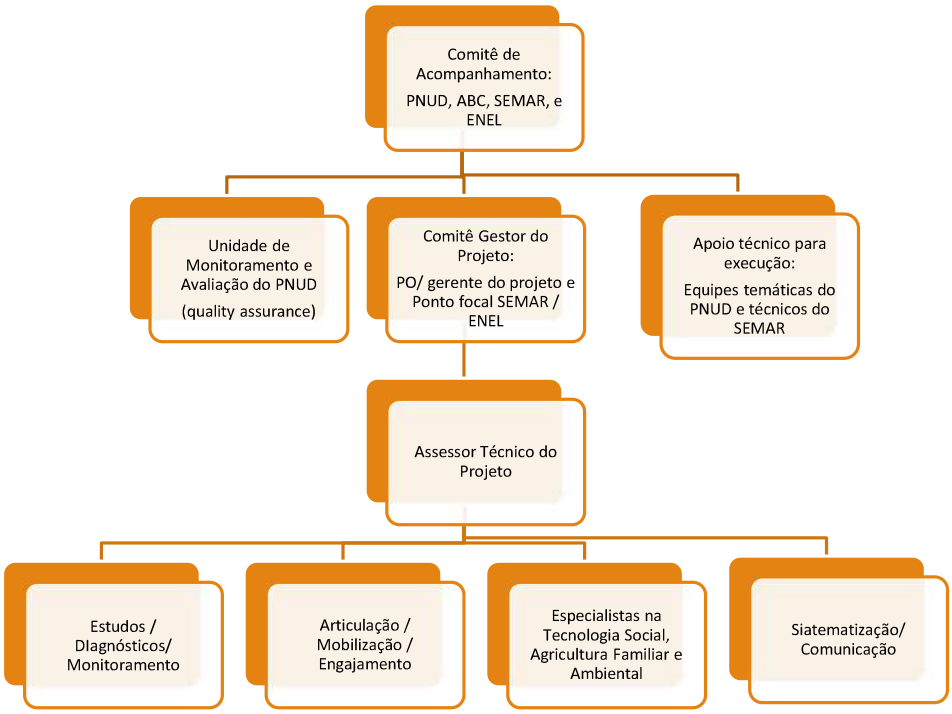

Para viabilizar a adequada execução do projeto, será designada no PNUD equipe para acompanhamento/execução do projeto, que trabalhará de forma articulada com os pontos focais designados pela SEMAR-PI na implementação das atividades previstas.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

O Projeto prevê ainda a assinatura de duas CARTAS ACORDO, uma ferramenta adotada pelo PNUD com o propósito de aportar expertise, valor agregado, internalizar pesquisas e conhecimento local e parcerias com organizações da sociedade civil.

O Projeto poderá sofrer adequações sugeridas pelo Comitê de Acompanhamento do Projeto, bem como pelo PNUD, à medida que sua necessidade se justifique no âmbito do Documento de Projeto acordado. Os recursos financeiros estarão definidos no orçamento e serão utilizados em conformidade com as Normas Financeiras e os Regulamentos do PNUD. Em temos operacionais, serão observados os Procedimentos do PNUD.

ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO

Os resultados e produtos previstos neste documento de projeto serão executados pelo PNUD, na modalidade de execução direta (DIM), por intermédio de contratação de equipe para execução do projeto, consultores pessoa física e consultorias pessoa jurídica, treinamento e alocação de funcionários de capacidade técnica em temas específicos ao objeto do projeto.

As regras e procedimentos de programa e operações do PNUD (POPP) estabelecem que a modalidade de execução direta deve ser aplicada a projetos de cooperação técnica em situações excepcionais, onde possa ser identificada uma situação especial de desenvolvimento que justifiquem a atuação direta do PNUD e quando há vantagens comparativas na gestão do projeto por meio dessa modalidade.

No presente projeto, a escolha pela modalidade de execução direta é justificada pelos seguintes fatores:

a. Características do projeto: O projeto está centralizado nas questões ambientais e sociais do município de São Gonçalo do Gurguéia, com os reflexos inevitáveis nas condições econômicas e sociais da população beneficiária, e as soluções propostas envolvem a aplicação considerável de metodologias participativas e a estruturação do estado no enfrentamento dos problemas ambientais em áreas degradadas. Outro aspecto que trará grande contribuição para o desenvolvimento sustentável na região são os conteúdos conceituais e temáticos da territorialização dos ODS. Considerando a capacidade instalada no estado, bem como a inevitável curva de aprendizagem pelos atores locais, o PNUD se coloca como ator melhor qualificado para executar o projeto, considerando sua longa trajetória e experiência no tema de territorialização dos ODS, bem como no tema de metodologias e tecnologias voltadas recuperação de áreas degradadas, prevenção e combate à queimadas.

b. Apropriação técnica pelas contrapartes locais: Para o governo do estado a implementação do projeto diretamente pelo PNUD proporcionará um importante suporte de recursos técnicos e maior rapidez na implementação das ações e entrega dos resultados, principalmente neste momento de crise

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

sanitária causada pela COVID-19, que exige um grande esforço do governo voltado para a mitigação dos impactos nos indicadores de desenvolvimento humano no estado. O Projeto pretende ainda contribuir para a integração dos ODS no território por meio do fortalecimento dos mecanismos participativos, uma vez que o amplo diálogo territorial e a convergência de interesses e institucionalidades passam pelo reconhecimento de sua realidade e pela produção de soluções conjuntas que permitam redefinir e participar da construção de seu processo de desenvolvimento. O PNUD também colocará à disposição do Projeto toda sua rede de parcerias, suas plataformas de conhecimento e troca de informações, além de suas ferramentas, metodologias e instrumentos de gestão e produção de inovações.

c. Capacidade do escritório do PNUD: o escritório regional no Piauí foi instalado em 2017 após a assinatura do MOU com o governo do estado para implementar iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável do estado tomando como referência os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no sentido de levá-lo a crescer economicamente, com inclusão social e proteção do meio ambiente. Esta estrutura conta com um coordenador e uma assistente de projetos e está plenamente capacitada para assumir a funções de execução e acompanhamento das ações locais, facilitando também as articulações com os parceiros e diálogos com representantes da sociedade civil, governo e do setor privado.

Na implementação do projeto de acordo com a modalidade de execução direta, aplicam-se as regras e procedimentos próprios do PNUD.

O projeto terá vigência até 31 de junho de 2023, podendo ser prorrogado, se necessário.

Os produtos do projeto serão implementados pelo PNUD por meio de contratação de equipe de projeto, consultores pessoa física por produto e consultores pessoa jurídica, treinamento e alocação de funcionários de capacidade técnica em temas específicos, como monitoramento e avaliação, comunicação, especialistas em desenvolvimento humanos, parcerias estratégicas com setor privado etc. Desde que com a aprovação do Comitê de Acompanhamento do Projeto e com a comprovação de utilização de recursos adicionais aos do projeto, os parceiros também poderão implementar atividades específicas.

Em todas as contratações será valorizada a capacidade de fornecimento local priorizando contratação de produtos e serviços de provedores locais, empresas e indivíduos residentes/ com sede no local de evento ou atividade. Quando possível serão conduzidos processos de licitação que promovem os conceitos de compras sustentáveis ambientalmente e/ou socialmente assim incorporando os princípios de desenvolvimento sustentável na gestão do projeto.

Direitos autorais dos produtos desenvolvidos serão do PNUD, contudo todos os materiais serão disponíveis sem custo para uso sem fins lucrativos pelos parceiros e

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

beneficiários, sempre reconhecendo contribuição dos doadores do projeto por meio de exibição das logomarcas em todos os materiais produzidos (publicações, sites, materiais de divulgação de eventos e outros). Os parceiros e doadores do projeto também serão convidados para fazer parte das atividades (eventos, capacitações, outros) do projeto de maneira prioritária.

ARRANJOS DE GESTÃO FINANCEIRA

O Projeto tem um orçamento total estimado em **R$ 9.653.580,89** (nove milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), equivalentes a **$ 1,750,905.17** (um milhão, setecentos e cinquenta mil, novecentos e cinco dólares e dezessete centavos) calculados a taxa de câmbio das Nações Unidas para o mês de junho de 2021. Os recursos para a execução do projeto serão depositados e contabilizados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e os procedimentos financeiros do PNUD. O repasse dos recursos pela empresa será feito diretamente ao PNUD.

A ENEL GREEN POWER transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na seguinte conta: UNDP Representative in Brazil USD Account; Bank of America, 1401 Elm St., Dallas TX 75202; Account Nº.: 375 222 0643; Wire Routing Number: 026009593; SWIFT Address: BOFAUS3N;

Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte do referido Organismo. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Governo Federal (1607-1), c/c 60746-0, PNUD PR NACOES UNIDAS, CNPJ 03.723.329.0001-79, Brasília, DF.

Os recursos previstos deverão ser repassados pela doadora em parcela única.

O projeto será financiado por recursos de doação do setor privado. A empresa doadora assinará acordos de custos compartilhados (third party cost sharing agréments) com o PNUD, que serão anexos ao presente documento de projeto. Ademais, serão emitidas revisões gerais a cada novo acordo de custos compartilhados assinado entre as partes.

No provimento pelo PNUD de serviços de apoio à execução do Projeto, serão observadas as disposições da Sistemática de Recuperação dos Custos do PNUD.

De acordo com as decisões e diretrizes do Conselho Executivo do PNUD incorporadas na Política de Recuperação de Custos sobre Outros Recursos, a contribuição estará sujeita a recuperação de custos pelo PNUD por duas categoriais de custos distintas, aplicáveis conforme o caso, quais sejam:

a) Custos Indiretos incorridos pelas estruturas da sede e do escritório local do PNUD a título de provisão de Serviços de Apoio de Gerenciamento (GMS). Para cobrir tais custos, será cobrada sobre a contribuição uma taxa de 8%. A doadora também se compromete a repassar a taxa de “Coordenação Levy”, de 1% a

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Resolução A/RES/72/279 da Assembleia Geral da ONU, aplicada ao valor do Projeto e destinada às atividades relacionadas ao desenvolvimento das Nações Unidas.

b) Custos Diretos incorridos a título de provisão de serviços de Apoio à Implementação (DPC) pelo PNUD. Estes custos devem estar relacionados a atividades específicas e serviços transacionais claramente identificáveis e relacionados em linha orçamentária correspondente.

ARRANJOS DE AUDITORIA

As auditorias serão conduzidas conforme a política de auditoria do PNUD para gestão de risco financeiro, aplicáveis a projetos de execução direta. O escritório do PNUD Brasil é responsável pela aplicação integral das regras e procedimentos do PNUD na implementação, monitoramento e avaliação do projeto, bem como deve garantir que os custos da execução direta dele sejam recuperados no âmbito do presente projeto.

Controle de qualidade

Em conformidade com os regulamentos programáticos do PNUD, o organismo cumprirá no projeto o papel de Controle de Qualidade (quality assurance). Esta responsabilidade inclui, principalmente:

- Assegurar que fundos sejam disponibilizados ao projeto;
- Assegurar que o projeto esteja fazendo progresso com relação aos produtos;
- Realizar atividades de monitoramento regulares, como visitas periódicas e “pontos de controle”;
- Assegurar que os recursos confiados ao PNUD sejam utilizados apropriadamente;
- Assegurar que a informação crítica sobre o projeto seja monitorada e atualizada via sistema Atlas;
- Assegurar que relatórios de progresso, CDR e demais documentos relevantes sejam submetidos ao Comitê de Acompanhamento de Projetos em tempo hábil:
- Assegurar que os riscos sejam apropriadamente gerenciados, e que os riscos sejam regularmente atualizados no Atlas;

No caso do presente projeto, o ponto focal do PNUD para este acompanhamento será o Oficial de Programa designado ao projeto pelo organismo.

Uso de logotipos nos produtos do projeto

Crédito aos parceiros do projeto deve ser reconhecido em todos os produtos decorrentes do projeto. Neste sentido, a utilização da logomarca do PNUD deve ser incluída nos materiais, publicações, sites etc. realizados pelo projeto. Tal inclusão

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

deverá respeitar a política de comunicação do Organismo e deve se basear em consulta prévia sobre as peças a serem divulgadas.

Encerramento do projeto

O encerramento do projeto abrange sua finalização em termos:

(i) Operacionais: o encerramento operacional tem foco nos registros e na sistematização da performance geral do projeto, de lições aprendidas, das evidências da conclusão de produtos da matriz lógica e nos encaminhamentos necessários para garantir a sustentabilidade de seus resultados. Uma reunião tripartite final, para análise do relatório de progresso final, será organizada para formalizar o encerramento operacional.

(ii) Financeiros: o projeto poderá ser financeiramente encerrado após operacionalmente concluído e após a confirmação de que todas as transações financeiras tenham sido encerradas. O PNUD emitirá um Combined Delivery Report – CDR final demonstrando a ausência de quaisquer movimentações financeiras relativas ao projeto, sendo este um pré-requisito para o encerramento formal. O projeto deverá ser financeiramente encerrado em até 1(um) ano após declarado como operacionalmente fechado. A emissão de Revisões Orçamentárias Semifinais e Finais do projeto, emitidas pelo PNUD com base em seus regulamentos, formalizarão o processo de encerramento financeiro. Motivações que causem excepcionalidades ou atrasos a esta orientação devem ser devidamente registradas entre as partes.

Caso intercorrências venham a suscitar a suspensão ou finalização precoce deste projeto, estas questões serão devidamente discutidas e avaliadas entre os signatários deste Documento, de forma a acordar os encaminhamentos necessários.

IX. CONTEXTO LEGAL PARA PROJETOS DE EXECUÇÃO DIRETA DO PNUD

O PNUD tem sua atuação regulada no Brasil pelo **Acordo Básico de Assistência Técnica**, que embasa a prestação da cooperação técnica pelas Nações Unidas no Brasil. O ABAT foi firmado em 29 de dezembro de 1964 entre o Governo da República Federativa do Brasil, a Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 11, de 1966, e promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966.

A atuação do PNUD no Brasil também é regida pela **Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas**, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de fevereiro de 1946, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 4, de 13 de fevereiro de 1948, ratificada sem reservas pelo Governo da República Federativa do Brasil em 15 de dezembro de 1949 e promulgada **pelo Decreto nº. 27.784, de 16 de fevereiro de 1950**.

Esta convenção multilateral dispõe sobre os privilégios e imunidades garantidos aos escritórios das Nações Unidas nos respectivos países.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

X. ANEXOS

1. **Análise dos Critérios de Qualidade do Projeto**
2. **Análise Social e Ambiental** *(Ver Formulário no Anexo 2).*
3. **Análise de Risco** *(Ver Matriz de Risco Anexo 3)*
4. **Insumos do Projeto – Listagem de Consultorias de Pessoa Física e Jurídica**

ANEXO I

Análise dos Critérios de Qualidade do Projeto na fase de Desenho e Formulação

Design & Appraisal Stage Quality Assurance Report

Form Status: Approved

Overall Rating:	Exemplary
Decision:	Approve: The project is of sufficient quality to continue as planned. Any management actions must be addressed in a timely manner.
Portfolio/Project Number:	00143571
Portfolio/Project Title:	BRA/22/007 Desenvolvimento Sul do Piaui
Portfolio/Project Date:	2022-05-03 / 2024-04-30

Strategic **Quality Rating: Exemplary**

1. Does the project specify how it will contribute to higher level change through linkage to the programme's Theory of Change?

- (●) *3: The project is clearly linked to the programme's theory of change. It has an explicit change pathway that explains how the project will contribute to outcome level change and why the project's strategy will likely lead to this change. This analysis is backed by credible evidence of what works effectively in this context and includes assumptions and risks.*
- ( ) 2: The project is clearly linked to the programme's theory of change. It has a change pathway that explains how the project will contribute to outcome-level change and why the project strategy will likely lead to this change.
- ( ) 1: The project document may describe in generic terms how the project will contribute to development results, without an explicit link to the programme's theory of change.

Evidence:

The project is clearly linked to the CPD theory of cha nge. It has an explicit change pathway that explains how the project will contribute to outcome level chan ge and why the project's strategy will likely lead to th is change. The project was elaborated as part of a la rger analysis that allowed the identification of SDG a ccelerators for the state. This analysis is backed by credible evidence of what works effectively and is ba sed on prior experience on desertification and sustai nable agriculture in Sergipe also impeented by UND P as demonstrated in the ProDoc

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	FINAL_12869_101 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/FINAL_12869_101.pdf)	ieva.lazareviciute@undp.org	5/5/2022 7:10:00 PM
2	AtaPAC_BRA21006_Enel_16-09-2021_assinada_12869_101 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/AtaPAC_BRA21006_Enel_16-09-2021_assinada_12869_101.pdf)	ieva.lazareviciute@undp.org	5/12/2022 7:37:00 PM
3	Prodoc-Enel-09092021_BRA22007_SEMAR-PIaprovadoABC_170222ILFinal_12869_101 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Prodoc-Enel-09092021_BRA22007_SEMAR-PIaprovadoABC_170222ILFinal_12869_101.docx)	ieva.lazareviciute@undp.org	5/12/2022 7:39:00 PM

2. Is the project aligned with the UNDP Strategic Plan?

- *3: The project responds to at least one of the development settings as specified in the Strategic Plan[1] and adapts at least one Signature Solution[2]. The project's RRF includes all the relevant SP output indicators. (all must be true)*
- 2: The project responds to at least one of the development settings as specified in the Strategic Plan[4]. The project's RRF includes at least one SP output indicator, if relevant. (both must be true)
- 1: The project responds to a partner's identified need, but this need falls outside of the UNDP Strategic Plan. Also select this option if none of the relevant SP indicators are included in the RRF.

Evidence:

The project respons to all three development setting s through the multidisciplinary approach and adapts Signature Solutions 1,2,4 and 6

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

3. Is the project linked to the programme outputs? (i.e., UNDAF Results Group Workplan/CPD, RPD or Strategic Plan IRRF for global projects/strategic interventions not part of a programme)

- (•) *Yes*
- ( ) No

Evidence:

Contribui para o Resultado 3 do UNDAF: Capacidad es institucionais fortalecidas para promover as políti cas públicas, sua coerência e implementação, para a gestão sustentável de recursos naturais e serviços ecossistêmicos e o combate às mudanças do clima e seus efeitos adversos
Contribui para o Resultado 2 do CPD: Planeta: Gest ão sustentável dos recursos naturais para as geraçõ es atuais e futuras

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

Relevant **Quality Rating: Exemplary**

4. Do the project target groups leave furthest behind?

- *3: The target groups are clearly specified, prioritising discriminated, and marginalized groups left furthest behind, identified through a rigorous process based on evidence.*
- 2: The target groups are clearly specified, prioritizing groups left furthest behind.
- 1: The target groups are not clearly specified.

Evidence:

The target groups are clearly specified, prioritizing groups left furthest behind. The state and its sub-regions were identified through municipal HDI mapping and MAPS mission and are among the poorest states in the country. Project focus groups are rural communities affected by the desertification processes.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

5. Have knowledge, good practices, and past lessons learned of UNDP and others informed the project design?

- *3: Knowledge and lessons learned backed by credible evidence from sources such as evaluation, corporate policies/strategies, and/or monitoring have been explicitly used, with appropriate referencing, to justify the approach used by the project.*
- 2: The project design mentions knowledge and lessons learned backed by evidence/sources but have not been used to justify the approach selected.
- 1: There is little, or no mention of knowledge and lessons learned informing the project design. Any references made are anecdotal and not backed by evidence.

Evidence:

Yes, project is directly linked to the sustainable agriculture and desertification experience in Sergipe as well as bra/16/024 and 19/003 projects implemented in the state.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

6. Does UNDP have a clear advantage to engage in the role envisioned by the project vis-à-vis national / regional / global partners and other actors?

- *3: An analysis has been conducted on the role of other partners in the area where the project intends to work, and credible evidence supports the proposed engagement of UNDP and partners through the project, including identification of potential funding partners. It is clear how results achieved by partners will complement the project's intended results and a communication strategy is in place to communicate results and raise visibility vis-à-vis key partners. Options for south-south and triangular cooperation have been considered, as appropriate. (all must be true)*
- 2: Some analysis has been conducted on the role of other partners in the area where the project intends to work, and relatively limited evidence supports the proposed engagement of and division of labour between UNDP and partners through the project, with unclear funding and communications strategies or plans.
- 1: No clear analysis has been conducted on the role of other partners in the area that the project intends to work. There is risk that the project overlaps and/or does not coordinate with partners' interventions in this area. Options for south-south and triangular cooperation have not been considered, despite its potential relevance.

Evidence:

Yes, An analysis has been conducted on the role of other partners in the area where the project intends t o work, and credible evidence supports the propose d engagement of UNDP and partners through the pr oject, including identification of potential funding part ners. It is clear how results achieved by partners will complement the project's intended results and a co mmunication strategy is in place to communicate res ults and raise visibility vis-à-vis key partners. Consid ering the location and the nature of the project SSC l inks are not relevant at this point.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

Principled **Quality Rating: Highly Satisfactory**

7. Does the project apply a human rights-based approach?

- 3: The project is guided by human rights and incorporates the principles of accountability, meaningful participation, and non-discrimination in the project's strategy. The project upholds the relevant international and national laws and standards. Any potential adverse impacts on enjoyment of human rights were rigorously identified and assessed as relevant, with appropriate mitigation and management measures incorporated into project design and budget. (all must be true)
- *2: The project is guided by human rights by prioritizing accountability, meaningful participation and non-discrimination. Potential adverse impacts on enjoyment of human rights were identified and assessed as relevant, and appropriate mitigation and management measures incorporated into the project design and budget. (both must be true)*
- 1: No evidence that the project is guided by human rights. Limited or no evidence that potential adverse impacts on enjoyment of human rights were considered.

Evidence:

The project is guided by human rights by prioritizing accountability, meaningful participation and non-disc rimination. No potential adverse impacts on enjoyme nt of human rights were identified as relevant.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

8. Does the project use gender analysis in the project design?

- 3: A participatory gender analysis has been conducted and results from this gender analysis inform the development challenge, strategy and expected results sections of the project document. Outputs and indicators of the results framework include explicit references to gender equality, and specific indicators measure and monitor results to ensure women are fully benefitting from the project. (all must be true)
- *2: A basic gender analysis has been carried out and results from this analysis are scattered (i.e., fragmented and not consistent) across the development challenge and strategy sections of the project document. The results framework may include some gender sensitive outputs and/or activities but gender inequalities are not consistently integrated across each output. (all must be true)*
- 1: The project design may or may not mention information and/or data on the differential impact of the project's development situation on gender relations, women and men, but the gender inequalities have not been clearly identified and reflected in the project document.

Evidence:

While in-depth and mainstreamed gender analysis has not been conducted, the project does include clear prioritization of women among the beneficiaries and includes specific actions directed at empowering rural women.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

9. Did the project support the resilience and sustainability of societies and/or ecosystems?

- (●) *3: Credible evidence that the project addresses sustainability and resilience dimensions of development challenges, which are integrated in the project strategy and design. The project reflects the interconnections between the social, economic and environmental dimensions of sustainable development. Relevant shocks, hazards and adverse social and environmental impacts have been identified and rigorously assessed with appropriate management and mitigation measures incorporated into project design and budget. (all must be true)*
- ( ) 2: The project design integrates sustainability and resilience dimensions of development challenges. Relevant shocks, hazards and adverse social and environmental impacts have been identified and assessed, and relevant management and mitigation measures incorporated into project design and budget. (both must be true)
- ( ) 1: Sustainability and resilience dimensions and impacts were not adequately considered.

Evidence:

Yes, project addresses desertification and water shortages due to periodic drought that affects the region annually.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

10. Has the Social and Environmental Screening Procedure (SESP) been conducted to identify potential social and environmental impacts and risks? The SESP is not required for projects in which UNDP is Administrative Agent only and/or projects comprised solely of reports, coordination of events, trainings, workshops, meetings, conferences and/or communication materials and information dissemination. [if yes, upload the completed checklist. If SESP is not required, provide the reason for the exemption in the evidence section.]

- (●) *Yes*
- ( ) No
- ( ) SESP not required because project consists solely of (Select all exemption criteria that apply)
  - [ ] 1: Preparation and dissemination of reports, documents and communication materials
  - [ ] 2: Organization of an event, workshop, training
  - [ ] 3: Strengthening capacities of partners to participate in international negotiations and conferences
  - [ ] 4: Partnership coordination (including UN coordination) and management of networks
  - [ ] 5: Global/regional projects with no country-level activities(e.g.activities such as knowledge management, inter-governmental processes)
  - [ ] 6: UNDP serves as Administrative Agent
  - [ ] 7: Development Effectiveness projects and Institutional Effectiveness projects

Evidence:

SESP attached

List of Uploaded Documents

#	File Name	Risk Category	Risk Requirements	Document Status	Modified By	Modified On

1	BRA2 2007 Dese nvSul doPia uiSoci aland Envir onme ntalS creeni ngTe mplat e_12 869_1 10 (ht tps://i ntran et.un dp.or g/app s/Proj ectQ A/QA Form Docu ment s/BR A220 07De senv Suldo Piaui Social andE nviron ment alScr eenin gTem plate_ 1286 9_11 0.doc x)	Low	Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management	Draft	ieva.lazareviciute@undp.org	5/12/2022 7:42:00 PM

Management & Monitoring **Quality Rating: Exemplary**

11. Does the project have a strong results framework?

- *3: The project's selection of outputs and activities are at an appropriate level. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure the key expected development changes, each with credible data sources and populated baselines and targets, including gender sensitive, target group focused, sex-disaggregated indicators where appropriate. (all must be true)*
- 2: The project's selection of outputs and activities are at an appropriate level. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators, but baselines, targets and data sources may not yet be fully specified. Some use of target group focused, sex-disaggregated indicators, as appropriate. (all must be true)
- 1: The project's selection of outputs and activities are not at an appropriate level; outputs are not accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure the expected change and have not been populated with baselines and targets; data sources are not specified, and/or no gender sensitive, sex-disaggregation of indicators. (if any is true)

Evidence:

Yes, the project's selection of outputs and activities are at an appropriate level. Outputs are accompanie d by SMART, results-oriented indicators that measur e the key expected development changes, each with credible data sources and populated baselines and t argets, including gender sensitive, target group focu sed, sex-disaggregated indicators where appropriat e.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

12. Is the project's governance mechanism clearly defined in the project document, including composition of the project board?

- *3: The project's governance mechanism is fully defined. Individuals have been specified for each position in the governance mechanism (especially all members of the project board.) Project Board members have agreed on their roles and responsibilities as specified in the terms of reference. The ToR of the project board has been attached to the project document. (all must be true)*
- 2: The project's governance mechanism is defined; specific institutions are noted as holding key governance roles, but individuals may not have been specified yet. The project document lists the most important responsibilities of the project board, project director/manager and quality assurance roles. (all must be true)
- 1: The project's governance mechanism is loosely defined in the project document, only mentioning key roles that will need to be filled at a later date. No information on the responsibilities of key positions in the governance mechanism is provided.

Evidence:

The project's governance mechanism is fully defined. Individuals have been specified for each position in the governance mechanism (especially all members of the project board.) Project Board members have agreed on their roles and responsibilities as specified in the terms of reference. The ToR of the project board has been included in the project document attached.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

13. Have the project risks been identified with clear plans stated to manage and mitigate each risk?

- *3: Project risks related to the achievement of results are fully described in the project risk log, based on comprehensive analysis drawing on the programme's theory of change, Social and Environmental Standards and screening, situation analysis, capacity assessments and other analysis such as funding potential and reputational risk. Risks have been identified through a consultative process with key internal and external stakeholders, including consultation with the UNDP Security Office as required. Clear and complete plan in place to manage and mitigate each risk, including security risks, reflected in project budgeting and monitoring plans. (both must be true)*
- 2: Project risks related to the achievement of results are identified in the initial project risk log based on a minimum level of analysis and consultation, with mitigation measures identified for each risk.
- 1: Some risks may be identified in the initial project risk log, but no evidence of consultation or analysis and no clear risk mitigation measures identified. This option is also selected if risks are not clearly identified, no initial risk log is included with the project document and/or no security risk management process has taken place for the project.

Evidence:

Yes, project includes both risk log and specific mitigation strategy

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

Efficient **Quality Rating: Exemplary**

14. Have specific measures for ensuring cost-efficient use of resources been explicitly mentioned as part of the project design? This can include, for example:
i) Using the theory of change analysis to explore different options of achieving the maximum results with the resources available.
ii) Using a portfolio management approach to improve cost effectiveness through synergies with other interventions.
iii) Through joint operations (e.g., monitoring or procurement) with other partners.
iv) Sharing resources or coordinating delivery with other projects.
v) Using innovative approaches and technologies to reduce the cost of service delivery or other types of interventions.

- (●) *Yes*
- ( ) No

Evidence:

Yes, competitive processes will be used to expand p roject reach in addition to the specific beneficiary gro up defined in the prodoc.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

15. Is the budget justified and supported with valid estimates?

- *3: The project's budget is at the activity level with funding sources, and is specified for the duration of the project period in a multi-year budget. Realistic resource mobilisation plans are in place to fill unfunded components. Costs are supported with valid estimates using benchmarks from similar projects or activities. Cost implications from inflation and foreign exchange exposure have been estimated and incorporated in the budget. Adequate costs for monitoring, evaluation, communications and security have been incorporated.*
- 2: The project's budget is at the activity level with funding sources, when possible, and is specified for the duration of the project in a multi-year budget, but no funding plan is in place. Costs are supported with valid estimates based on prevailing rates.
- 1: The project's budget is not specified at the activity level, and/or may not be captured in a multi-year budget.

Evidence:

Estimates were based on the previous experiencies in the state and the region and funding for 100% of t he workplan has been secured. In kind contributions will be sought as part of the local ownership strateg y.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

16. Is the Country Office / Regional Hub / Global Project fully recovering the costs involved with project implementation?

- *3: The budget fully covers all project costs that are attributable to the project, including programme management and development effectiveness services related to strategic country programme planning, quality assurance, pipeline development, policy advocacy services, finance, procurement, human resources, administration, issuance of contracts, security, travel, assets, general services, information and communications based on full costing in accordance with prevailing UNDP policies (i.e., UPL, LPL.)*
- 2: The budget covers significant project costs that are attributable to the project based on prevailing UNDP policies (i.e., UPL, LPL) as relevant.
- 1: The budget does not adequately cover project costs that are attributable to the project, and UNDP is cross-subsidizing the project.

Evidence:

Yes, the budget fully covers all project costs that are attributable to the project, including programme management and development effectiveness services related to strategic country programme planning, quality assurance, pipeline development, policy advocacy services, finance, procurement, human resources, administration, issuance of contracts, security, travel, assets, general services, information and communications based on full costing in accordance with prevailing UNDP policies

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

Effective **Quality Rating: Highly Satisfactory**

17. Have targeted groups been engaged in the design of the project?

- ○ 3: Credible evidence that all targeted groups, prioritising discriminated and marginalized populations that will be involved in or affected by the project, have been actively engaged in the design of the project. The project has an explicit strategy to identify, engage and ensure the meaningful participation of target groups as stakeholders throughout the project, including through monitoring and decision-making (e.g., representation on the project board, inclusion in samples for evaluations, etc.)
- ◉ *2: Some evidence that key targeted groups have been consulted in the design of the project.*
- ○ 1: No evidence of engagement with targeted groups during project design.
- ○ Not Applicable

Evidence:

Previous diagnostic studies were used to design the project. Project initiation stage includes aditional mapping exercise in order to both validate previous findings and add further gender and LNOB analysis.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

18. Does the project plan for adaptation and course correction if regular monitoring activities, evaluation, and lesson learned demonstrate there are better approaches to achieve the intended results and/or circumstances change during implementation?

- (●) *Yes*
- ( ) No

Evidence:

Yes, quarterly reviews are foreseen in order to ensure course adjustments as needed.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

19. The gender marker for all project outputs are scored at GEN2 or GEN3, indicating that gender has been fully mainstreamed into all project outputs at a minimum.

- (●) *Yes*
- ( ) No

Evidence:

The gender marker for all project outputs are scored at GEN2

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

Sustainability & National Ownership **Quality Rating: Exemplary**

20. Have national / regional / global partners led, or proactively engaged in, the design of the project?

- *3: National partners (or regional/global partners for regional and global projects) have full ownership of the project and led the process of the development of the project jointly with UNDP.*
- 2: The project has been developed by UNDP in close consultation with national / regional / global partners.
- 1: The project has been developed by UNDP with limited or no engagement with national partners.

Evidence:

Yes, SEMAR/PI was engaged in the definition of the project from the beginning. SEPLAN/PI was consult ed and Governor has emitted opinion on priorities

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

21. Are key institutions and systems identified, and is there a strategy for strengthening specific / comprehensive capacities based on capacity assessments conducted?

- *3: The project has a strategy for strengthening specific capacities of national institutions and/or actors based on a completed capacity assessment. This strategy includes an approach to regularly monitor national capacities using clear indicators and rigorous methods of data collection, and adjust the strategy to strengthen national capacities accordingly.*
- 2: A capacity assessment has been completed. There are plans to develop a strategy to strengthen specific capacities of national institutions and/or actors based on the results of the capacity assessment.
- 1: Capacity assessments have not been carried out.
- Not Applicable

Evidence:

Yes capacity measures are foreseen for SEMAR/PI and local governments in the region.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

22. Is there is a clear strategy embedded in the project specifying how the project will use national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluations, etc.,) to the extent possible?

- ○ Yes
- ○ No
- ◉ *Not Applicable*

Evidence:

This is DIM project therefore UNDP systems will be used. However state partners will be engaged in des igining strategies and evaluating products delivered.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

23. Is there a clear transition arrangement / phase-out plan developed with key stakeholders in order to sustain or scale up results (including resource mobilisation and communications strategy)?

- ◉ *Yes*
- ○ No

Evidence:

Yes, and such plan will be adapted as needed durin g the implementation of the project

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

QA Summary/LPAC Comments

DocuSign Envelope ID: B6109E3D-374A-40A0-AB02-E2372BB79B5A

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Análise Social e Ambiental (2021)

Informação do Projeto

Informação do Projeto	
1. Título do Projeto	Desenvolvimento Sustentável de Áreas de Desertificação no Sul do Piauí
2. Número do Projeto (ID ATLAS, PIMS)	BRA/22/007
3. Localização (Global/Região/País)	Brasil
4. Estágio do Projeto (Desenho ou Implementacão)	Implementação
5. Data	12/05/2022

Parte A. Integração de Princípios Gerais para o Fortalecimento da Sustentabilidade Socioambiental

Questão 1: Como o Projeto integra os princípios gerais a fim de fortalecer a sustentabilidade socioambiental?
Descreva resumidamente abaixo como o Projeto incorpora a abordagem baseada em direitos humanos
O desenho do projeto é baseado em três pilares: fornecimento de água de qualidade para os beneficiários, implantação de tecnologias sociais e capacidade para produção de alimentos com tecnologias de proteção ambiental, para melhorar os índices de desenvolvimento humano na região
Descreva resumidamente abaixo como o Projeto poderá melhorar a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres
As iniciativas de instalação de tecnologias sociais e destinadas à produção de alimentos, devem proativamente e deliberadamente permitir a participação ativa, livre e significativa das mulheres em todas as fases de planejamento, tomada de decisão, monitoramento e avaliação. Como princípio, a participação das mulheres será plenamente integrada, isso inclui iniciativas comunitárias. Ao garantir a participação das mulheres em todas as etapas de sua implementação, visando à promoção da igualdade de gênero, o projeto também tem a oportunidade de catalisar seus resultados. Além da importância da produção de alimentos para consumo próprio, o acesso adequado aos recursos pela mulher também tem o propósito de elevar a renda familiar.
Descreva resumidamente abaixo como o Projeto incorpora a sustentabilidade e resiliência
Todo o desenho do projeto foi baseado na produção de alimentos em região afetada por desertificação. Neste contexto, contempla não apenas soluções para mitigar os problemas ambientais no município – incluindo um programa educativo para o ensino público - mas também endereça um conjunto de ações destinadas a combater a desertificação e a implementação de técnicas e práticas que impulsionem a produção de alimentos a partir de uma gestão do manejo sustentável do solo e apoie as cadeias produtivas regionais com a aplicação de tecnologias que contribuam para ampliar o acesso do público beneficiário à água, saneamento básico, segurança alimentar e conservação do solo e biodiversidade locais.

DocuSign Envelope ID: B6109E3D-374A-40A0-AB02-E2372BB79B5A

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Descreva resumidamente abaixo como o projeto fortalece o controle social (accountability) das pessoas envolvidas no projeto
O projeto foi elaborado com base em diagnostico e planejamento participativo elaborados no contexto do processo de territorialização dos ODS no estado. Todas as atividades desenvolvidas serão avaliadas por seus participantes imediatamente após a sua conclusão e seus insumos serão utilizados para formatar os próximos passos. Finalmente processos de municipalização dos ODS nos municípios beneficiados serão implementados como parte de fortalecimento de capacidades dos governos locais que por sua natureza são processos/mecanismos de participação e gestão integrada.

Parte B. Identificação e Gerenciamento de Riscos Socioambientais

Questão 2: Quais são os potenciais Riscos Socioambientais? Nota: Descreva brevemente os potenciais riscos socioambientais identificados no Anexo 1 – Checklist de Triagem de Riscos (com base em qualquer resposta "Sim"). Se nenhum risco tiver sido identificado no Anexo 1 então escreva "Nenhum risco identificado" e passe para a Pergunta 4 e selecione "Risco baixo". As questões 5 e 6 não são requeridas para Projetos de riscos baixos.	**Questão 3: Qual o nível de importância dos potenciais riscos socioambientais?** Nota: Responda as questões 4 e 5 abaixo, antes de proceder para a questão 6.			**Questão 6: Quais medidas de avaliação e gerenciamento socioambientais foram conduzidas e/ou são requeridas para endereçar potenciais riscos (para riscos com significância moderada e alta)?**
Descrição do Risco	**Impacto e Probabilidade (1-5)**	**Significância (Baixo, Moderado, Substancial, Alto)**	**Comentários**	**Descrição da análise e medidas de prevenção e monitoramento de riscos Moderado, Substancial ou Alto**
Risco 1: Baixa participação dos atores regionais, inclusive dos sociedade civil e famílias beneficiárias, na absorção e utilização das tecnologias sociais e manejos inovadores de produção com proteção ambiental introduzidos pelo projeto.	I = 2 P = 1	Baixo	A implantação de núcleos de produção de alimentos em áreas de desertificação será precedida de sessões de esclarecimentos e capacitações dos beneficiários para garantir a aderência e devida proteção ambiental do contexto local	Todas as ações que envolvam a participação e o protagonismo do público transferência de capacidade serão precedidas de
	Questão 4: Qual é a categorização geral do risco do projeto?			
	Selecione um (veja SESP para orientação)			Comentários
	Risco Baixo	X		O Projeto não inclui atividades de risco de impactos socioambientais adversos. Ao contrário,

DocuSign Envelope ID: B6109E3D-374A-40A0-AB02-E2372BB79B5A

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

				o Projeto visa a melhoria das condições ambientais.	
	Risco Moderado	☐			
	Risco Substancial	☐			
	Risco Alto	☐			
	Questão 5: Baseado nos riscos identificados e na categorização de riscos, quais requisitos do SES são relevantes?				
	Esta pergunta deve ser respondida apenas se na questão 4 o projeto for classificado em risco **Moderado, Substancial ou Alto**				
	Outras análises são necessárias ? (assinalar se "sim")	☐			***Status? (completed, planned)***
		M	☐	Targeted assessment(s)	
		S	☐	ESIA (Environmental and Social Impact Assessment)	
		A	☐	SESA (Strategic Environmental and Social Assessment)	
	São requeridos planos de gestão? (assinalar se "sim")	☐			
			☐	Targeted management plans (e.g. Gender Action Plan, Emergency Response Plan, Waste Management Plan, others)	
			☐	ESMP (Environmental and Social Management Plan which may include range of targeted plans)	
			☐	ESMF (Environmental and Social Management Framework)	
	Com base nos riscos identificados, quais princípios e temas são acionados?				
	Princípio Geral: Não deixar ninguém para trás				
	Direitos Humanos	☐			
	Igualdade de Gênero e Autonomia das Mulheres	☐			
	Accountability*: Transparência, Controle Social*	☐			
	1. Conservação da Biodiversidade e Gestão de Recursos Naturais	**X**		Considerando que o projeto prevê o apoio a produção de alimentos em áreas de	

DocuSign Envelope ID: B6109E3D-374A-40A0-AB02-E2372BB79B5A

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

			desertificação, o risco a ser considerado seria a não aderência do público às tecnologias de produção sustentáveis, com a utilização de manejo de proteção ambiental. Este risco será mitigado com o engajamento e capacitação de todos os atores do território e com a realização de programas educativos.
	2. Mudanças Climáticas e Riscos de Desastres	☐	
	3. Saúde Pública, Proteção e Segurança	☐	
	4. Patrimônio Cultural	☐	
	5. Deslocamento e Reassentamento	☐	
	6. Populações indígenas	☐	
	7. Trabalho e Condições Laborais	☐	
	8. Prevenção de Poluição e Eficiência de Recursos	☐	

Aprovação Final

(A análise não é finalizada até a inclusão das assinaturas)

Assinatura	Data	Descrição
Avaliador de QA	12-May-2022	Ieva Lazareviciute – PO DocuSigned by: Ieva Lazareviciute F588156E676A41D...
Avaliador de QA	12-May-2022	Juliana Wenceslau – Strategic Planning Analyst DocuSigned by: Juliana Wenceslau Biriba dos Santos 0C219E7175F24B5...
Presidência PAC	12-May-2022	Maristela Baioni – ARR DocuSigned by: Maristela Baioni 5C8A125FDD4F429...

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Anexo SESP 1. Lista de Triagem de Risco Sociais e Ambientais

Lista de Potenciais Riscos Sociais e Ambientais	
INSTRUCTIONS: Esta checklist de risco auxiliará no preenchimento das perguntas 2-6 do Screening Template. As respostas ao checklist ajudarão a (1) identificar riscos potenciais, (2) determinar a categorização do risco geral do projeto, e (3) determinar o nível de análises e medidas de gerenciamento. Acesse o SES toolkit para mais informações sobre o questionário.	
Princípio Geral: Não deixa ninguém para trás **Direitos Humanos**	**Resposta (sim/não)**
P.1 As comunidades locais ou indivíduo levantaram questões de direitos humanos em relação ao Projeto (e.g.durante o processo de engajamento das partes interessadas, queixas em audiências e reuniões ou reclamações públicas)?	**não**
P.2 Existe algum risco de que o governo não tenha capacidade de cumprir com seus compromissos e obrigações no projeto?	**não**
P.3 Existe algum risco que as pessoas afetadas pelo projeto não tenham capacidade de reivindicar seus direitos?	**não**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	**não**
P4. Impactos adversos no exercício de direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais) da população afetada e particularmente de grupos marginalizados?	**não**
P5. Existe alguma probabilidade de que o Projeto possua impactos adversos desiguais ou discriminatórios nas populações afetadas, particularmente a baixa renda, ou marginalizados, ou indivíduos ou grupos excluídos, incluindo pessoas com deficiência?[1]	**não**
P6. O Projeto poderia potencialmente restringir a disponibilidade, a qualidade e acesso a recursos de serviços básicos, em particular de indivíduos ou grupos marginalizados?	**não**
P7. Exacerbar conflitos e/ou o risco de violência entre as comunidades afetadas pelo projeto e os indivíduos?	**não**
Igualdade de Gênero e Autonomia das Mulheres	**Resposta (sim/não)**
P.8 Grupos e lideranças de mulheres levantaram questões de gênero e preocupações com respeito ao projeto (e.g. durante o processo de engajamento das partes interessadas, queixas em audiências e reuniões ou reclamações públicas)?	**não**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	**não**
P9. Impactos adversos na igualdade de gênero e/ou na situação das mulheres e meninas?	**não**
P.10 Reprodução de discriminações contra as mulheres com base em gênero, especialmente no que tange à sua participação no desenho e implementação ou acesso a oportunidades e benefícios?	**não**
P.11 Limitações na habilidade de mulheres usarem, desenvolverem e protegerem recursos naturais, levando em consideração diferentes papeis e posições das mulheres e homens no acesso a bens e serviços ambientais? *Por exemplo, atividades que possam levar a degradação ou esgotamento dos recursos naturais em comunidades que dependem destes recursos como meios de subsistência e bem-estar.*	**não**
P.12 aumento do risco de violência contra as mulheres? *Por exemplo, pelo aumento do fluxo de trabalhadores em comunidades, mudanças nas dinâmicas de poder das comunidades e famílias, aumento da exposição a lugares e/ou transporte inseguros.*	**não**
Sustentabilidade e Resiliência: Perguntas de triagem a respeito dos riscos de sustentabilidade e resiliência são abrangidas pelas questões específicas relacionadas aos padrões abaixo.	
Accountability	**Resposta (sim/não)**

[1] Razões de discriminação proibidas incluem raça, sexo, idade, língua, deficiência, orientação sexual, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social ou geográfica, propriedade, nascimento ou outro status incluindo pessoas indígenas ou membros de minorias. Referência a "mulheres e homens" ou similares pode ser entendida como a inclusão de mulheres e homens, meninos e meninas, e outros grupos discriminados com base nas identidades de gênero, como transgênero e transexuais.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	**não**
P.13 exclusão de populações potencialmente envolvidas, em particular grupos marginalizados e pessoas excluídas (em especial pessoas com deficiência), de participar plenamente de decisões que afetem suas vidas?	**não**
P.14 queixas ou objeções de pessoas potencialmente envolvidas e afetadas pelo projeto?	**não**
P.15 riscos de retaliação ou represálias contra envolvidos que expressem preocupações ou queixas, queiram participar ou obter informações sobre o projeto?	**não**
Project-Level Standards	
Padrão 1: Conservação da Biodiversidade e Gestão de Recursos Naturais Sustentáveis	**Resposta (sim/não)**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	
1.1 impactos potenciais adversos nos habitats (por exemplo, habitats modificados, naturais e críticos) e/ou ecossistemas e serviços ambientais? *Por Exemplo, através da perda do habitat, conversão ou degradação, fragmentação, mudanças hidrológicas*	**não**
1.2 atividades próximas e/ou em habitats críticos e/ou áreas ambientais sensíveis, incluindo áreas legalmente protegidas (por exemplo, reservas naturais, parques nacionais), áreas propostas para proteção ou reconhecidas pelas fontes de autoridade e/ou população indígenas ou comunidades locais?	**SIM**
1.3 mudanças no uso da terra e de recursos que podem ter impactos adversos em habitats, ecossistemas e/ou nos meios de subsistência? (Nota: Se restrições e/ou limitações ao acesso às terras se aplicam, favor referir-se ao Padrão 5)	**não**
1.4 riscos a espécies ameaçadas de extinção?	**não**
1.5 aumento do comercio ilegal de animais e plantas silvestres?	**não**
1.6 introdução de espécies exóticas invasoras?	**não**
1.7 impactos adversos no solo?	**não**
1.8 extração de florestas naturais, desenvolvimento de plantações ou reflorestamento?	**não**
1.9 produção agrícola significativa?	**não**
1.10 produção de animais, peixes ou outra espécie aquática?	**não**
1,11 extração, desvio ou contenção de água no solo? Por exemplo, construção de barragens, reservatórios, poços, nascentes, etc.	**não**
1.12 utilização ou manejo de organismos geneticamente modificados [2]	**não**
1.13 utilização de recursos genéticos? Por exemplo, coleta e/ou colheita, desenvolvimento comercial [3]	**não**
1.14 efeitos socioambientais adversos transfronteiriços ou preocupações ambientais globais ?	**não**
Padrão 2: Mudança do Clima e Riscos de Desastres	**Resposta (sim/não)**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	**não**
2.1 áreas sujeitas a terremotos, enchentes, deslizamento de terra, furacões, ventanias, tempestades, tsunami ou erupções vulcânicas?	**não**
2.2 atividades e resultados do Projeto seriam sensíveis ou vulneráveis a potenciais impactos da mudança do clima ou desastres? *Por exemplo, por meio do aumento de chuvas,da temperatura, de enchentes, da salinidade, de eventos extremos e de terremotos.*	**não**
2.3 aumento da vulnerabilidade aos impactos da mudança do clima hoje ou no futuro (também conhecida como práticas de mal adaptação)? *Por exemplo, mudanças no planejamento do uso da terra podem criar áreas de alagamento e várzeas, aumentando a vulnerabilidade de populações à mudança do clima, em especial a enchentes.*	**não**
2.4 aumento da emissão de gases, combustão incompleta de combustíveis fósseis, madeira ou de biomassa e outros causadores de mudança climática.	**não**

[2] Ver Convention on Biological Diversity e o Cartagena Protocol on Biosafety.

[3] Ver Convention on Biological Diversity e o Nagoya Protocol on access and benefit sharing from use of genetic resources.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Padrão 3: Saúde Comunitária, Proteção e Segurança	**Resposta (sim/não)**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	
3.1 construção civil e infraestrutura (ex. estradas, barragens, imóveis)? (Nota: o GEF não financia projetos que envolvam a construção e reabilitação de grandes barragens)	**não**
3.2 poluição do ar, barulho, vibração, tráfego, lesão, riscos à integridade física das pessoas, qualidade da água, erosão, saneamento?	**não**
3.3 danos e prejuízos devido a problemas de elementos estruturais do Projeto (ex. colapso de edifícios e infraestrutura)?	**não**
3.4 risco de doenças transmitidas pela água ou outros vetores, doenças transmissíveis e não transmissíveis, desnutrição, saúde mental	**não**
3.5 transporte, armazenagem e uso ou disposição de materiais perigosos ou tóxicos (e.g. explosivos, combustíveis e outros químicos durante a construção e operação)?	**não**
3.6 impactos adversos em ecossistemas e servicos ambientais relevante para a saúde das comunidades (ex. alimentação, purificação da água, amortecedores naturais de inundações)?	**não**
3.7 influxo de trabalhadores do projeto em áreas de intervenção?	**não**
3.8engajamento de pessoal de segurança para proteção das instalações e propriedades ou apoio às atividades do projeto?	**não**
Padrão 4: Patrimônio Cultural	**Resposta (sim/não)**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	
4.1 atividades adjacentes ou dentro de patrimônio cultural?	**não**
4.2 excavações, demolições, movimentações de terra, inundações e outras mudanças ambientais?	**não**
4.3 Projeto irá resultar em intervenções que irão potencialmente impactar negativamente locais, estruturas, ou objetos com valores históricos, culturais, tradicionais ou religiosos ou formas de cultura intangíveis (ex. conhecimento, inovações, práticas)? (Nota: Projetos destinados a proteger e conservar o patrimônio cultural também podem ter impactos negativos inadvertidos.)	**não**
4.4 alteração de paisagens e características naturais de locais com significado cultural?	**não**
4.5 utilização de formas tangíveis e intangíveis (ex. praticas, conhecimento tradicional) de patrimônio cultural para propósitos comerciais ou outros propósitos?	**não**
Padrão 5: Deslocamento e Reassentamento	**Resposta (sim/não)**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	
5.1 deslocamento físico temporário, permanente, total ou parcia (incluindo de pessoas sem direitos legais e reconhecidos à terra)?	**não**
5.2 deslocamento econômico (ex. perda de bens ou acesso a recursos devido a aquisição de terras ou restrições de acesso – mesmo na ausência de relocação física)?	**não**
5.3 riscos de desocupação forçada?[4]	**não**
5.4 impacto ou mudança na posse de terra e/ou direitos de propriedade de base comunitária/ direitos consuetudinários a terra, territórios e/ou recursos?	**não**
Padrão 6: Povos Indígenas	**Resposta (sim/não)**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	
6.1 há aldeias e povos indígenas na área do Projeto (incluindo na área de influência do projeto)?	**não**
6.2 atividades estarão localizadas em terras e territórios reivindicados por povos indígenas?	**não**
6.3 impactos (positivos ou negativos) nos direitos humanos, terras, recursos naturais, territórios e meios de subsistência tradicionais dos povos indígenas (independentemente se os povos indígenas possuem títulos legais para tais áreas, se o Projeto está localizado dentro ou fora das terras e territórios habitados pelos povos	**não**

[4] Desocupações forçadas incluem atos e/ou omissões envolvendo deslocamento coercitivo ou involuntário de indivíduos, grupos ou comunidades de casas e/ou terras e propriedades comuns, eliminando a habilidade de um indivíduo, grupo, ou comunidade de residir, ou trabalhar em uma habitação, residência, ou locar particular sem a condição e acesso de formas apropriadas de proteções legais ou outras. Desocupações forçadas constituem graves violações de uma ampla gama de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

afetados, ou se os povos indígenas são reconhecidos como povos indígenas pelo país em questão)? *Se a resposta para questão de triagem 6.3 for "sim" os impactos potenciais de risco são considerados potencialmente severos e/ou críticos e o Projeto deverá ser categorizado como risco substancial ou alto.*	
6.4 ausência de consultas culturais apropriadas realizadas com o objetivo de alcançar o FPIC em assuntos que possam afetar os interesses e direitos, terras, recursos, territórios e os meios de subsistência tradicionais dos povos indígenas envolvidos?	**não**
6.5 utilização e/ou o desenvolvimento comercial de recursos naturais nas terras e territórios reivindicados pelos povos indígenas?	**não**
6.6 potenciais desocupação forçada, deslocamento físico ou econômico, total ou parcial, de povos indígenas incluindo por meio de restrições de acesso a terras, territórios e recursos? *Considerar a consistência das respostas com o padrão 5.*	**não**
6.7 impactos adversos no desenvolvimento de povos indígenas conforme definido por eles?	**não**
6.8 riscos à sobrevivência física e cultural dos povos indígenas?	**não**
6.9 impactos no Patrimônio Cultural dos povos indígenas, incluindo através de práticas de comercialização ou uso de seus conhecimentos e práticas tradicionais? Considera *a consistência das respostas com o padrão 4.*	**não**
Padrão 7: Trabalho e Condições Laborais	**Resposta (sim/não)**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	
7.1 condições de trabalho não condizentes com as leis trabalhistas nacionais e compromissos internacionais?	**não**
7.2 condições de trabalho que não permitem a liberdade de associação e negociação coletiva?	**não**
7.3 uso de trabalho infantil?	**não**
7.4 use de trabalho forçado?	**não**
7.5 condições de trabalho discriminatórias e/ou falta de oportunidades igualitárias?	**não**
7.6 ameaças à saúde e à segurança pessoal devido a riscos físicos, químicos, biológicos (incluindo violência e assédio) no decorrer da vigência do projeto?	**não**
Padrão 8: Prevenção de Poluição e Eficiência de Recursos	**Resposta (sim/não)**
O projeto envolveria potencialmente ou levaria a	
8.1 a emissão de poluentes para o meio ambiente devido a circunstâncias rotineiras ou não-rotineiras com o potencial de impacto negativo local, regional ou transfronteiriço?	**não**
8.2 geração de resíduos (nocivos e não nocivos)?	**não**
8.3 manufatura, comércio, emissão, e/ou uso de químicos e/ou materiais perigosos? O	**não**
8.4 uso de químicos ou materiais sujeitos a proibições internacionais ou eliminações progressivas? *Por exemplo, DDT, PCBs e outros químicos listados nas convenções internacionais como Montreal Protocol, Minamata Convention, Basel Convention, Rotterdam Convention, Stockholm Convention*	**não**
8.5 aplicação de pesticidas que possam gerar efeito negativo ao meio ambiente ou à saúde humana?	**não**
8.6 atividades que requerem o consumo significativo de matérias-primas, energia e/ou água?	**não**

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Anexo 3. Matriz de Risco

Título do Projeto:		Award ID:		Data:					
#	**Descrição**	**Data identificada**	**Tipo**	**Impacto & Probabilidade**	**Medidas de Mitigação e Resposta**	**Supervisão**	**Incluído por**	**Atualização**	**Status**
1	Atraso no cronograma de desembolsos, impactando o ritmo planejado para implementação do projeto	Elaboração do projeto	Financeiro	Probabilidade na escala de 1 (baixo) a 5 (alto) P = 2 Impacto na escala de 1 (baixo) a 5 (alto) I = 4	Planejar reserva de recursos para efetuação de aportes financeiros	Gerente de projeto	Gerente de projeto	-	Reavaliar uma vez iniciado o projeto
2	Comunicação deficiente entre gestores do projeto, técnicos, consultores, e outros atores relevantes	Elaboração do projeto	Operacional	Probabilidade na escala de 1 (baixo) a 5 (alto) P = 2 Impacto na escala de 1 (baixo) a 5 (alto) I = 3	Estabelecimento de pontos focais junto aos parceiros e beneficiários, e agendar reuniões com antecedência	Gerente de projeto	Gerente de projeto	-	Reavaliar uma vez iniciado o projeto
3	Turbulências associadas a deterioração de situações econômicas.		Financeiro e Político	Atraso na execução do projeto P = 2 I = 4	O Projeto com financiamento privado está sujeito a instabilidade econômica que poderá afetar a doação inicial de recursos.	Gerente do projeto no PNUD	Gerente do projeto no PNUD		Reavaliar semestralmente
4	Mudança poítica na administração estadual ou municipais, provocando instabilidade e descontinuidade na implementação de ações programadas		Operacional Organizacional Politico Estratégico	Baixa efetividade do projeto P = 3 I = 2	A estratégia de mitigação deste risco consiste de duas frentes de ação. A primeira reside na contínua atenção para a gestão do conhecimento e manutenção da memória do projeto.				

					A segunda frente de ação da estratégia de mitigação refere-se à abordagem metodológica dos processos de capacitação reforçando o engajamento do servidor público nos processos de fortalecimento institucional.				

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

ANEXO 4

Insumos do Projeto

Listagem de consultorias por produto a ser contratada (pessoa física e jurídica)

CONSULTORES PRODUTO

As regras e os procedimentos para contratação de profissionais para a elaboração de produtos, adotadas pelo Projeto, são compatíveis com as Normas Técnicas e Administrativas do PNUD e estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente relativa ao assunto.

A cada contratação deverá ser elaborado Termo de Referência específico, com detalhamento do propósito da contratação, descrição dos produtos esperados e/ou das atividades a serem desenvolvidas, qualificações profissionais exigidas, entre outros quesitos.

O projeto prevê, ao longo do período contemplado, contratações de consultorias de pessoas físicas por Produto, as quais serão destinadas a prestação de serviços conforme quadro ilustrativo a seguir:

Natureza da Consultoria	Produto do projeto	Quantidade de consultores	Período previsto para a duração do contrato	Valor total estimado dos serviços, por consultor (R$)	TOTAL
Assessor técnico do projeto - Coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar a implementação das ações do projeto	1	1	Máximo de 24 meses	$ 69.348,13	$ 69.348,13
Desenvolvimento e implantação de arranjo institucional para fortalecer a capacidade dos atores sociais e promover a melhoria da gestão e monitoramento das ações com a participação colaborativa	1	1	Máximo de 6 meses	$ 17.604,98	$ 17.604,98
Realização de cursos e treinamentos de apicultura/ meliponicultura para capacitar as famílias beneficiárias no manejo produtivo de mel e polinização	2	2	Máximo de 4 meses	$ 5.501,56	$ 11.003,12
Monitoramento e avaliação das atividades relacionadas à carta de acordo 1 (produtos 1.1 e 1.2)	1	1	Máximo de 6 meses	$ 14,839,00	$ 14,839,00
Monitoramento e avaliação das atividades relacionadas à carta de acordo 2	1	1	Máximo de 18 meses	$ 44,778.86	$ 44,778.86
Programa de formação dos agentes públicos e multiplicadores (técnicos estaduais, municipais, extensionistas, agricultores), em práticas de proteção ambiental	2	1	Máximo 1 mês	$ 10,402.22	$ 10,402.22

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

de áreas degradadas e de uso dos ativos ambientais					
Introdução de técnicas para reutilização segura das águas residuárias para fins agrícolas, destacando importância da qualidade biológica dos efluentes para diminuir propagação de patógenos e evitar diferentes doenças	2	1	Máximo 2 meses	$ 8,353.24	$ 8,353.24
Introdução de estratégias de manejos alternativos ao uso do fogo, Agricultura Sustentável, Práticas Conservacionistas, entre outros	2	1	Máximo 2 meses	$ 9,169.26	$ 9,169.26
Seminários de planejamento de São Gonçalo do Gurguéia e municípios do entorno para integração dos ODS nos PPAs e acelerar indicadores de desenvolvimento humano	1	1	Máximo 4 meses	$ 8,802.48	$ 8,802.48
Estudo dos impactos potencializados pela sinergia das ações implementadas no município	3	1	Máximo 3 meses	$ 11.003,12	$ 11.003,12
Subsídios, capacitações e consultorias, visitas às práticas bem-sucedidas, networking com outros estados de acordo com dinâmicas vocacionais produtivas locais	3	1	Máximo 4 meses	$ 7.489,60	$ 7.489,60
Programa de formação para introduzir os princípios da agroecologia, produção orgânica e convivência com o bioma local, incluindo práticas rurais alternativas ao uso do fogo	2	1	Máximo de 2 meses	$ 8.321,78	$ 8.321,78
Fomentar a cultura do associativismo e promover a capacitação das famílias beneficiárias nas práticas de produção coletiva, com a introdução de ferramentas para fortalecimento da gestão, produção e comercialização	2	1	Máximo de 4 meses	$ 6.667,42	$ 6.667,42
Programa de educação ambiental com foco na conservação dos recursos naturais e o controle do meio ambiente, em especial do bioma local, incentivando novos hábitos e práticas sustentáveis;	2	1	Máximo de 8 meses	$ 10.402,22	$ 10.402,22
Elaborar e implementar um plano de comunição do projeto e uma identidade visual	4	1	Máximo de 24 meses	$ 20.804,44	$ 20.804,44

DocuSign Envelope ID: 1AAC4B3F-DCAC-438E-B262-431875F0EB8B

Constituir grupos de aprendizado no território de atuação do projeto para subsidiar a execução e se apropriar do aprendizado de lições apreendidas e boas práticas	4	1	Máximo de 12 meses	$ 16.643,55	$ 16.643,55
Total geral					$ 230.854,65

O Projeto também prevê a contratação de consultorias e serviços de Pessoa Jurídica, conforme previsão a seguir:

Natureza da Consultoria	Produto do projeto	Período previsto para a duração do contrato	Valor estimado dos serviços, por contrato	TOTAL
CARTA ACORDO - UFPI[14] 1.Produção de dados e construção de diagnóstico do público alvo/ contexto socioeconômico do território / mapeamento dos ativos ambientais / potencialidades econômicas e construção de linha de base; 2. Mobilização e cadastro detalhado de demandas das famílias beneficiárias e definição das tecnologias sociais adequadas	1	Máximo de 5 meses	$ 69.348,13	$ 69.348,13
Implantação de núcleos de produção de alimentos nas comunidades beneficiadas pelo projeto c/ técnicas introduzidas pelo projeto[15]	3	Máximo de 12 meses	$ 166.435,51	$ 166.435,51
Prover subsídios e assistência técnica - capacitações e consultorias, para apoio continuado na implantação de núcleos de produção de alimentos com tecnicas de proteção ambiental	3	Máximo de 12 meses	$ 29.958,39	$ 29.958,39
CARTA ACORDO (edital) Construção e instalação de tecnologias sociais e de acesso à agua para famílias impactadas pelas obras da usina[16]	3	Máximo de 18 meses	$ 249.653,26	$ 249.653,26
Construção e instalação de uma UEPA para extração e beneficiamento de mel e polinização[17]	3	Máximo de 4 meses	$ 51.100,00	$ 51.100,00
Total geral				566.495,29

[15] Valores das obras e materiais inclusos

[16] Valores das obras e materiais inclusos

[17] Valores das obras e materiais inclusos
