

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

Projets : « Accès à l'énergie verte pour atténuer les impacts de la Covid 19 »

Résultat(s) de l'UNSDCF/	**PNSD:** Le programme contribue à tous les piliers du PNSD (1, 2, 3, 4 & 5)

Résultat(s) attendu(s) du CP : (Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)	**UNSDCF :** Croissance économique inclusive, développement agricole, gestion durable des ressources naturelles ;
Produit(s) attendu(s) du CP : (Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)	UNDP Strategic Plan (2018-2021) : Faire progresser l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions. **CPD 2020 - 2024 :** Solutions développées pour une gestion durable des ressources naturelles, y compris des produits durables et des chaînes de valeur vertes et inclusives avec accès pour les femmes et les jeunes (Output 2.1) ;

Partenaire de réalisation : Ministère du Développement Rural, ministère de l'Energie.
Autres partenaires **:** Acteurs du secteur privé

Résumé du projet

Le projet « Accès à l'Energie verte pour réduire les impacts de COVID-19 » dans le territoire de Mambasa /Province de l'Ituri s'inscrit dans le plan d'atténuation de l'impact COVID-19 du gouvernement et des Nations Unies et il est axé sur la promotion de l'accès de la population du territoire ciblé à de meilleures infrastructures sanitaires, des conditions d'eau potable, d'hygiène et des opportunités économiques pour diversifier ses activités et accroître ses moyens de subsistance. L'attention est accordée à (1) l'accès des établissements de santé à des sources fiables d'énergie et d'eau, (2) l'amélioration de l'accès à l'eau potable et extension des services d'hygiène à un large segment de la population et en particulier aux femmes et aux filles (3) accès de la population du territoire ciblé à des opportunités économiques pour diversifier ses activités et accroître ses moyens de subsistance. En tant que contribution à l'effort national pour atténuer les impacts secondaires sanitaires et socio-économiques de COVID19, ce projet prévoit (1) l'installation de mini - centrales électriques et de mini-réseaux pour améliorer le service d'énergie électrique, (2) l'électrification et la mise en place de l'approvisionnement en eau dans les centres de santé et autres services essentiels, et (3) la fourniture de l'électricité aux unités de production et assurer le développement de chaînes de valeur qui augmentent la création d'emplois et les revenus.

Période couverte par le Programme : Octobre 2021 - Mars 2021 **Modalité de mise en œuvre : DIM** **Titre de l'intervention : Accès à l'énergie verte pour atténuer les impacts de la Covid 19**	**Budget estimatif sur base de 18 mois : 1 600 000 USD** **Ressources allouées : _____** **Donateur (en USD) : TRAC :600 000 USD et RFF2 : 1 000 000 USD**

Approuvé (Gouvernement RDC) : Georges KOSHI GIMEYA,
Secrétaire Général au ministère de Développement Rural _____

Approuvé (PNUD) : Rokya Ye Dieng
Représentant Résident adjoint/Programme _____

FACILITÉ DE FINANCEMENT RAPIDE (RFF2)

DOMAINE DE FOND DE LA DEMANDE DE RFF2

(Veuillez choisir le domaine le plus pertinent)

Économie verte

DÉTAILS DE LA PROPOSITION (3 PAGES MAXIMUM APPROXIMATIVEMENT)

Pays : *République démocratique du Congo (RDC)*
Demandeur : *Dominic Sam, représentant des résidents*
Titre du projet : *Accès à l'énergie verte pour atténuer les impacts du COVID-19*
Montant demandé : *1.000.000 USD sur un budget total de 3.800.000 USD*
Marqueur de genre : *GEN3*
Date de soumission : *Champ automatique. (Réf. STARS 201031-000133)*
Date de début de la mise en œuvre : *01 décembre 2020*
Date d'achèvement de la mise en œuvre : *31 mai 2022 = 18 mois*

1. Analyse de la situation

Dans l'analyse, veuillez inclure les impacts différenciés par sexe de COVID-19 .

Dans cette partie de la proposition, (1) nous donnons un aperçu des impacts secondaires du COVID-19 en RDC, (2) nous décrivons le contexte fragile caractérisé par la pauvreté et le potentiel électrique sous-utilisé et ses effets sur la population, (3) nous expliquons la logique d'amélioration de l'accès à l'énergie verte dans les structures de santé et pour les MPME dans les zones rurales du territoire ciblé et (4) nous montrons l'alignement de nos domaines d'action avec les priorités nationales de relance du COVID-19.

A. Les impacts secondaires du COVID-19 en RDC sont disproportionnés pour les femmes des zones rurales.

Malgré le faible nombre de cas et de décès rapportés, la pandémie de COVID-19, et les restrictions de mouvements et de rassemblements qui en découlent, ont des impacts secondaires sanitaires et socio-économiques importants en RDC. Au 15 novembre, 11 838 cas de COVID-19 et 322 décès liés à cette maladie ont été signalés. En premier lieu, les impacts sanitaires des restrictions comprennent des perturbations de l'accès aux services de santé - diminution de la capacité à se les payer - ainsi qu'une réduction de l'utilisation des services de planification familiale et de gestion des maladies chroniques (pour les patients risquant de développer des formes graves de COVID-19).[2] La santé des femmes - les plus jeunes, les femmes enceintes et les mères - est affectée de manière disproportionnée

Il est recommandé que les projets utilisent les indicateurs de sortie des indicateurs COVID-19 du Plan stratégique IRRF, le cas échéant. En raison de la nature du travail d'intervention de la COVID-19, il est recommandé d'utiliser des jalons et des objectifs trimestriels. Le suivi sera effectué à l'aide du tableau de bord de suivi COVID-19. Les rapports seront rationalisés dans le cadre de l'exercice de reporting COVID-19 (mini-ROAR et indicateurs COVID-19.) Aucun rapport séparé ne sera requis pour la facilité de financement rapide.

[2] Impacts secondaires de la réponse COVID-19 en RDC : garantir l'utilisation des résultats de la recherche, Cellule d'Analyse en Sciences Sociales, Kinshasa, Juillet 2020 : https://docs.google.com/document/d/1I-r3avNnrcH7CRyARmNHQO65n-Qi_FhZWAGtHkN9PWI/edit

en raison d'une diminution des consultations prénatales et d'une augmentation des grossesses non désirées.[3] La note d'information du Secrétaire général des Nations Unies sur l'impact du COVID-19 sur les femmes montre une augmentation dramatique de la violence domestique, de la maltraitance des enfants et du manque de protection des femmes et des enfants en raison des mesures exigeant que les personnes restent confinées chez elles.[4] Pour la RDC, des études sont en cours sur les impacts de COVID-19 sur les femmes et les filles en termes de grossesse, de mariage précoce et de violence sexiste, et les résultats devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Les résultats devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Deuxièmement, les impacts socio-économiques comprennent l'augmentation de l'insécurité alimentaire liée à la hausse des prix des denrées alimentaires et les difficultés financières affectant les ménages les plus pauvres, en particulier dans les zones rurales reculées, les femmes supportant à nouveau la majeure partie de cette charge. [5, 6]

Alors que des signes encourageants de reprise ont été observés récemment, le secteur des entreprises fait toujours état d'une baisse des revenus et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, 90 % des petites entreprises "enregistrant toujours des revenus inférieurs à ceux de l'année dernière à la même époque".[7] Troisièmement, les impacts macroéconomiques et fiscaux prévus sont une récession de 5% du PIB et une baisse de moitié des recettes publiques en 2020.[8] Malgré les récentes améliorations consécutives à la fin des lockdowns, le choc du COVID-19 devrait gravement affecter la capacité de l'État à financer ses priorités de développement et ses dépenses dans le cadre des ODD.[9]efforts restent nécessaires pour aider les micro et petites entreprises, les ménages et les femmes les plus vulnérables à faire face et à se remettre des impacts du COVID-19.

B. La RDC présente un contexte fragile caractérisé par la pauvreté et un potentiel électrique sous-utilisé

Les impacts négatifs se produisent dans le contexte de vulnérabilités sociales, économiques et humanitaires préexistantes. La RDC présente le plus grand nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë au monde avec 21,8 millions de personnes affectées.[10] L'un des principaux facteurs structurels de vulnérabilité est l'extrême faiblesse du développement des infrastructures, [11]y compris l'eau et l'électricité, pour soutenir la fourniture de services (de santé) essentiels et l'accès aux opportunités socio-économiques. Les zones rurales - plus sévèrement confrontées à l'extrême privation et à la pauvreté multidimensionnelle et aux inégalités - sont plus touchées.[12] La RDC bénéficie d'un potentiel énergétique très sous-exploité (seulement 3% avec des infrastructures de production installées) et abondant tel que l'hydroélectricité, la biomasse, le solaire, l'éolien et les combustibles fossiles - par exemple : puissance estimée en hydroélectricité de 100 Gigawatts (GW), en solaire de 70 GW, et en éolien de 20 GW.[13] L'offre énergétique est largement insuffisante, l'un des plus grands déficits nationaux au monde avec un taux d'accès de la population à l'électricité de 15,2% contre une moyenne africaine de 30%, et inégalement répartie géographiquement et entre zones urbaines favorisées et zones rurales défavorisées. La consommation d'énergie provient principalement de la biomasse (charbon de bois et bois de chauffe), ce qui

[3] Ibid.

[4] Note d'orientation du Secrétaire général de l'ONU : L'impact de COVID-19 sur les femmes, UNWomen, [9] avril 2020. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women

[5] Ibid.

[6] Etude d'impacts sanitaires et socio-économiques de la COVID-19, République Démocratique du Congo, Mai 2020.

[7] Business brief, impact du COVID-19, ELAN RDC et Fédération des Entreprises du Congo, [23] octobre 2020 : https://rdccovidbusinesssurvey.com/23102020_EIU_ELAN_CovidReport ENG_vf_1500.pdf

[8] Etude d'impacts sanitaires et socio-économiques de la COVID-19, République Démocratique du Congo, Mai 2020.

[9] Ibid.

[10] IPC, [19ème] cycle

[11] Plan National Stratégique de Développement 2019-2023, République démocratique du Congo.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

accélère la déforestation et affecte la santé respiratoire et les capacités éducatives des enfants.[14]Depuis 2014 en RDC, les acteurs du secteur privé développent librement des projets de production et de distribution d'électricité. La stratégie du projet sera basée sur une approche d'accès décentralisé, favorisant la mise en place de mini- et micro-réseaux. La fourniture d'un approvisionnement énergétique adéquat et fiable et de technologies de communication est essentielle pour lutter contre les impacts secondaires de COVID-19 dans les zones rurales.

C. Un argument de poids pour améliorer l'accès à l'énergie verte dans les zones rurales

L'accès à l'énergie verte et à l'eau dans les zones rurales serait un des vecteurs majeurs pour atténuer les impacts secondaires de la pandémie de COVID-19 en RDC en augmentant la résilience sanitaire et socio-économique. L'accès à l'eau et à l'électricité est essentiel pour le fonctionnement des établissements de santé et contribue à l'amélioration de la qualité de la prestation de services à la population. Par exemple, d'importants investissements ont été réalisés pour renforcer la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des infections (IPC) dans les établissements de santé touchés par l'épidémie de maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC. [15]Cependant, la faible motivation des agents de santé sous-payés et l'environnement physique des établissements de santé décrépis - sans accès à des sources d'énergie et d'eau fiables - ne permettent pas une appropriation et une mise en œuvre durables de ces mesures pour améliorer la qualité des services de santé. [16]Alors que d'autres activités devraient être mises en œuvre pour renforcer les ressources et les processus du système de santé local ainsi que la promotion de la santé, l'accès à l'eau et à l'électricité dans les établissements de santé contribuera à créer un environnement propice pour la population et les prestataires de soins de santé.

Le manque d'approvisionnement en énergie abordable et fiable empêche le développement de l'agriculture et des entreprises locales et limite la résilience face à des crises telles que la pandémie de COVID-19. L'énergie est essentielle pour pomper l'eau, qui est fondamentale pour cultiver la nourriture mais aussi pour maintenir l'hygiène personnelle, le lavage des mains étant impératif pour limiter la propagation du COVID-19. L'agriculture de subsistance et le faible développement des chaînes de valeur locales caractérisent les zones rurales de la RDC, rendant les communautés vulnérables et dépendantes de l'importation de produits essentiels transformés. Sans accès à l'énergie, le développement des cultures irriguées, des infrastructures de conservation et de transformation ainsi que des petites entreprises est extrêmement limité. Fournir un accès à l'énergie verte au secteur agricole et aux entreprises locales offrira des opportunités économiques aux populations rurales.

Le manque d'énergie sûre est également une source d'exploitation et d'abus sexuels et de violence sexiste, en particulier dans les contextes de déplacement comme en Ituri, où les risques de protection sont importants (par exemple, harcèlement, agression, viol lors de la collecte de bois de chauffage). L'accès sécurisé au combustible et à l'énergie (SAFE) devrait permettre de réduire la violence sexiste dans les communautés.

D. L'électrification rurale est une priorité nationale pour la relance de COVID-19

Les plans d'atténuation d'impact COVID-19 du gouvernement et des Nations Unies ont fait de la relance économique une priorité stratégique, en mettant l'accent sur le développement d'infrastructures d'appui à la relance de la production et sur l'électrification rurale ciblant les centres de santé. En tant que contribution à l'effort national, cette

[14] Ibid.

[15] Conclusions de la mission sur le terrain menée par le Bureau de réponse d'urgence à Ebola de l'ONU en octobre 2020.

[16] Ibid.

proposition prévoit (1) l'installation de mini-centrales et de mini-réseaux pour améliorer le service de l'énergie électrique, (2) l'électrification et la mise en place d'adductions d'eau dans les centres de santé et autres services essentiels, et (3) l'électrification des unités de production et le développement de chaînes de valeur permettant d'accroître la création d'emplois et d'augmenter les revenus (résilience du secteur agricole et des ménages).

Cliquez ou tapez ici pour saisir le texte.

2. Aperçu de la proposition et résultats attendus

Veuillez préciser l'approche de la proposition et la manière dont elle devrait entraîner des changements au niveau des résultats. Toutes les propositions du mécanisme de financement rapide doivent être de type GEN2 ou GEN3 ; par conséquent, veuillez indiquer comment le bureau de pays propose de s'attaquer aux inégalités entre les sexes par des interventions concrètes.

Dans cette partie de la proposition, (1) nous expliquons les raisons de la sélection de la zone géographique ciblée, (2) nous donnons un aperçu de la stratégie d'électrification, et (3) nous décrivons la théorie du changement que notre projet poursuit.

A. Le territoire de Mambasa présente des besoins élevés en matière d'électrification et des conditions de réussite du projet.

Conformément à la stratégie du PNUD "Beyond Recovery", investir dans l'économie verte en RDC suppose de fournir l'accès à l'énergie verte aux plus pauvres dans les territoires ruraux défavorisés pour améliorer les services de santé et les opportunités socio-économiques. Ce projet soutiendra un territoire rural affecté par le COVID dans la province d'Ituri en améliorant l'accès à l'énergie et à l'eau dans les infrastructures de santé et en réalisant la transformation de l'agriculture vers une économie verte durable et inclusive. Grâce à l'accès à l'énergie verte, les objectifs du projet sont (1) de renforcer l'accès à l'énergie et à l'eau dans les infrastructures de santé locales, et (2) d'améliorer la productivité et les revenus des producteurs ruraux, en particulier des femmes.

La province de l'Ituri a été sélectionnée pour les cinq raisons suivantes. Premièrement, la province est particulièrement fragile en raison d'un conflit prolongé. Elle compte l'un des plus grands nombres de personnes en situation d'insécurité alimentaire du pays, et quelques territoires sont encore en proie à la violence armée. Deuxièmement, elle est ciblée par les activités de relèvement post-Ebola, notamment l'amélioration de l'accès à des services d'énergie et d'eau durables, abordables, fiables et modernes au niveau décentralisé. [17]Troisièmement, elle a été particulièrement touchée par les impacts secondaires de COVID-19, dont la plupart sont essentiellement liés à la fermeture de la frontière avec l'Ouganda. Quatrièmement, c'est une zone géographique couverte par le programme REDD+ mis en œuvre par le PNUD,[18] l'accès à l'énergie verte renforcé par cette initiative RFF2 devrait contribuer à l'objectif de réduction de la déforestation de REDD+ dans le territoire ciblé en Ituri. Cinquièmement et enfin, les autorités provinciales et leurs partenaires, au sein d'*Energie de l'Ituri* qui est un partenariat public-privé impliquant jusqu'à 24 entreprises et investisseurs, prévoient de produire 15 MW d'électricité (4 MW solaires et 11

[17] Résultat 3.2 de l'initiative conjointe PNUD-FNUAP-UNICEF post-Ebola "Programme d'appui au développement économique et social de l'Est de la RDC (PADESEC)".

[18] Le plan d'investissement REDD+ de la RDC, https://www.cafi.org/content/cafi/en/home/partner-countries/democratic-republic-of-the-congo/drc-redd--investment-plan-test.html

MW hydroélectriques). [19]L'opportunité de créer une synergie entre l'amélioration de l'accès à l'énergie et l'effort en cours pour réduire la déforestation par le biais de REDD+ fait de l'Ituri une province très pertinente pour mettre en œuvre ce programme de relance économique de COVID-19.

Les priorités stratégiques du gouvernement provincial de l'Ituri dans le secteur de l'énergie sont les suivantes : [20]

- Faire passer le taux d'approvisionnement en électricité de 1 à 30 % d'ici 2023.
- Assurer l'accès à l'électricité en qualité et en quantité suffisantes pour l'ensemble de la population iturienne.
- Développer la production d'énergie renouvelable.
- Développer la chaîne de valeur agricole en utilisant des unités de transformation.
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant des énergies vertes.
- Réduire l'utilisation excessive de charbon de bois et la pression sur la forêt.

Le territoire spécifique de Mambasa a été sélectionné en collaboration avec le gouvernement provincial comme zone géographique cible de ce projet. Le territoire de Mambasa est l'un des trois territoires ciblés par le programme REDD+ et présente le taux de déforestation le plus élevé en Ituri. Les acteurs locaux sont très engagés pour améliorer l'accès à l'énergie verte dans ce territoire. La construction d'un barrage hydroélectrique, conçu avec une capacité de 52,25 kW, est en cours pour alimenter en électricité 525 ménages sur un total de 10 837 (4,84%) dans la ville de Mambasa, la capitale du territoire. [21]Le territoire bénéficie également d'un potentiel important pour l'installation de centrales solaires ou éoliennes. Les données sur l'accès à l'énergie dans le territoire de Mambasa sont détaillées dans le *tableau 1* ci-dessous. [22]

Le territoire de Mambasa compte 950 000 habitants. Parmi les villes demandant l'accès à l'énergie électrique figurent : Mambasa city, Niania, Biakato, Bahaha et Bandegaido. Le territoire de Mambasa comprend quatre zones de santé (ZS) dont Nia-Nia, Mambasa, Mandima et Lolwa, et 68 établissements de santé avec une capacité estimée à 766 lits - les postes de santé (PS) et les centres de santé (CS) ont une capacité moyenne de 3 et 7 lits, respectivement. Les infrastructures de plus de 75% des structures sanitaires sont vétustes, sous-équipées et connaissent fréquemment des ruptures de stock de produits pharmaceutiques.

Tableau 1. Données sur l'accès à l'énergie dans le territoire de Mambasa

Indicateur	%
Proportion d'utilisation de pétrole lampant	68.26%
Proportion d'utilisation de kits solaires	0.71%
Proportion de l'utilisation de l'électricité	1.57%

[19] RDC : l'Ituri lance sa propre compagnie d'électricité et vise 15 MW d'énergie propre : https://www.afrik21.africa/rdc-lituri-lance-sa-propre-compagnie-delectricite-et-vise-15-mw-denergie-propre/

[20] Rapport de la première table ronde sur l'énergie électrique en Ituri, Ministère provincial des Mines, Industrie, Pétrole, Energie et Eau, Province de l'Ituri, République Démocratique du Congo. Novembre 2019.

[21] Projet d'appui au développement intégré à travers l'électrification de la chefferie de Mambasa, Association des Hommes pour la Conservation de la Nature, Province de l'Ituri, République Démocratique du Congo.

[22] Territoire de Mambasa, Cellule d'Analyse des Indicateurs de Développement, données de 2017. https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-ituri/territoire-de-mambasa/?secteur=fiche

Proportion d'unités de traitement	1.12%
Proportion d'accès à l'électricité	1.57%
Raccordement à l'électricité	1.18%

B. Installation de mini-réseaux pour alimenter les établissements de santé ruraux et les unités de production agricole

Sur ce territoire, des mini-réseaux seront installés à partir de sources hydrauliques ou solaires, en fonction du potentiel local et des résultats des études de faisabilité. Les études de faisabilité seront conduites par des termes de référence spécifiques, élaborés par le consultant ou le cabinet qui sera recruté pour les réaliser selon les standards internationaux. Les mini-réseaux seront conçus pour alimenter des centres de santé, des unités de production agropastorale et de pêche. L'excédent permettra d'assurer l'éclairage public. Dans toutes les activités, le projet favorisera l'engagement des femmes professionnelles, des associations, des groupes économiques et des particuliers. L'accès à l'énergie sera un facteur d'autonomisation et de sécurité pour les femmes.

Compte tenu de la forte dispersion des villages et des grandes villes à forte densité humaine, les puissances à installer seront comprises entre 10 et 100 kilowatts (ou kilowatt crête si l'installation est basée sur un système photovoltaïque). Par exemple, un réseau de 10 kW peut alimenter un centre de santé (avec un bloc opératoire), une radio communautaire, une plateforme multifonctionnelle de 5 KVA, trois à cinq points d'eau, et 200 à 300 mètres d'éclairage public ; tandis qu'un réseau de 100 kW peut alimenter jusqu'à trois centres de santé, dix petites unités de production, dix points d'eau, deux radios communautaires, un à deux kilomètres d'éclairage public, et des bâtiments administratifs locaux.

En fonction de l'ampleur des besoins mais aussi des capacités locales de prise en charge, les études de préfaisabilité doivent permettre de définir la puissance effective à installer dans chaque localité ciblée, de déterminer la source d'énergie (petites centrales hydroélectriques ou photovoltaïques) et de déterminer l'étendue du réseau à installer. Il est prévu qu'environ 30% des mini-réseaux à installer fonctionnent à partir de sources solaires (énergie photovoltaïque). Dans chaque situation, la possibilité de construire ces mini-réseaux sera évaluée en fonction des possibilités de mobiliser le secteur privé pour en assurer le relais et la pérennité, selon des modèles économiques à évaluer et à mettre en place également.

C. Accès de la population de Mambasa à l'énergie et à l'eau pour une meilleure infrastructure sanitaire et des opportunités économiques accrues.

Ce projet poursuit la théorie du changement suivante (TOC - voir la *figure 1* à la page suivante) :

- (1) Si les établissements de santé ont accès à des sources fiables d'énergie et d'eau (résultat 1) et si l'accès à l'eau potable est amélioré et que les services d'hygiène sont étendus (résultat 2), alors la population du territoire ciblé aura accès à de meilleures infrastructures de santé - fournissant les conditions essentielles d'énergie et d'eau pour améliorer la qualité des soins et l'attractivité des services - et à une eau salubre améliorée et des conditions d'hygiène - résultant en une réduction potentielle des maladies liées à l'eau et des maladies infectieuses (résultat 1), avec l'objectif ultime d'améliorer la qualité des soins de santé et la qualité de vie sur le territoire.

- (2) Si l'accès des unités de production à l'énergie électrique a augmenté et que les chaînes de valeur sont développées (résultat 3), alors les conditions favorables à la diversification et au renforcement de l'économie rurale locale seront améliorées, de sorte que la population du territoire ciblé ait accès à des opportunités économiques pour diversifier ses activités et augmenter ses moyens de subsistance (résultat 2).

- (3) Si la population vulnérable a un accès sûr à l'énergie, l'insécurité alimentaire et la malnutrition (par exemple, manque de combustible pour cuire les aliments), la déforestation (par exemple, coupe non durable des ressources en bois pour le combustible), les risques de protection (par exemple, harcèlement, agression, viol lors de la collecte de bois de chauffage) et les risques sanitaires (inhalation de fumée, maladies respiratoires) seront réduits.

- La combinaison de (1) (2) et (3) devrait contribuer à rétablir la prestation des services de santé essentiels et les opportunités économiques dans une optique de protection - en atténuant les impacts sanitaires et socio-économiques de COVID-19 et en améliorant les conditions d'un développement vert et durable. Si tous les changements susmentionnés se produisent, les populations rurales ciblées deviendraient plus résilientes aux crises.

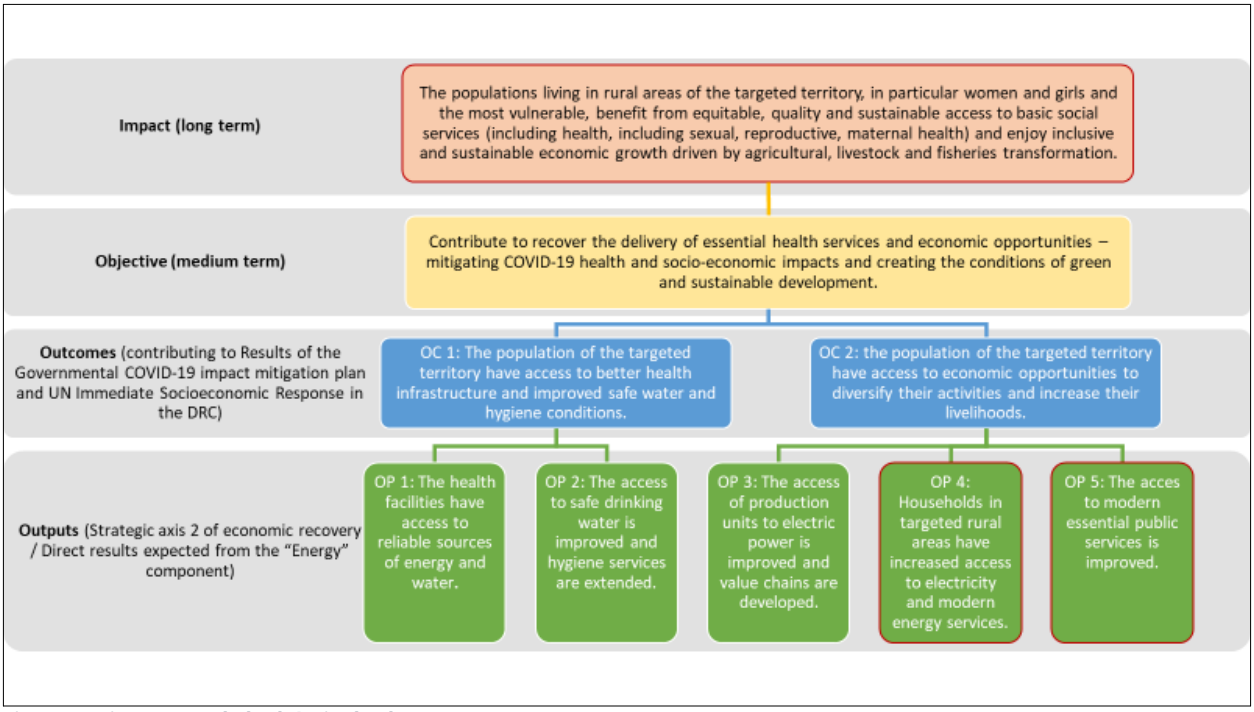


Figure 1. Diagramme de la théorie du changement. *Remarque : Le contenu des formes encerclées en rouge n'est pas directement visé par ce projet et sera, si possible, étendu à moyen terme.*

<u>Résultat 1 : La population du territoire ciblé a accès à de meilleures infrastructures de santé et à des conditions d'eau potable et d'hygiène améliorées.</u>

Résultat 1 : Les établissements de santé ont accès à des sources d'énergie et d'eau fiables.
L'amélioration de l'alimentation électrique des centres de santé devrait contribuer à améliorer les services de santé publique dans les zones reculées visées, notamment leur capacité à faire fonctionner les équipements d'assistance

médicale, à contribuer à la conservation des vaccins et surtout à assurer le fonctionnement quasi permanent des structures hospitalières réquisitionnées pour la gestion des cas d'épidémie.

Produit 2 : L'accès à l'eau potable est amélioré et les services d'hygiène sont étendus, à une large couche de la population et en particulier aux femmes et aux filles.
L'amélioration de l'accès à l'eau est un élément essentiel de la réponse durable au COVID-19, ainsi qu'à Ebola et à diverses autres maladies transmissibles. À cette fin, les initiatives visant à améliorer l'approvisionnement en électricité doivent être couplées à des initiatives visant à améliorer l'approvisionnement en eau et les systèmes d'hygiène des mains. Ces derniers jours, les innovations technologiques dans le domaine des machines à laver les mains fonctionnant à l'énergie solaire se sont multipliées. Le projet permettra d'équiper les zones cibles de ces dispositifs d'hygiène en plus de faciliter l'accès à l'eau potable pour les alimenter.

Résultat 2 : La population du territoire ciblé a accès à des opportunités économiques pour diversifier ses activités et augmenter ses moyens de subsistance.

Résultat 3 : L'accès des unités de production à l'énergie électrique est amélioré et les chaînes de valeur sont développées.
La transformation des structures de production des zones ciblées et le développement des chaînes de valeur nécessitent la mécanisation des unités de production des zones rurales ciblées afin de pouvoir exploiter l'énergie électrique qui sera mise à disposition. Il sera impératif d'accompagner cette transformation en apportant des conseils sur les types d'équipements de production à acquérir, et en facilitant cette acquisition, pour une utilisation optimale de l'énergie produite. Cet accompagnement permettra également de prendre en compte l'objectif majeur du projet de favoriser une plus grande résilience des économies locales par la diversification des activités économiques. Dans certains cas, le projet pourra promouvoir l'approche de la plateforme multifonctionnelle (largement utilisée en Afrique de l'Ouest) ou le modèle[23] KeyMaker d'utilisation productive permise par les mini-réseaux.

Si le projet est étendu à moyen terme, les deux produits suivants seront ajoutés sous le résultat 2 :
NB : La phase initiale du projet sera limitée dans le temps à 18 mois et dans sa portée aux résultats 1 à 3 décrits ci-dessus. Si le projet s'avère être un succès et qu'une décision est prise pour l'étendre, et que des ressources supplémentaires sont mobilisées, alors les deux produits suivants seront ajoutés sous le résultat 2.

Résultat 4 : Les ménages des zones rurales ciblées ont un accès accru à l'électricité et aux services énergétiques modernes.
Les Kits solaires individuels ont prouvé leur efficacité dans plusieurs pays africains parmi les axes d'intensification de l'électrification rurale. Cette option viendra donc compléter la mise en place de mini- et micro-réseaux pour alimenter les unités de production et les centres de santé. Ce système comprendra des torches et des lanternes solaires, avec la possibilité de charger un téléphone ou de connecter un poste de radio. Ceci devrait accélérer l'accès individuel à l'électricité et adapter l'offre aux différentes bourses. Grâce à ces acquisitions, il sera possible d'améliorer la sensibilisation et l'éducation des communautés aux bonnes pratiques d'utilisation de l'énergie électrique.

Produit 5 : L'accès aux services publics essentiels modernes est amélioré.

[23] Fondamentaux du modèle KeyMaker, Les mini-réseaux comme outil d'inclusion des communautés rurales profondes dans le commerce national et international, Bureau d'aide des mini-réseaux verts, novembre 2019.

Il s'agit notamment de l'éclairage public, des radios communautaires, de l'état civil, de l'internet, de la téléphonie mobile et des services connexes au profit des communautés ciblées. L'amélioration de la performance des services publics en général (éclairage public, numérisation des services publics essentiels et alimentation des radios communautaires) et in fine l'amélioration du fonctionnement de la gouvernance locale (meilleure planification et coordination du développement) constituent une valeur ajoutée que la fourniture d'électricité pourrait favoriser dans les zones ciblées. Les populations en bénéficieront pleinement, individuellement et collectivement.

Cliquez ou tapez ici pour saisir le texte.

3. Modalités de gestion

Décrivez comment l'initiative sera gérée au sein du PNUD.

Le projet sera géré par le CO du PNUD de la RDC en collaboration et en coordination avec le gouvernement de la RDC, la FAO, et le mécanisme institutionnel de coordination, de pilotage et de mise en œuvre du Plan des Nations Unies pour une réponse socio-économique immédiate au COVID 19 en RDC. Compte tenu de la nature multisectorielle du projet, une collaboration sera développée avec les ministères sectoriels clés au niveau national et provincial (énergie, santé, et agriculture). Au niveau provincial, le pilotage du projet sera intégré dans les mécanismes existants de redressement et de développement local du COVID-19, en collaboration avec les ministères de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et du développement rural, et le gouvernorat d'Ituri.

La mise en œuvre du projet bénéficiera de la longue expérience et de l'expertise du PNUD dans la mise en œuvre de projets similaires, et de son expertise sur les ODD, les mécanismes de financement innovants et la mobilisation du secteur privé et des communautés. Le PNUD met actuellement en œuvre :

- le "*Programme de consommation durable et substitution partielle au bois énergie - Fonds National REDD+ (FONAREDD) de la RDC / Vers une mobilisation de la finance climat pour le développement durable de la RDC"*, financé par l'Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale (IFAC) [24]et le processus REDD+ du Fonds Vert pour le Climat (GCF).[25] Il vise à rendre plus efficace la consommation de bois énergie et à développer les énergies nécessaires à sa substitution dans les territoires de Kinshasa, Kisangani, Goma, Bukavu, Lubumbashi.
- Le projet "Promotion des mini et micro-centrales hydroélectriques en RDC", financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Il contribue à rendre l'économie de la RDC plus verte et à améliorer la gestion de ses ressources naturelles (énergie, biodiversité et terres) et couvre l'ensemble du pays.

Les enseignements tirés de la mise en œuvre de ces projets comprennent (1) la nécessité de co-développer les spécifications de l'infrastructure énergétique avec les experts en énergie du gouvernement, (2) la fixation de délais réalistes pour toutes les étapes du processus avec l'unité de passation de marchés, (3) l'évaluation préliminaire précise du coût du projet, et (4) la garantie d'un suivi et d'un soutien étroits des activités du projet du gouvernement.

La mise en œuvre de ce projet bénéficiera également de la grande expérience de la FAO, depuis 2015, dans la province de l'Ituri avec la mise en œuvre de plusieurs projets principalement :

- Réduction des tensions communautaires le long de l'axe Mambasa - Epulu - Nia-Nia par le renforcement de la résilience (novembre 2014-mai 2015) dans le territoire de Mambasa.

[24] https://www.cafi.org/content/cafi/en/home.html
[25] https://www.greenclimate.fund/redd

- Réponse agricole, en articles ménagers essentiels (EHI) et abris pour la résilience de 5000 ménages déplacés et hôtes affectés par les conflits armés sur l'axe Mambasa - Niania - Wamba - Bafwasende (Opienge), Province Orientale (février 2016-mai 2017) dans les territoires de Mambasa, Bafwasende et Wamaba.
- Soutien des ex-combattants démobilisés pour leur réinsertion socio-économique (octobre 2016-octobre 2017) Territoire d'Irumu.
- Gestion des filières agro-pastorales au Nord et Sud Kivu et Ituri (2017-2019) dans les territoires de Mahagi et Djugu.
- Réponse rapide pour protéger et restaurer la sécurité alimentaire et la capacité de production maraîchère des réfugiés sud-soudanais et de la communauté hôte du territoire d'Aru, province d'Ituri, RDC (décembre 2016-juin 2017).
- Assistance et production alimentaire en soutien aux familles d'accueil subissant les répercussions des mouvements de population (mars 2018-décembre 2018) sur le territoire d'Irumu.
- Réduction de l'urgence nutritionnelle et alimentaire des personnes vulnérables dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Ituri (avril-décembre 2020) dans le territoire de Djugu.

L'instrument d'exécution sera la création de nouveaux produits dans le cadre d'un projet existant et le projet sera géré selon une modalité de mise en œuvre directe. Le suivi et l'évaluation ainsi que les rapports du projet seront basés sur des preuves et orientés vers les résultats - conformément aux exigences du PNUD. En tant qu'action clé du plan de l'ONU pour la réponse socio-économique au COVID-19 en RDC, le projet fera partie des mécanismes de gestion et de rapportage dédiés. Bien que géré au CO dans l'unité énergie, ce projet sera supervisé par un bureau de terrain et impliquera la participation de partenaires de mise en œuvre. Le PNUD fournira un rapport narratif annuel sur l'avancement du projet, un examen de l'avancement à mi-parcours et un rapport narratif consolidé final. Les résultats du projet seront évalués, suivis et communiqués périodiquement pendant la mise en œuvre du projet afin de s'assurer que le projet atteint effectivement ces résultats. Tous les résultats obtenus seront communiqués au public externe conformément au plan de communication du projet.

4. Partenariats

Décrivez comment le bureau national travaillera avec les partenaires pour atteindre les résultats.

En collaboration avec les ministères des Finances, de l'Énergie, de la Santé, de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et du Développement rural, ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et les autorités locales concernés, l'Agence nationale des services d'électrification rurale (ANSER) et la Direction de l'électrification rurale (DRE) seront les principaux partenaires techniques de ce projet. Ces deux entités gouvernementales ont une grande expertise dans le développement de solutions énergétiques, y compris l'électricité, l'eau, l'assainissement et l'agriculture dans les zones rurales.

Des synergies et des collaborations seront développées avec les agences des Nations Unies et d'autres parties prenantes, sur la base de leur avantage comparatif et de leur expertise technique dans les domaines couverts par le projet. Le PNUD, le FNUAP et l'UNICEF finalisent actuellement un vaste programme de développement socio-économique (post-Ebola) pour l'Est de la RDC (couvert par l'Ituri) et le projet RFF2 bénéficiera de l'expertise de ces deux autres agences dans des activités telles que WASH, la vaccination et le planning familial. Les partenariats qui pourraient être établis incluent l'OMS - programmes actuels de rétablissement post-Ebola et de dépistage et de gestion de l'hypertension et du diabète pour la réduction du risque de COVID-19, ou des synergies inspirées par Solar for Health -, le FENU pour capitaliser sur son expertise en matière de programmes d'énergie renouvelable, l'UNICEF pour assurer l'amélioration des infrastructures de santé, de la qualité et de l'accès aux services de santé, ainsi que

de la composante WASH (résultats 1 et 2), le PAM, en plus de la FAO, pour renforcer le développement des chaînes de valeur agricoles (résultats 2 et 3), et l'UNWOMEN pour assurer la prise en compte du genre dans toutes les activités. D'autres synergies et partenariats peuvent inclure une collaboration avec Health Care Without Harm (santé durable dans l'approvisionnement ou la gestion des déchets médicaux), ainsi que d'autres ONG ou programmes ayant une forte expérience des projets d'énergie renouvelable et/ou actifs dans l'atténuation de l'impact du COVID-19 (ELAN RDC par exemple). Enfin, le PNUD collaborera avec des donateurs tels que l'USAID, la Banque mondiale (BM), la Banque africaine de développement (BAD), la Coopération suisse au développement (DDC) pour reproduire cette approche dans d'autres territoires en tant que stratégie de mise à l'échelle.

Enfin, le projet mobilisera des partenariats locaux avec le secteur privé engagé dans l'initiative d'*Energie de l'Ituri*, comme Bboxx, Nuru, GoShop, SOCODEE ou Hydro force Congo, et les coopératives locales. [26][27]Ces partenariats seront établis dans un esprit de participation et d'appropriation locales, en utilisant des méthodes innovantes de cofinancement, de co-construction d'infrastructures et de co-gestion des infrastructures d'approvisionnement en énergie et en eau.

5. Complémentarité avec les autres fonds disponibles pour COVID-19

Si le bureau de pays dispose déjà de ressources pour COVID-19 (par exemple, des ressources de base, un dispositif de réponse rapide, un C/S gouvernemental, un C/S tiers, des fonds verticaux, etc.), veuillez indiquer comment les fonds demandés compléteront d'autres fonds ou aideront à mobiliser des ressources supplémentaires pour atteindre les ambitions programmatiques et la durabilité.

Le CO a déjà dépensé des ressources pour la réponse et l'atténuation des impacts de COVID-19 : (1) la facilité de réponse rapide pour un montant de 267 500 USD et des ressources de base supplémentaires, (2) les évaluations des impacts secondaires sanitaires et socio-économiques du COVID-19[28], la formulation des plans d'atténuation gouvernementaux correspondants et le plan de continuité des activités des ministères de la Planification et de la Justice, avec un investissement de 400 000 USD, et (3) l'achat continu d'équipements (concentrateurs d'oxygène et équipements de protection individuelle) pour aider le système de santé à répondre au COVID-19 (environ 500 000 USD). L'installation de systèmes d'énergie solaire fait partie des initiatives 1 et 3 décrites ci-dessus, par exemple pour alimenter les systèmes de visioconférence et le fonctionnement des concentrateurs d'oxygène dans les hôpitaux généraux. Le projet proposé complète donc les activités entreprises par le CO pour répondre au COVID-19 en RDC.

Le CO a ciblé la province d'Ituri et le territoire de Mambasa pour créer des synergies avec le programme FONAREDD (détaillées précédemment dans la présentation du territoire dans " 2. Aperçu de la proposition et résultats attendus " et dans " 3. Modalités de gestion "). En effet, les activités FONAREDD en cours ou réalisées en 2020 comprennent l'élaboration de plans régionaux d'aménagement du territoire, l'appui aux activités agricoles, vivrières et pérennes (semences améliorées pour les communautés locales, renforcement des capacités) et l'appui technique, financier et institutionnel aux services de l'environnement, de l'agriculture et de l'aménagement dont les chieferies. Les activités prévues pour 2021 et 2022 consistent en la distribution de foyers améliorés, la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus ciblant les femmes, les jeunes et les autochtones, le soutien aux activités agricoles et la mise en place de comités de développement local au niveau des villages. Toutes les activités du FONAREDD bénéficieront

[26] RDC : l'Ituri lance sa propre compagnie d'électricité et vise 15 MW d'énergie propre : https://www.afrik21.africa/rdc-lituri-lance-sa-propre-compagnie-delectricite-et-vise-15-mw-denergie-propre/

[27] Rapport de la première table ronde sur l'énergie électrique en Ituri, Ministère provincial des Mines, Industrie, Pétrole, Energie et Eau, Province de l'Ituri, République Démocratique du Congo. Novembre 2019.

[28] Cofinancé avec l'Unicef, l'UNWomen et l'OIT pour un montant de 30 000 USD chacun.

de l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'électricité des unités de production agricole et le projet RFF2 s'appuiera sur le renforcement des capacités de gestion des communautés pour administrer et entretenir les solutions installées en matière d'eau et d'électricité.

Le CO mobilisera les ressources suivantes pour compléter ce projet RFF 2 dans le territoire de Mambasa : une réorientation du TRAC 2021 & 2022 / RDC PNUD CO et des contributions confirmées du Gouvernement Central (ANSER), et de la FAO (voir *Tableau 2 sur la* page suivante). Le CO examinera également les possibilités d'investissement du secteur privé pour compléter les activités dans le territoire de Mambasa. Les fonds demandés dans le cadre du RFF2 seront utilisés comme une source catalytique pour mobiliser d'autres ressources afin d'étendre cette approche à d'autres territoires et d'assurer la durabilité des résultats attendus. Comme décrit dans la partie "4. partenariat", le CO négocie des financements supplémentaires avec des donateurs tels que l'USAID, la BM, la BAD ou la DDC. A cet égard, une stratégie de mobilisation des ressources et de partenariat, ainsi qu'un plan d'action de communication seront développés pour ce projet.

Le CO demande un montant supplémentaire de 400.000 USD au GI pour porter l'allocation à 1.000.000 USD. La justification de cette demande supplémentaire reflète la complexité du projet, la dépendance à l'égard de diverses sources de financement et le coût élevé de la réalisation du projet en RDC. Si le financement gouvernemental ne devait pas être alloué - même s'il a été confirmé dans la lettre ci-jointe - les ressources du PNUD de 1,6 million (1 000 000 du RFF2 et 600 000 du TRAC) permettraient au CO de couvrir le coût des études de faisabilité (activité 1.1) et la construction d'une infrastructure énergétique légèrement plus petite (activité 1.2) pour couvrir le résultat 1 dans son ensemble. La position du CO est que cela neutraliserait le risque d'échec du projet si le financement de cette activité cruciale ne se matérialise pas. Dans tous les cas, le CO cherchera à couvrir tous les résultats en plaidant pour la mobilisation de ressources supplémentaires en partenariat avec l'Ituri et les gouvernements nationaux, ainsi qu'avec le système des Nations Unies. Voir le *tableau 2* de "Sources de financement, montant, objet et période couverte par le financement requis et mobilisé pour chaque source de fonds" à la page suivante.

Tableau 2. Sources de financement, montant, objet et période couverte par le financement requis et mobilisé pour chaque source de fonds.

Source de financement	Montant (en USD)	Objet du financement / période couverte par le financement
RRF2	600,000 + une demande supplémentaire de 400 000 = 1,000,000	➢ L'objectif de ce fonds est de cofinancer l'accès à l'énergie et à l'eau des établissements de santé (Output 1), ainsi qu'une partie des coûts de gestion du projet. [29] ➢ Déc 2020 - Juin 2022
TRAC 2021 & 2022 / DRC	600,000	➢ L'objectif de ce fonds est de cofinancer l'accès à l'énergie et à l'eau dans les établissements de santé (Output 1), ainsi qu'une partie des coûts de gestion du projet (à déterminer par des négociations entre le PNUD et la FAO). ➢ Financement confirmé ; janvier 2021 - juin 2022.
Gouvernement central Gouvernement provincial	1,000,000 200,000	➢ L'objectif de ces fonds est de cofinancer l'accès de l'énergie et de l'eau aux structures de santé (Output 1), l'accès aux services d'eau potable et d'hygiène (Output 2), et l'accès des unités de production à l'énergie électrique et le développement des chaînes de valeur (Output 3). [30] ➢ Financement confirmé (voir la lettre de l'ANSER jointe à la demande) ; décembre 2020 - juin 2022.
FAO	1,000,000	➢ Ces fonds ont pour but de cofinancer l'accès aux services d'eau potable et d'hygiène (Output 2), l'accès des unités de production à l'énergie électrique et le développement des chaînes de valeur (Output 3), ainsi qu'une partie des coûts de gestion du projet (à déterminer par des négociations entre le PNUD et la FAO). ➢ Financement confirmé (voir le courriel de la FAO joint à la demande) ; janvier 2021 - juin 2022.
TOTAL	**3,800,000**	
Financement total confirmé	3,200,000	➢ Le financement confirmé comprend les 600 000 USD du RRF2, 600 000 du TRAC, 1 000 000 du gouvernement central / ANSER et 1 000 000 de la FAO.

[29] Voir "BUDGET / WORKPLAN" à la page 16 : 41,67% des coûts de gestion du projet (360k USD), 15% de la demande à RFF2 (1M USD) et 3,95% du budget total du projet (3,8M USD).

[30] Le financement gouvernemental représente une proportion mineure du coût de chaque produit, de 30 à 40 %.

Source de financement	Montant (en USD)	Objet du financement / période couverte par le financement
Autres fonds complémentaires à confirmer ou à mobiliser	400,000 200,000 1,000,000	➢ Demande supplémentaire à RRF2. ➢ À confirmer par le gouvernement provincial. ➢ A négocier et à mobiliser avec le secteur privé engagé dans l'initiative d'Energie de l'Ituri (jusqu'à 24 entreprises impliquées). [31, 32]
Autres donateurs	Jusqu'à 20.000.000	➢ Mise à l'échelle en Ituri ou dans d'autres provinces ; 2021-2025

6. Atténuation des risques

Identifiez les principaux risques qui peuvent menacer l'obtention des résultats et décrivez comment les risques du projet seront atténués.

Le succès du projet RFF2 dépend d'un engagement soutenu des bénéficiaires, du secteur privé et des acteurs étatiques. Les risques qui pourraient entraver la mise en œuvre réussie du projet, leurs impacts possibles, leur probabilité d'occurrence et les mesures d'atténuation sont détaillés dans le *tableau 3* ci-dessous.

Risques liés au projet	Impact	Probabilité	Mesures d'atténuation
Faibles capacités techniques des parties prenantes à mettre en œuvre le projet et risque de mauvaise gestion des ressources. & Difficultés de coordination entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux sur leurs compétences respectives dans l'application de la loi de libéralisation du secteur de l'électricité.	Haut	Moyen	• Fourniture d'une assistance technique complète (formation, accompagnement et services de conseil) et de mesures incitatives appropriées à tous les acteurs. • Renforcer les compétences et les capacités par des activités ciblées de renforcement des capacités. • L'intégration de cette gestion de projet dans le mécanisme institutionnel de coordination, de pilotage et de mise en œuvre du Plan des Nations Unies pour la Réponse Socio-économique Immédiate au COVID 19 en RDC pour assurer une gouvernance (financière) optimale. • Améliorer le dialogue entre les partenaires/financeurs du développement pour qu'ils se complètent en raison des ressources et du temps limités. • Assurer un engagement fort et une coordination du projet avec ANSER et Energie de l'Ituri (micro-évaluations et LOAs).

Risques liés au projet	Impact	Probabilité	Mesures d'atténuation
Faible appropriation par les différentes parties prenantes et les bénéficiaires	Haut	Faible	• Renforcer les capacités des autorités locales et les impliquer dès le début du projet pour renforcer l'appropriation et promouvoir l'autonomisation effective des acteurs du développement local. • Assurer une forte stratégie de communication et de sensibilisation pour l'engagement des parties prenantes et des bénéficiaires en tant qu'activité transversale du projet. • Assurer le transfert rapide de compétences et soutenir le développement de l'entrepreneuriat local dans le secteur de l'énergie. • Intégrer le pilotage du projet dans les mécanismes existants au niveau local (chieferies et territoire) et provincial. • Améliorer le dialogue entre les autorités et les populations, en particulier les groupes de femmes, et accroître leur participation aux exercices de responsabilisation et aux mécanismes de communication, en vue de rétablir la confiance.
Mobilisation insuffisante de ressources complémentaires pour assurer une couverture complète et durable des résultats.	Haut	Faible	• La mobilisation du secteur privé pour le financement et la gestion des projets. • La réduction du projet à de plus petits mini-réseaux solaires autour des centres de santé (Output 1) si le financement du gouvernement et des partenaires n'est pas réalisé, et la mobilisation des ressources pour combler les lacunes qui en résultent. • Développer une stratégie de mobilisation des ressources pour s'assurer que des ressources supplémentaires puissent couvrir les fonds manquants afin de garantir une couverture complète et durable des résultats.
Résurgence de conflits et de problèmes de sécurité ou d'urgences de santé publique (COVID-19 ou Ebola) dans les zones ciblées.	Haut	Haut	• Travailler en étroite coordination avec l'UNDSS et les forces armées nationales. • Assurer l'implication des autorités locales afin de garantir un environnement sûr pour la mise en œuvre des activités du projet. • Travailler avec des partenaires ayant une bonne connaissance du contexte local et une présence effective sur le terrain. • La mise en œuvre possible des activités du projet par des ONG locales avec des exigences de sécurité flexibles. • Veiller au respect des mesures épidémiques de prévention et de contrôle des infections dans toutes les activités, en coordination avec les autorités sanitaires provinciales.
L'étude de faisabilité pourrait conclure que le projet n'est pas réalisable.			• Élargir la portée de la localisation possible du projet dans la province d'Ituri. • Déplacer le projet dans une autre province.

Risques liés au projet	Impact	Probabilité	Mesures d'atténuation
Retards dans la passation des marchés en raison de l'indisponibilité des matériaux dans le pays et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement.	Moyen	Moyen	• Fixez des délais réalistes pour toutes les étapes du processus, y compris les études de faisabilité, avec l'unité chargée des achats. • Prévoyez du temps supplémentaire pour les études de faisabilité et pour l'importation et le transport des fournitures non disponibles dans le pays.
Augmentation de la propagation de COVID-19 et des restrictions de rassemblement et de mobilité. Un verrouillage entraînerait l'arrêt du projet.	Incertain	Incertain	• Assurer une communication claire avec les parties prenantes du projet et défendre l'alignement sur les mesures gouvernementales contre COVID-19. • Fournir des installations pour le lavage des mains et des équipements de protection (par exemple, un désinfectant pour les mains, des gants et des masques) pendant les sessions de formation et de sensibilisation. • Les réunions virtuelles seront encouragées la plupart du temps pour assurer la distance physique, lorsque les réunions de gestion de projet sont essentielles. • Une prolongation sans frais sera demandée dans le cas d'un verrouillage et d'une durée égale à celle-ci.

BUDGET / PLAN DE TRAVAIL

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PRÉVUES *Liste de toutes les activités, y compris le suivi et l'évaluation, qui seront entreprises au cours de l'année en vue de la réalisation des objectifs du programme de pays.*								PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU*		
		2020	2021				2022			Source des fonds	Description du budget	Montant demandé
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2				
Résultat 1 : La population du territoire ciblé a accès à de meilleures infrastructures de santé et à des conditions d'eau potable et d'hygiène améliorées.									**PNUD**			**2,490,000**
Produit 1 : Les établissements de santé ont accès à des sources fiables d'énergie et d'eau. (avec un accent particulier sur la garantie de services de santé sexuelle, reproductive et maternelle et d'autres maladies endémiques)	**Activité 1.1 :** Réaliser des études sexo-spécifiques sur les besoins en énergie (eau et électricité) et explorer les solutions les plus appropriées pour alimenter les centres de santé, les unités de production, les services étatiques et les ménages dans les zones ciblées, puis réaliser des études de faisabilité des solutions envisagées.		**X**	**X**	**X**					PNUD & FAOANSER / Ministère de l'énergieSER / Ministère du développement ruralConsultants	UNDP RFF2TRAC 2021	Consultance, conseil, appui stratégique et technique (études sur les besoins énergétiques, recherche des solutions les plus appropriées et réalisation d'études de faisabilité).	150,000
	Activité 1.2 : Construction de structures d'alimentation (mini ou micro-centrales hydroélectriques/solaires, mini-réseaux) pour la production d'électricité ;				**X**	**X**	**X**	**X**		PNUD ANSER / Ministère de l'énergieSER/ Ministère du développement rural	PNUD RFF2TRAC 2021 & 2022Fonds du gouvernement	Construction d'infrastructures (électricité, eau, assainissement) et d'équipements énergétiques	1,600,000
	Activité 1.3 : Connecter les centres de santé (à l'électricité et aux usines d'eau) et former les équipes à la prise en charge de la technologie mise en place ;					**X**	**X**	**X**	**X**	PNUD ANSER / Ministère de l'énergieSER / Ministère du développement rural	PNUD RFF2 Fonds du gouvernement	Construction d'installations de distribution d'énergie (électricité, eau, assainissement) et formation d'équipes de gestion et de techniciens.	200,000

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PRÉVUES *Liste de toutes les activités, y compris le suivi et l'évaluation, qui seront entreprises au cours de l'année en vue de la réalisation des objectifs du programme de pays.*								PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU*		
		2020	2021				2022			Source des fonds	Description du budget	Montant demandé
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2				
	Activité 1.4 : Développer des partenariats (avec le secteur privé, les gouvernements provinciaux, et les coopératives de développement) pour porter les solutions énergétiques mises en œuvre.	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	PNUD & FAOANSER/Ministère de l'énergieSER/Ministère du développement ruralConsultants	PNUD RFF2	Consultations, conseils, mise en place de comités de gestion locaux et contrats pour la gestion des solutions.	20,000
Produit 2 : L'accès à l'eau potable est amélioré et les services d'hygiène sont étendus, à un large segment de la population et en particulier aux femmes et aux filles.	**Activité 2.1** : Soutenir la mise en œuvre de petites installations d'approvisionnement en eau et d'équipements WASH ; et faciliter l'accès de la population aux services d'eau et d'hygiène dans les zones ciblées.				**X**	**X**	**X**	**X**	PNUD ANSER / Ministère de l'énergieSER / Ministère du développement ruralConsultants	Fonds du gouvernement	Conseil, soutien stratégique et technique, et construction d'infrastructures.	400,000
	Activité 2.2 : Établir des partenariats (avec le secteur privé, les gouvernements provinciaux et les coopératives de développement) et former des équipes techniques et de gestion appropriées pour mettre en œuvre les solutions WASH.		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	PNUD ANSER / Ministère de l'énergieSER / Ministère du développement ruralConsultants	TRAC 2021 & 2022	Conseil, stratégie, soutien technique, opérationnalisation du processus, et mise en place de comités de gestion locaux.	20,000
	Activité 2.3 : Soutenir l'expérimentation de solutions technologiques pour les installations WASH et l'incubation d'initiatives d'innovation technologique sur le terrain, ainsi que le déploiement d'équipements hygiéniques pour le lavage des mains dans les zones cibles.			**X**	**X**	**X**	**X**		PNUD ANSER / Ministère de l'énergieSER / Ministère du développement ruralConsultants ONG et coopératives	UNDP RFF2TRAC 2021 & 2022 Fonds du gouvernement	Conseil, soutien stratégique et technique, et incubation d'initiatives d'innovation technologique.	100,000

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PRÉVUES *Liste de toutes les activités, y compris le suivi et l'évaluation, qui seront entreprises au cours de l'année en vue de la réalisation des objectifs du programme de pays.*								PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU*		
		2020	2021				2022			Source des fonds	Description du budget	Montant demandé
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2				
Résultat 2 : La population du territoire ciblé a accès à des opportunités économiques pour diversifier ses activités et augmenter ses moyens de subsistance. (Des opportunités agro-industrielles et de nouveaux emplois sont créés, la chaîne de valeur agricole est développée, l'insécurité alimentaire est réduite et la productivité et les revenus des producteurs ruraux sont augmentés).									**FAO**			**950,000**
Résultat 3 : L'accès des unités de production à l'énergie électrique est amélioré et les chaînes de valeur sont développées.	**Activité 3.1 :** Approvisionner en électricité les unités de production existantes ou à créer et appuyer la formation de leurs équipes techniques à la bonne gestion des installations et équipements électriques.				**X**	**X**	**X**	**X**	FAO ET PNUD ANSER / Ministère de l'énergieSER / Ministère du développement rural/ Ministère de l'agriculture/ Ministère de l'élevage et de la pêche/ Consultants/ ONG et coopératives locales	FAO TRAC 2021 & 2022	Appui consultatif, stratégique et technique, formation et fourniture d'énergie aux unités de production.	250,000
	Activité 3.2 : Appuyer l'acquisition d'équipements de production et de transformation agro-pastorale et la création d'usines de transformation et de stockage (réfrigéré) des aliments.				**X**	**X**	**X**	**X**	FAO ET PNUD SER / Ministère du développement rural Ministère de l'agriculture/ Ministère de l'élevage et de la pêcheGouvernements provinciauxSecteur privéONG et coopératives	FAO	Unités de conseil, de soutien stratégique et technique, de formation et de production d'acquisitions.	400,000

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PRÉVUES *Liste de toutes les activités, y compris le suivi et l'évaluation, qui seront entreprises au cours de l'année en vue de la réalisation des objectifs du programme de pays.*								PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU*		
		2020	2021				2022			Source des fonds	Description du budget	Montant demandé
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2				
	Activité 3.3 : Soutenir la création de chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et la diversification de l'agriculture et de l'élevage, d'espèces adaptables et productives (et d'animaux en couple ainsi que la fourniture de services vétérinaires), par l'accès à une énergie fiable et compétitive (eau et électricité) ;				**X**	**X**	**X**	**X**	FAO ET PNUD SER / Ministère du développement rural Ministère de l'agriculture/ Ministère de l'élevage et de la pêche Gouvernements provinciaux ONG et coopératives	FAO	Conseil, appui stratégique et technique, consultation, recherche de financement, opérationnalisation du processus.	200,000
	Activité 3.4 : Encourager la création de coopératives agro-sylvo-pastorales et de groupements socioprofessionnels, et soutenir la conception et la mise en œuvre de modèles d'affaires appropriés, avec un minimum de 50% d'entreprises dirigées par des femmes et proposer des activités de développement des capacités pour l'entrepreneuriat féminin, en profitant de la disponibilité de l'énergie ;		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	FAO ET PNUD SER / Ministère du développement rural / Ministère de l'agriculture / Ministère de l'élevage et de la pêche Gouvernements provinciaux ONG locales et coopératives	FAO	Conseil, soutien stratégique et technique, consultation, recherche de financement et développement du modèle d'entreprise, etc.	100,000
Coût de la gestion du projet (9,47% du coût total)	**Coordination du projet :** RH et équipement	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		UNDP RFF2TRAC 2021 & 2022FAO		240,000
	Activités et gestion : Supervision, missions sur le terrain, suivi et évaluation, communication, audits.	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		UNDP RFF2TRAC 2021 & 2022FAO		120,000
									RFF 2 MONTANT			**1,000,000**
									MONTANT TOTAL			**3,800,000**

Dans le cadre des réalisations avec le marqueur de genre GEN2 ou GEN3, il est recommandé d'allouer au moins 15% du financement à des activités en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.

CADRE DES RÉSULTATS

RÉSULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RÉSULTATS [1]	BASELINE		ÉTAPES ET OBJECTIFS					
		Valeur	Année	2020	2021				2022
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Produit 1. la capacité des services de santé dans les zones rurales ciblées est renforcée pour prévenir la propagation de la pandémie de COVID-19 et pour soigner les patients dans les zones ciblées, avec un accent particulier sur la garantie de services de santé sexuelle, reproductive et maternelle.	1.1. Nombre d'établissements de santé ayant accès à l'électricité, à l'eau et aux installations sanitaires dans les zones ciblées.	0	2020				20	20	28
	1.2. Nombre de personnes accédant à des services de santé essentiels (non liés au COVID-19), ventilé par sexe, âge, groupe de population à risque : (a) programme de vaccination b) Programme de sexualité et de reproduction (c) programme de nutrition	N/A	2020				2,500	5,000	25,000
	1.3. Nombre d'établissements de santé ayant reçu un soutien pour maintenir les services essentiels de vaccination depuis l'interruption de COVID-19	N/A	2020				30	100	300
Produit 2. L'accès à l'eau potable et à des services d'hygiène améliorés est étendu à un large segment de la population, en particulier aux femmes et aux filles.	2.1. Nombre de villages ayant accès à l'eau potable dans les zones ciblées	N/A	2020				10	40	60
	2.2. Nombre de villages atteints par des fournitures WASH critiques (y compris des articles d'hygiène ciblant en priorité les femmes) et des services, ventilés par sexe, groupe d'âge et population à risque.	N/A	2020				10	40	60
Produit 3 : Accès accru des unités de production à l'énergie électrique et développement des chaînes de valeur	3.1. Nombre de microcentrales hydroélectriques et solaires réhabilitées/construites. 3.2. Nombre de PME/PMI ayant accès à l'électricité et à l'eau pour le développement de leurs activités (60% détenues par des femmes).	N/A	2020				130	130	130

[1] Il est recommandé que les projets utilisent les indicateurs de sortie des indicateurs COVID-19 du Plan stratégique IRRF, le cas échéant. En raison de la nature du travail d'intervention de la COVID-19, il est recommandé d'utiliser des jalons et des objectifs trimestriels. Le suivi sera effectué à l'aide du tableau de bord de suivi COVID-19. Les rapports seront rationalisés dans le cadre de l'exercice de reporting COVID-19 (mini-ROAR et indicateurs COVID-19.) Aucun rapport séparé ne sera requis pour la facilité de financement rapide.

[31] RDC : l'Ituri lance sa propre compagnie d'électricité et vise 15 MW d'énergie propre : https://www.afrik21.africa/rdc-lituri-lance-sa-propre-compagnie-delectricite-et-vise-15-mw-denergie-propre/

[32] Rapport de la première table ronde sur l'énergie électrique en Ituri, Ministère provincial des Mines, Industrie, Pétrole, Energie et Eau, Province de l'Ituri, République Démocratique du Congo. Novembre 2019.
